
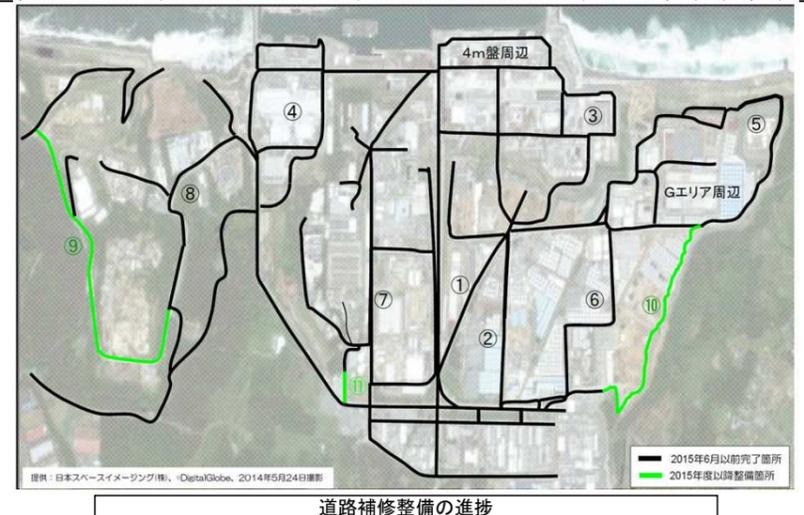


労働環境改善スケジュール

資料 1-1-4

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定		10月		11月				12月				1月	2月	備考					
			25	1	8	15	22	29	6	13	下	上	中	下	前	後						
労働環境改善	防護装備	1 防護装備の適正化検討  (実績) ・一般作業服エリア拡大の検討 (下図中央の緑色エリアを拡大予定)  (予定) ・一般作業服エリア拡大の検討 (下図中央の緑色エリアを拡大予定)  ※ダストフィルタ化: 空気中よう素131濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、ダストフィルタを装着した全面マスクで作業できるエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。 ※全面マスク着用不要化: 空気中放射性物質濃度が全面マスク着用基準を下回ることを確認した上で、全面マスク着用を不要とするエリアを設定し、作業員の負担軽減、作業性向上を図る。 ※一般作業服化: シート養生を行い、定期的な汚染確認を行う車両に乗車する場合は、一般作業服で移動できるエリアを設定し、作業員の負担軽減を図る。	検討・設計																			
			現場作業																			
労働環境改善	防災安全	2 重傷災害撲滅、全災害発生数の推移  (実績) ・協力企業との情報共有 11/26安全推進協議会開催: 災害事例等の再発防止対策の周知等 ・作業毎の安全施策の実施 (TBM-KY等)  (予定) ・12/3安全推進協議会の開催 ・作業毎の安全施策の実施 (継続実施)	現場作業																			
労働環境改善	健康管理	3 長期健康管理の実施  (実績) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2015年度対象者(社員)の「白内障検査」(柏崎・本社)実施 ・インフルエンザ予防接種の実施(10/28~1/29 1F大型休憩所、近隣医療機関)  (予定) ・検査対象者・医療機関等からの問い合わせ対応及び検査費用の精算手続き ・2015年度対象者(社員)の「白内障検査」(本社)実施 ・インフルエンザ予防接種の実施(10/28~1/29 1F大型休憩所、近隣医療機関)	現場作業																			
労働環境改善	健康管理	4 継続的な医療職の確保と患者搬送の迅速化  (実績) ・1F救急医療室の2016年1月中旬までの医師確保完了(固定医師1名+0-テック)支援医師)  (予定) ・1F救急医療室の1月中旬~3月の勤務医師調整	検討・設計																			
			現場作業																			

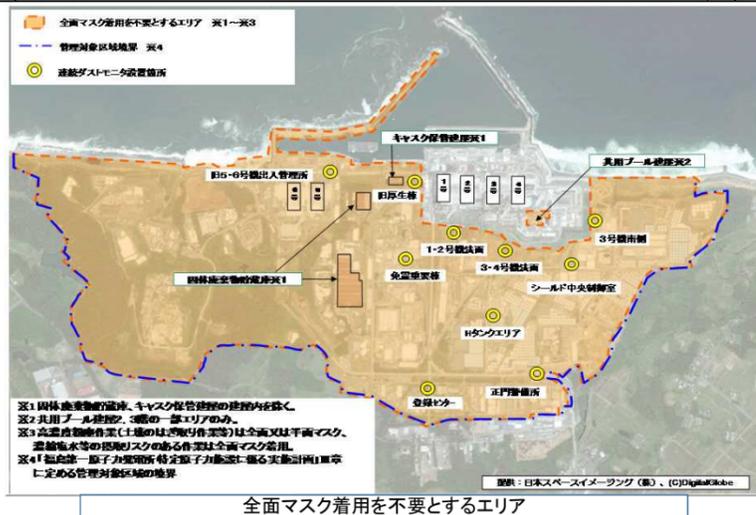

分野名	活り	作業内容	これまで1ヶ月の動きと今後1ヶ月の予定			10月					11月					12月					1月	2月	備考																	
			25	1	8	15	22	29	6	13	下	上	中	下	期	後																								
労働環境改善	要員管理、労働環境改善	5 作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握	(実績) ・作業員の確保状況と地元雇用率の実態把握(継続的に実施) ・作業員の確保状況(10月実績/12月の予定)と地元雇用率(10月実績)についての調査・集計	検討・設計	▼作業員の確保状況集約 ▼作業員の確保状況調査依頼					▼作業員の確保状況集約					▽作業員の確保状況調査依頼					▽作業員の確保状況集約																				
		(予定) ・作業員の確保状況(11月実績/1月の予定)と地元雇用率(11月実績)についての調査・集計	現場作業	作業員の確保状況(10月実績/12月予定)と地元雇用率(10月実績)の実態把握					作業員の確保状況(11月実績/1月予定)と地元雇用率(11月実績)の実態把握					作業員の確保状況(12月実績/2月予定)と地元雇用率(12月実績)の実態把握																										
		6 労働環境・生活環境・就労実態に関する企業との取り組み	(実績) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握 ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応 ・作業員へのアンケートによる実態把握	検討・設計	労働環境・生活環境に関する実態把握・解決策検討・実施																																			
		(予定) ・労働環境・生活環境・就労実態に関する意見交換及び実態把握(継続的に実施) ・意見交換及び実態把握に基づく解決策の検討・実施・結果のフィードバック(継続的に実施) ・作業員へのアンケートによる実態把握 ・相談窓口への連絡(処遇・労働条件等)への対応	現場作業	▼協力企業との意見交換会(10/30)					▼協力企業との意見交換会(11/30)					協力企業との意見交換会(12/25)▽																										
		7 大型休憩所の食堂の改修	(実績) ・食堂(3階)の運用再開(8/3) ・食堂化改修(2階)本工事 ・搬入口設置本工事	現場作業	食堂(3階)の運用					最新工程反映					最新工程反映					▽食堂(2階)の運用開始予定(11/30)																				
8 大型休憩所へのシャワー設備の設置	(実績) ・シャワー設備設置検討・設計	現場作業	シャワー設備設置検討・設計															シャワー設備設置本工事							2016年3月完了目標															
9 新事務本館の建設	(実績) ・掘削工事 ・基礎工事 ・鉄骨工事 ・床PC工事 ・外壁PC工事	現場作業	掘削工事															基礎工事					鉄骨工事					床PC工事					外壁PC工事							2016年8月完了目標
10 道路整備の実施	(実績) ・①車両整備場周辺道路工事(道路基礎部・路盤工・舗装) ・⑨土捨場周辺道路工事の検討・設計	検討・設計	⑨土捨場周辺道路工事の検討・設計															①車両整備場周辺道路工事(道路基礎部・路盤工・舗装)					追加工事実施による工程延長					⑨土捨場周辺道路工事(路盤工・舗装)												
		(予定) ・①車両整備場周辺道路工事(道路基礎部・路盤工・舗装) ・⑨土捨場周辺道路工事の検討・設計 ・⑩土捨場周辺道路工事(路盤工・舗装)	現場作業	①車両整備場周辺道路工事(道路基礎部・路盤工・舗装)															追加工事実施による工程延長					⑨土捨場周辺道路工事(路盤工・舗装)																
