

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年6月10日（月）

2 確認箇所

1/2号機排気筒付近（1/2号機開閉所前から確認）

3 確認項目

1/2号機排気筒解体工事における路盤整備工事の状況

4 確認結果の概要

1/2号機排気筒解体工事については、クレーンの吊り上げ可能高さが足りないことから、クレーンを1/2号機排気筒に近づけることでクレーン吊り上げ可能高さを確保することとなった。

本日は、クレーンを1/2号機排気筒に近づけるための路盤整備工事の状況を1/2号機開閉所前から確認した。


- ・1/2号機排気筒の近辺で重機により、路盤整備場所の地盤の整地が行われており、工事が開始されていることを確認した。（写真1）
- ・6月6日の状況と比較すると、1/2号FSTR建屋西側の工作物が撤去されており、撤去部分の一部はシートで養生されていた。（写真2）



（写真1）



(写真2-1)
6月6日撮影
丸印部分にいくつかの工作物がある

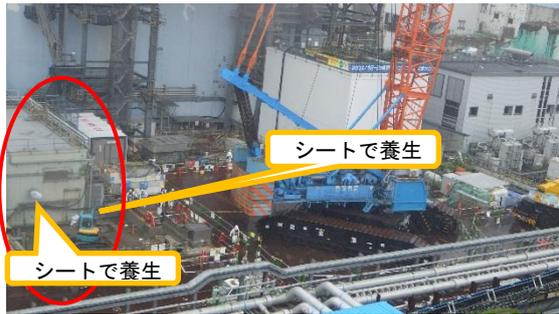

(写真2-2)
6月10日撮影
丸印部分の工作物が撤去されている

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。
