


## 6-2. タンク増設 (Jタンクエリア)

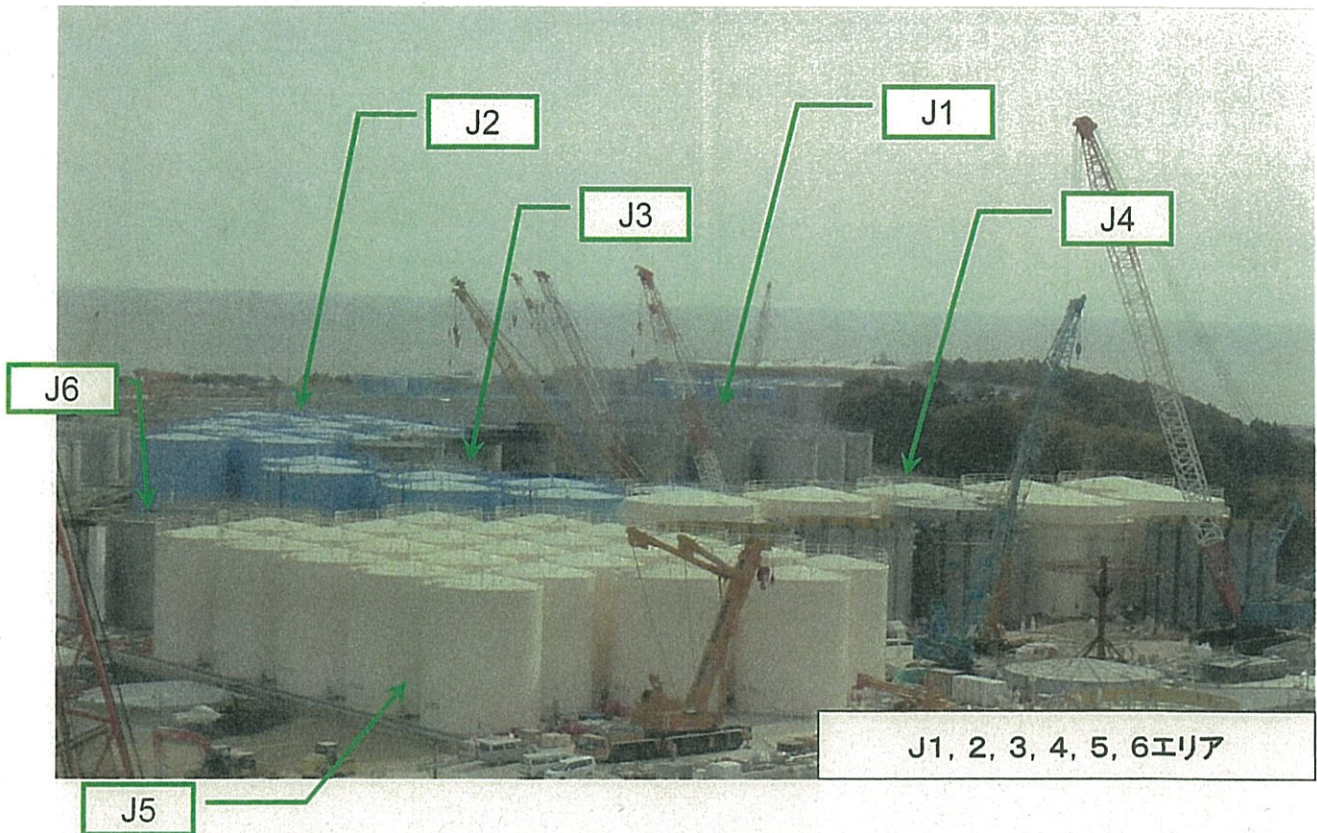

## 2-1. タンク工程 (新設分)

Jエリア タンク建設	J1 現地溶接型	実績	平成26年度												11月の見込 /計画基数	
			3月まで	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
J2/3 現地溶接型	10月27日見直	実績	53.0	18.0	15.0	7.0	4.0	3.0	太数字: タンク容量 (単位: 千m <sup>3</sup> )						100基/100基	
	基数							14.4	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	19.2		
	11月進捗見込	基数							6	10	10	10	10	10	8	
J5 完成型	10月27日進捗・見込	実績					9.9	3.7	0.0	8.6	9.9	11.1				22基/64基
	基数						8	3	0	7	8	9				
	11月進捗見込	基数					9.9	3.7	0.0	8.6	9.9	11.1				
J4 現地溶接	10月27日進捗・見込	実績								11.6	20.3	14.5	14.5	17.4	14.5	26基/35基
	基数									4	7	5	5	6	5	
	11月進捗見込	基数								11.6	17.4	17.4	14.5	17.4	14.5	
G7エリア 完成型	実績				7.0					4	6	6	5	6	5	10基/32基
	基数				10											10基/10基
J6エリア 現地溶接型	10月27日進捗・見込	実績							地盤改良・基礎設置							
	基数										7.2	12.0	14.4	12.0		
	11月進捗見込	基数									6	10	12	10		
J7 現地溶接型	10月27日進捗・見込	実績							地盤改良・基礎設置						6基/38基	
	基数											6	10	12	10	
	11月進捗見込	基数											9.6	9.6	9.6	
K1北エリア 現地溶接型	10月27日進捗・見込	実績										7.2	4.8	2.4		精査中
	基数											6	4	2		
	11月進捗見込	基数										7.2	4.8	2.4		
K1南エリア 完成型	10月27日進捗・見込	実績										6	4	2		6基/12基
	基数												2.4	4.8	4.8	
	11月進捗見込	基数											2	4	4	
K2エリア 完成型	10月27日進捗・見込	実績							地盤改良・基礎設置						0基/10基	
	基数											4.0	8.0	8.0	8.0	
	11月進捗見込	基数										4	8	8	8	
		実績										0.0	8.0	8.0	12.0	
		基数										0	8	8	12	0基/28基
