

(この便りは、相双建設事務所が取り組む復旧・復興事業の進捗状況などをお伝えするものです。)

◆新地町内で復旧・復興工事を進めています。



相双建設事務所は、震災の津波被害を受けた沿岸部において、海岸・河川の堤防や道路のほか、津波の勢いを和らげる効果を持つ防災緑地を整備しています。

このうち新地町内では、以下の復旧・復興工事を進めており、木崎地区海岸、埴川、三滝川、濁川の工事は平成27年度に完成する予定です。

道路や防災緑地についても、一日も早く工事を完成し、災害に強い安全で安心できる生活環境を確保してまいります。

新地町内の復旧・復興工事【相双建設事務所】

番号	施設(海岸・道路等)	工事概要	現在の主な事業状況	進捗率
①	木崎地区海岸	海岸堤防整備 1,080m	堤防護岸を施工中	概ね6割
②	埴川	河川堤防整備 1,305m	堤防護岸を施工中	概ね8割
③	三滝川	河川堤防整備 1,387m	堤防護岸を施工中	概ね6割
④	砂子田川	河川堤防整備 1,500m	堤防盛土を施工中	概ね4割
⑤	濁川	河川堤防整備 1,247m	堤防張芝を施工中	概ね9割
⑥	地藏川	河川堤防整備 1,900m	事業用地を取得中	概ね4割
⑦	相馬互理線(新地工区)	道路整備 3,600m	道路盛土を施工中	概ね5割
⑧	金山新地停車場線	道路整備 700m	事業用地を取得中	概ね2割
⑨	新地停車場釣師線	道路整備 1,400m	橋梁工事を施工中	概ね5割
⑩	相馬互理線(大戸浜工区)	道路整備 1,700m	事業用地を取得中	概ね2割
⑪	相馬互理線(谷地小屋～埴木崎)	道路・橋梁復旧 1,800m	橋梁工事を施工中	概ね4割
⑫	埴浜地区防災緑地	防災緑地整備 24.5ha	緑地盛土を施工中	概ね5割

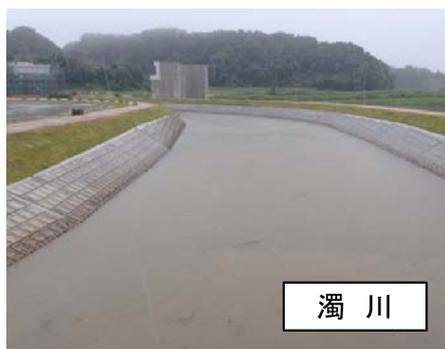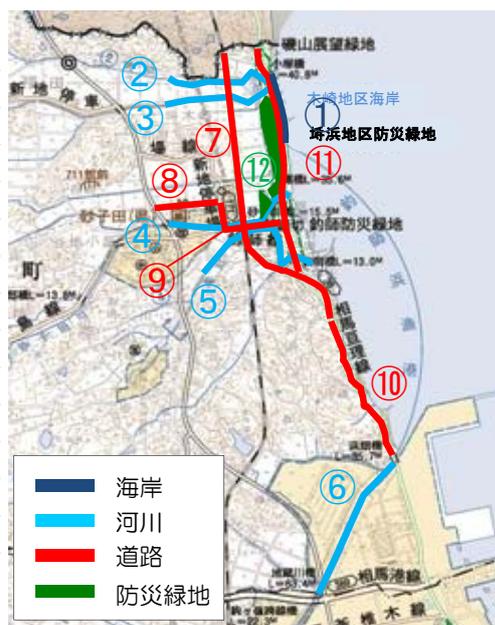

工事監督員の声【木崎地区海岸】(山本技師：滋賀県からの応援職員)

工事は順調に進捗していますが、新地町内では多数の工事が行われておりますので、引き続き他工事との調整を適切に図りながら、一日も早い完成を目指し頑張っております。

◆新地町内の小学生がドングリの苗作り(埴浜地区防災緑地)を行いました

6月15日(月)～26日(金)にかけて、新地町内の3つの小学校で各児童に協力をいただき、埴浜地区防災緑地に植えるドングリの苗作りを行いました。

今回の取り組みは、将来的にレクリエーションや自然とのふれあいの場としても活用される予定の防災緑地に、地域の皆さまが親しんでいただくため実施したものです。

当日は苗作りに先立ち、防災緑地を知ってもらうために、役割や完成時のイメージ、子供たちと一緒に作り育てる意味などを説明したところ、児童たちは一生懸命に聞いている様子でした。



新地小学校の様子



福田小学校の様子



駒ヶ嶺小学校の様子

◆相馬亘理線・原工区(相馬市内)の道路復旧工事が完了しました。


相馬市の松川浦沿いを通る県道相馬亘理線(1.2km間)は、震災の地震により約60cm地盤が沈下し、道路冠水が頻発していました。

そこで、平成23年度に道路のかさ上げ工事(原工区)に着手し、松川浦の水を締め切りながら施工を進め、このたび無事、工事を完了することができました。

今回の工事では、相馬市と連携して道路背後の盛土なども行い、隣接する家屋や店舗、旅館への安全な出入り等も確保しました。



相馬亘理線・原工区 1.2km




復旧工事が完了した相馬亘理線・原工区

◆その他の情報

◇震災等の災害復旧工事の進捗(H27.6月末)

※対象は相双建設事務所が管理する道路、河川、海岸等であり、放射線量が高く査定が未実施の避難指示区域の一部は含まず。率は事業箇所数で算出した割合。



◇県道原町川俣線 八木沢トンネルの掘削状況

H27.7.21現在、全長2,345mのうち南相馬市側から1,543m地点を掘削中。(残り802m)

○次回は、「ふくしま復興再生道路(浪江拡幅1工区)の整備」をお伝えする予定です。
(事業の進捗状況等により変更する場合があります)

