


県管理道路除染進捗図

2015年12月末現在

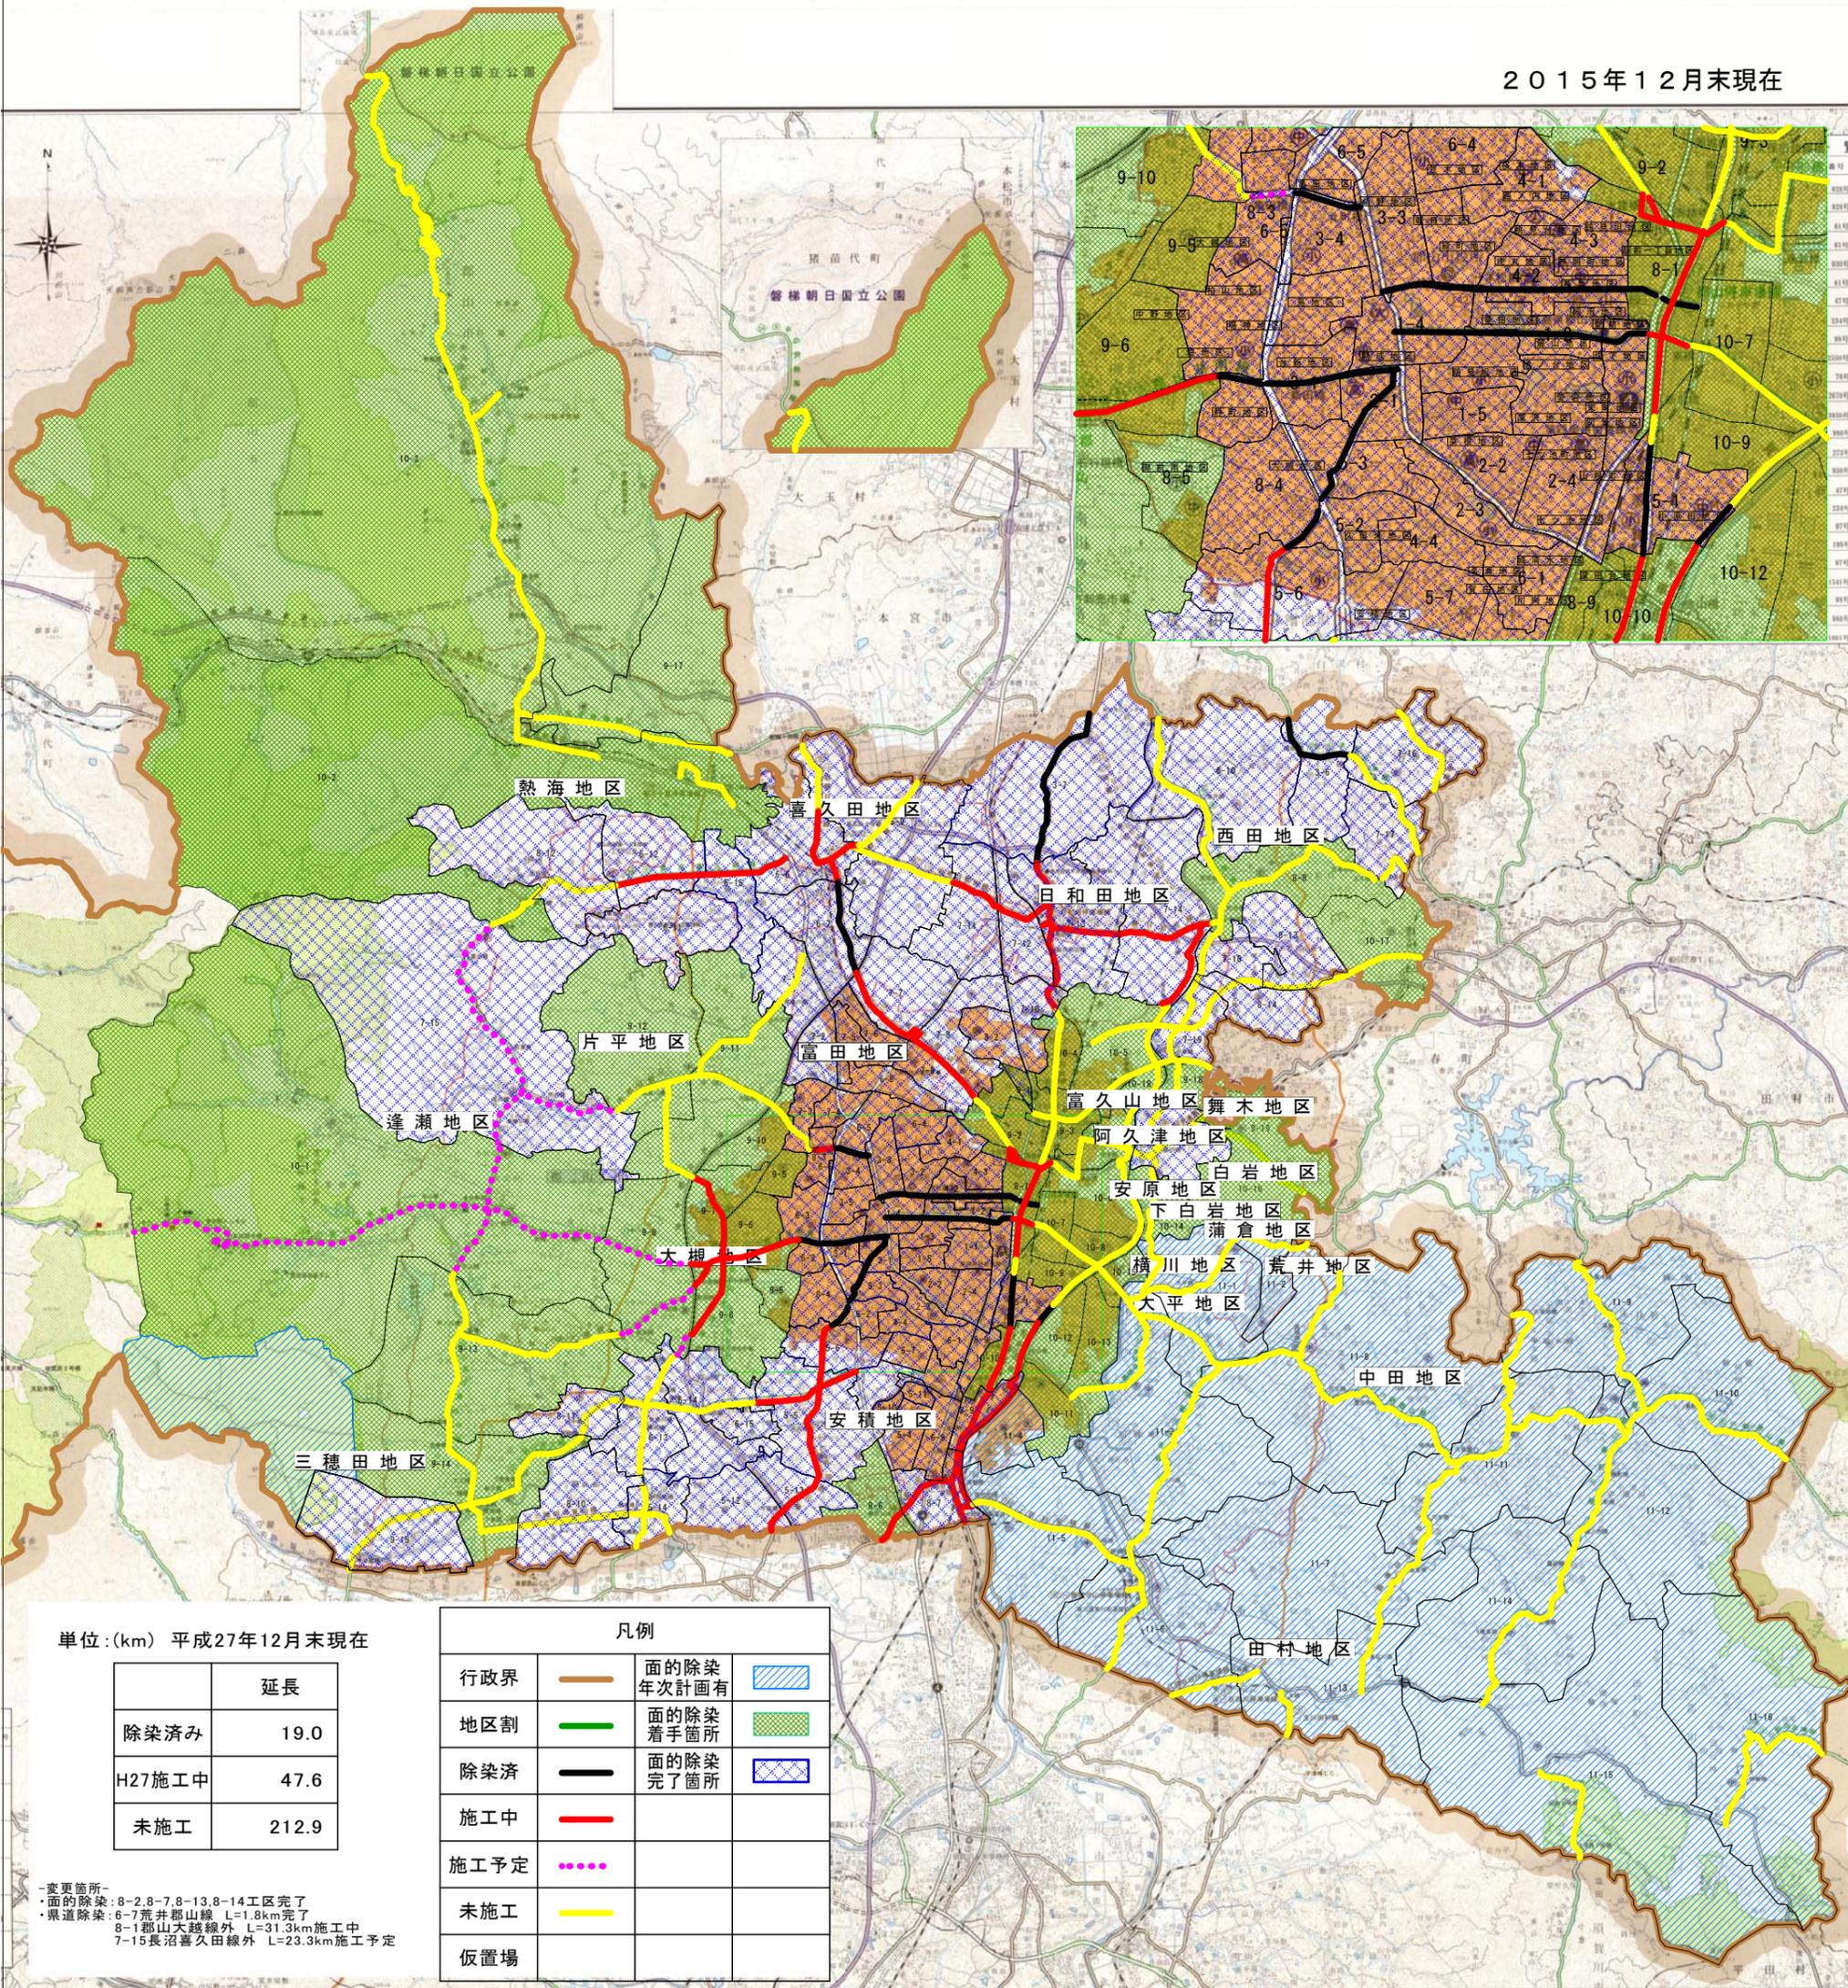

単位:(km) 平成27年12月末現在

	延長
除染済み	19.0
H27施工中	47.6
未施工	212.9

凡例		
行政界	— (brown line)	面の除染 年次計画有 (blue diagonal lines)
地区割	— (green line)	面の除染 着手箇所 (green checkered pattern)
除染済	— (black line)	面の除染 完了箇所 (blue checkered pattern)
施工中	— (red line)	
施工予定	— (dotted pink line)	
未施工	— (yellow line)	
仮置場		

-変更箇所-
 ・面の除染: 8-2, 8-7, 8-13, 8-14工区完了
 ・県道除染: 6-7荒井郡山線 L=1.8km完了
 8-1郡山大越線外 L=31.3km施工中
 7-15長沼喜久田線外 L=23.3km施工予定

1:50,000

石川土木事務所管内

県管理道路除染進捗図


平成27年12月末現在

玉川村内の国県道を『対象外』としました。

凡例


	行政界
	地区割
	除染済
	施工中
	H26施工予定
	未施工
	面的除染 年次計画有
	面的除染 着手箇所
	面的除染 完了箇所

1:100,000 (1km=1cm)



県管理河川公園除染進捗状況図


平成27年12月末現在

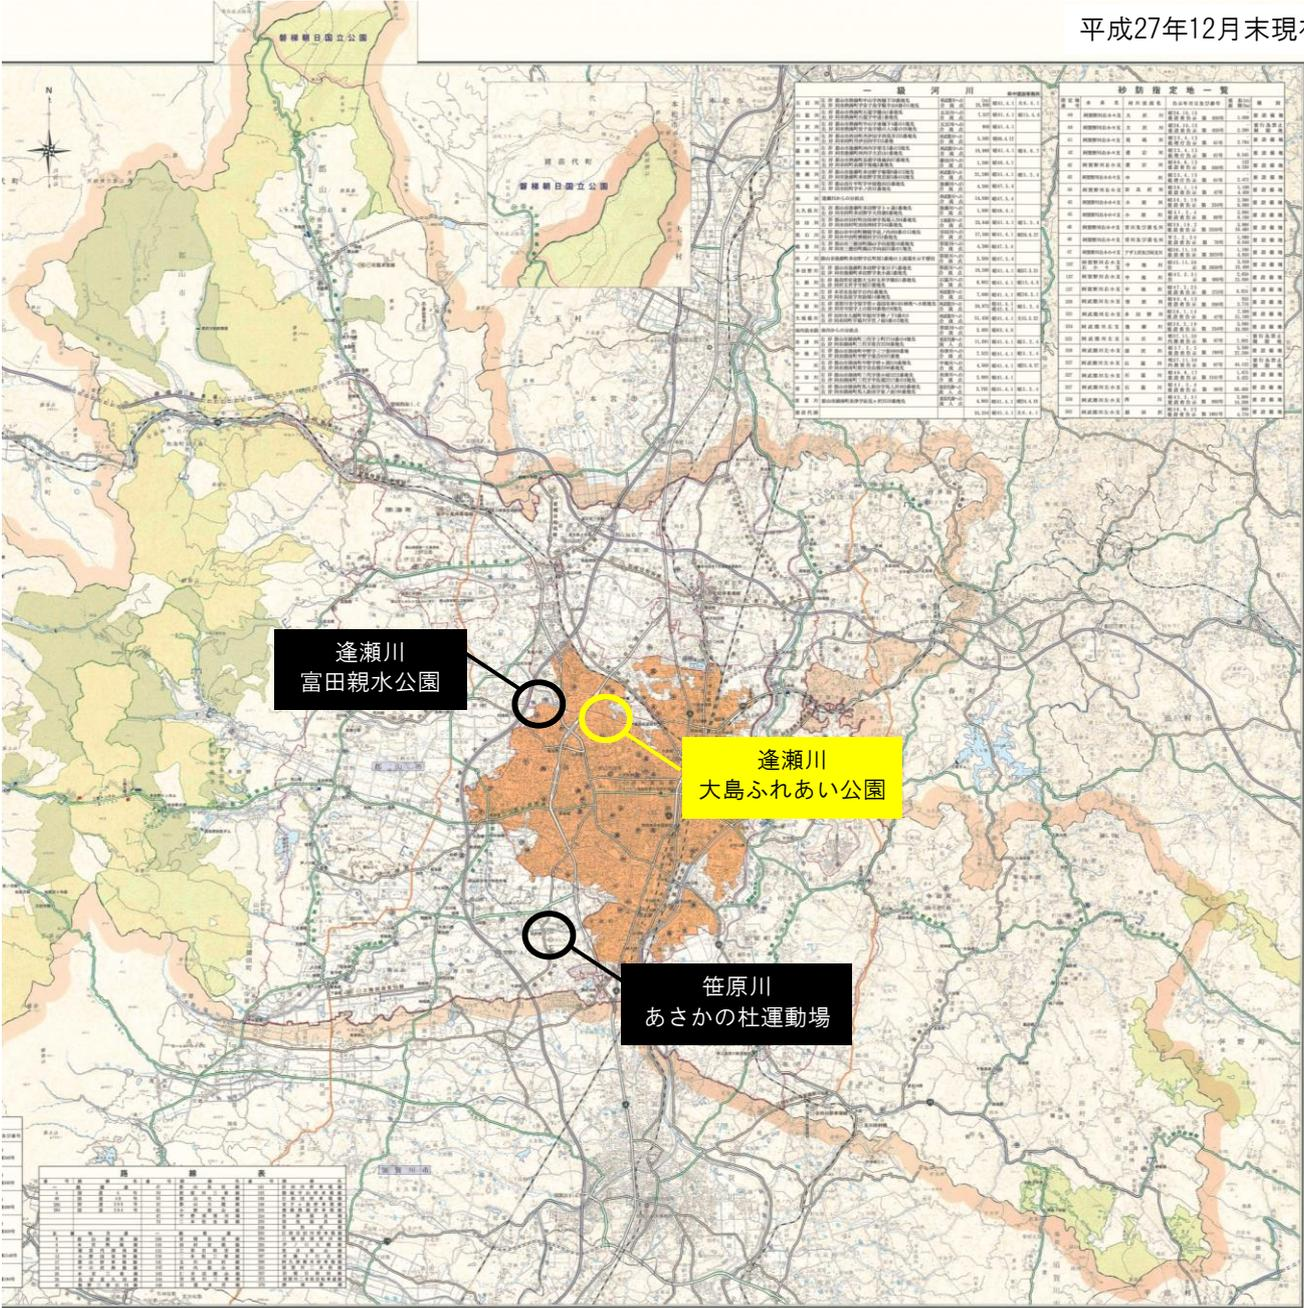

凡 例	
○	除染済
○	施工中
○	H27施工予定
○	未実施

県管理公園・下水道施設除染進捗状況図

平成27年12月末現在

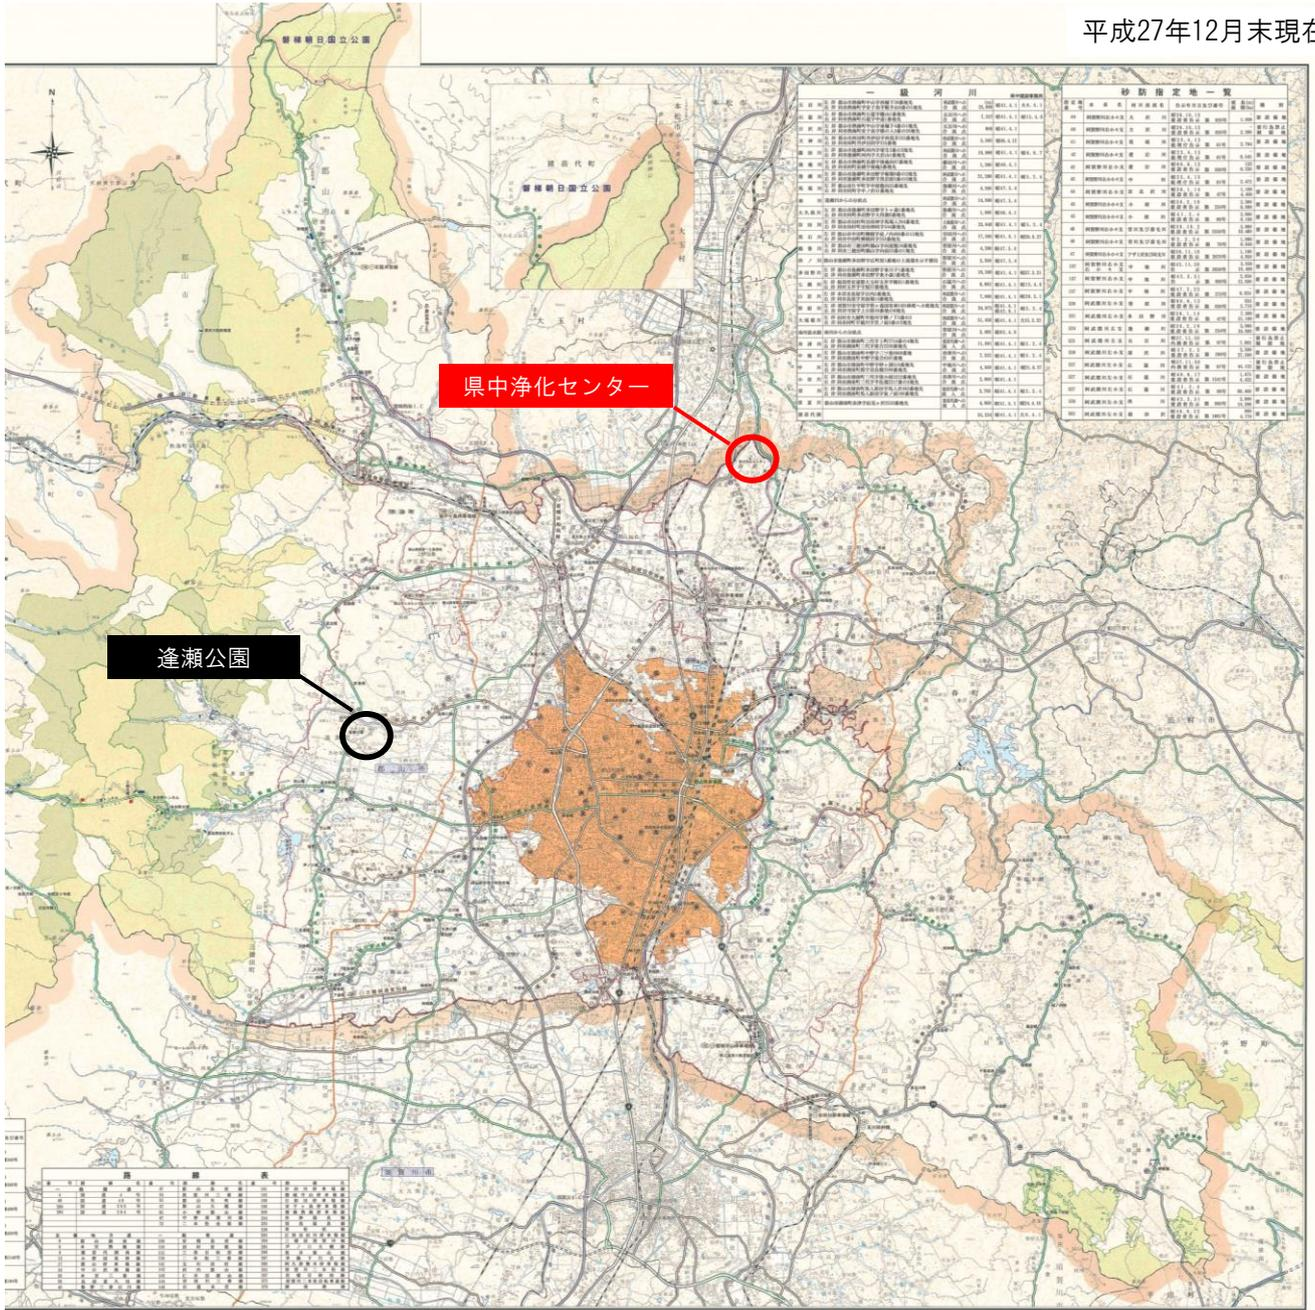

凡 例	
○	除染済
○	施工中
○	H27施工予定
○	未実施

