


## 【いわき市と川内村を結ぶバイパス工事の進み具合をお知らせいたします。】

### ■工事の進捗率（平成30年4月末現在）


#### ●十文字工区 道路改良工事進捗率

**26.9 %**


※十文字工区バイパス計画延長6.2kmのうち、県施工延長L=2.9kmの工事進捗割合を表しております。

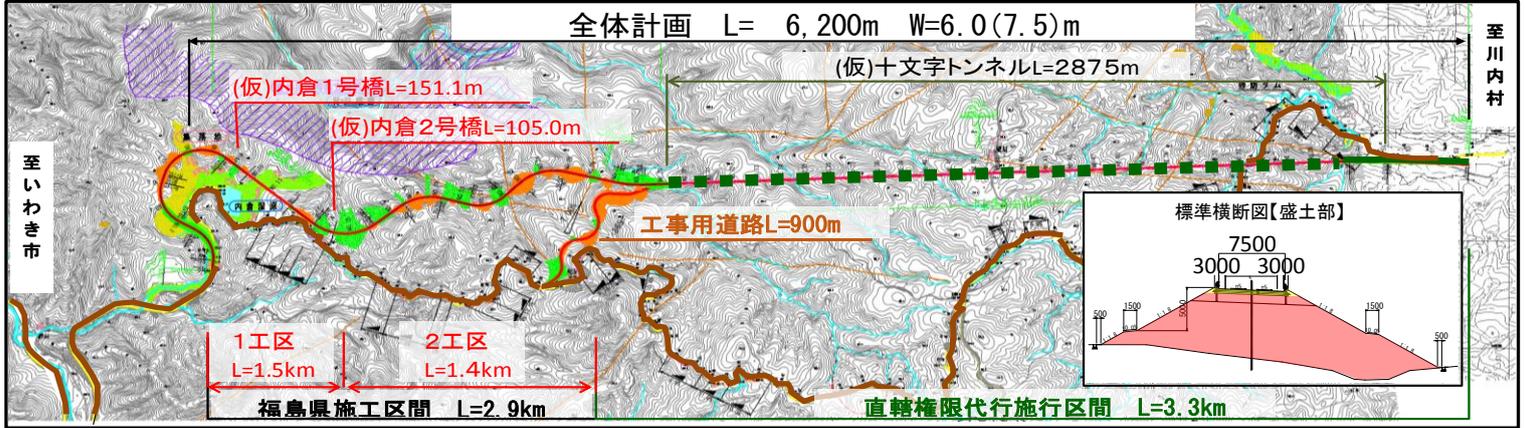

#### ■位置図（平面図）

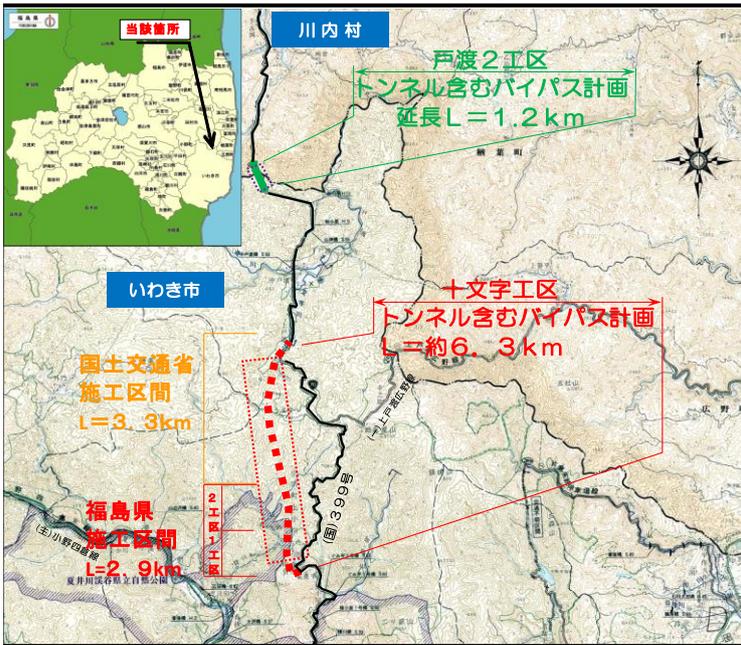

#### ■航空写真

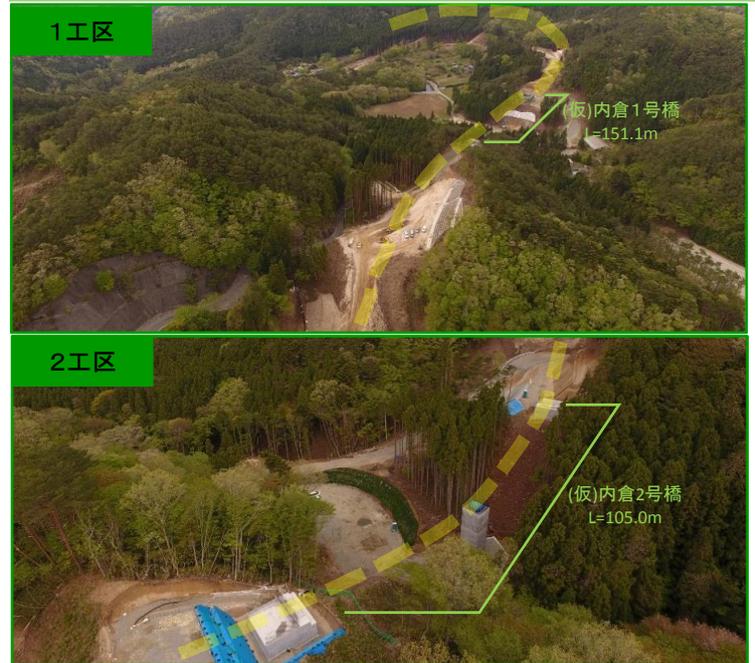

#### ■施工状況写真



【補強土壁施工】  
急峻な沢地形となっているところに補強土壁を設置しています。  
左写真の長い帯形状のものがストリップという補強材で、盛り土に挟みながらしっかり転圧することで、とても強固な壁を創ることができます。



【P1橋脚】  
(仮)内倉2号橋の中心に位置するP1橋脚です。全高28mのうち23mまで完成しました。これから上部工の施工者へ引き継がれ、残り5mを施工した後、いよいよ橋本体(橋梁上部工)の工事となります。
