



宇多川【相馬市】



木戸川【川内村】

令和元年東日本台風等の 災害復旧の進捗状況



新田川【南相馬市】




浅見川【広野町】

相双建設事務所・富岡土木事務所
令和3年7月7日

- 1 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について
- 2 災害復旧事業の進捗状況について
- 3 河川の河道掘削等の実施状況について
- 4 河川の堤防補強等の実施状況について
- 5 河川改修事業の進捗状況について

1 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

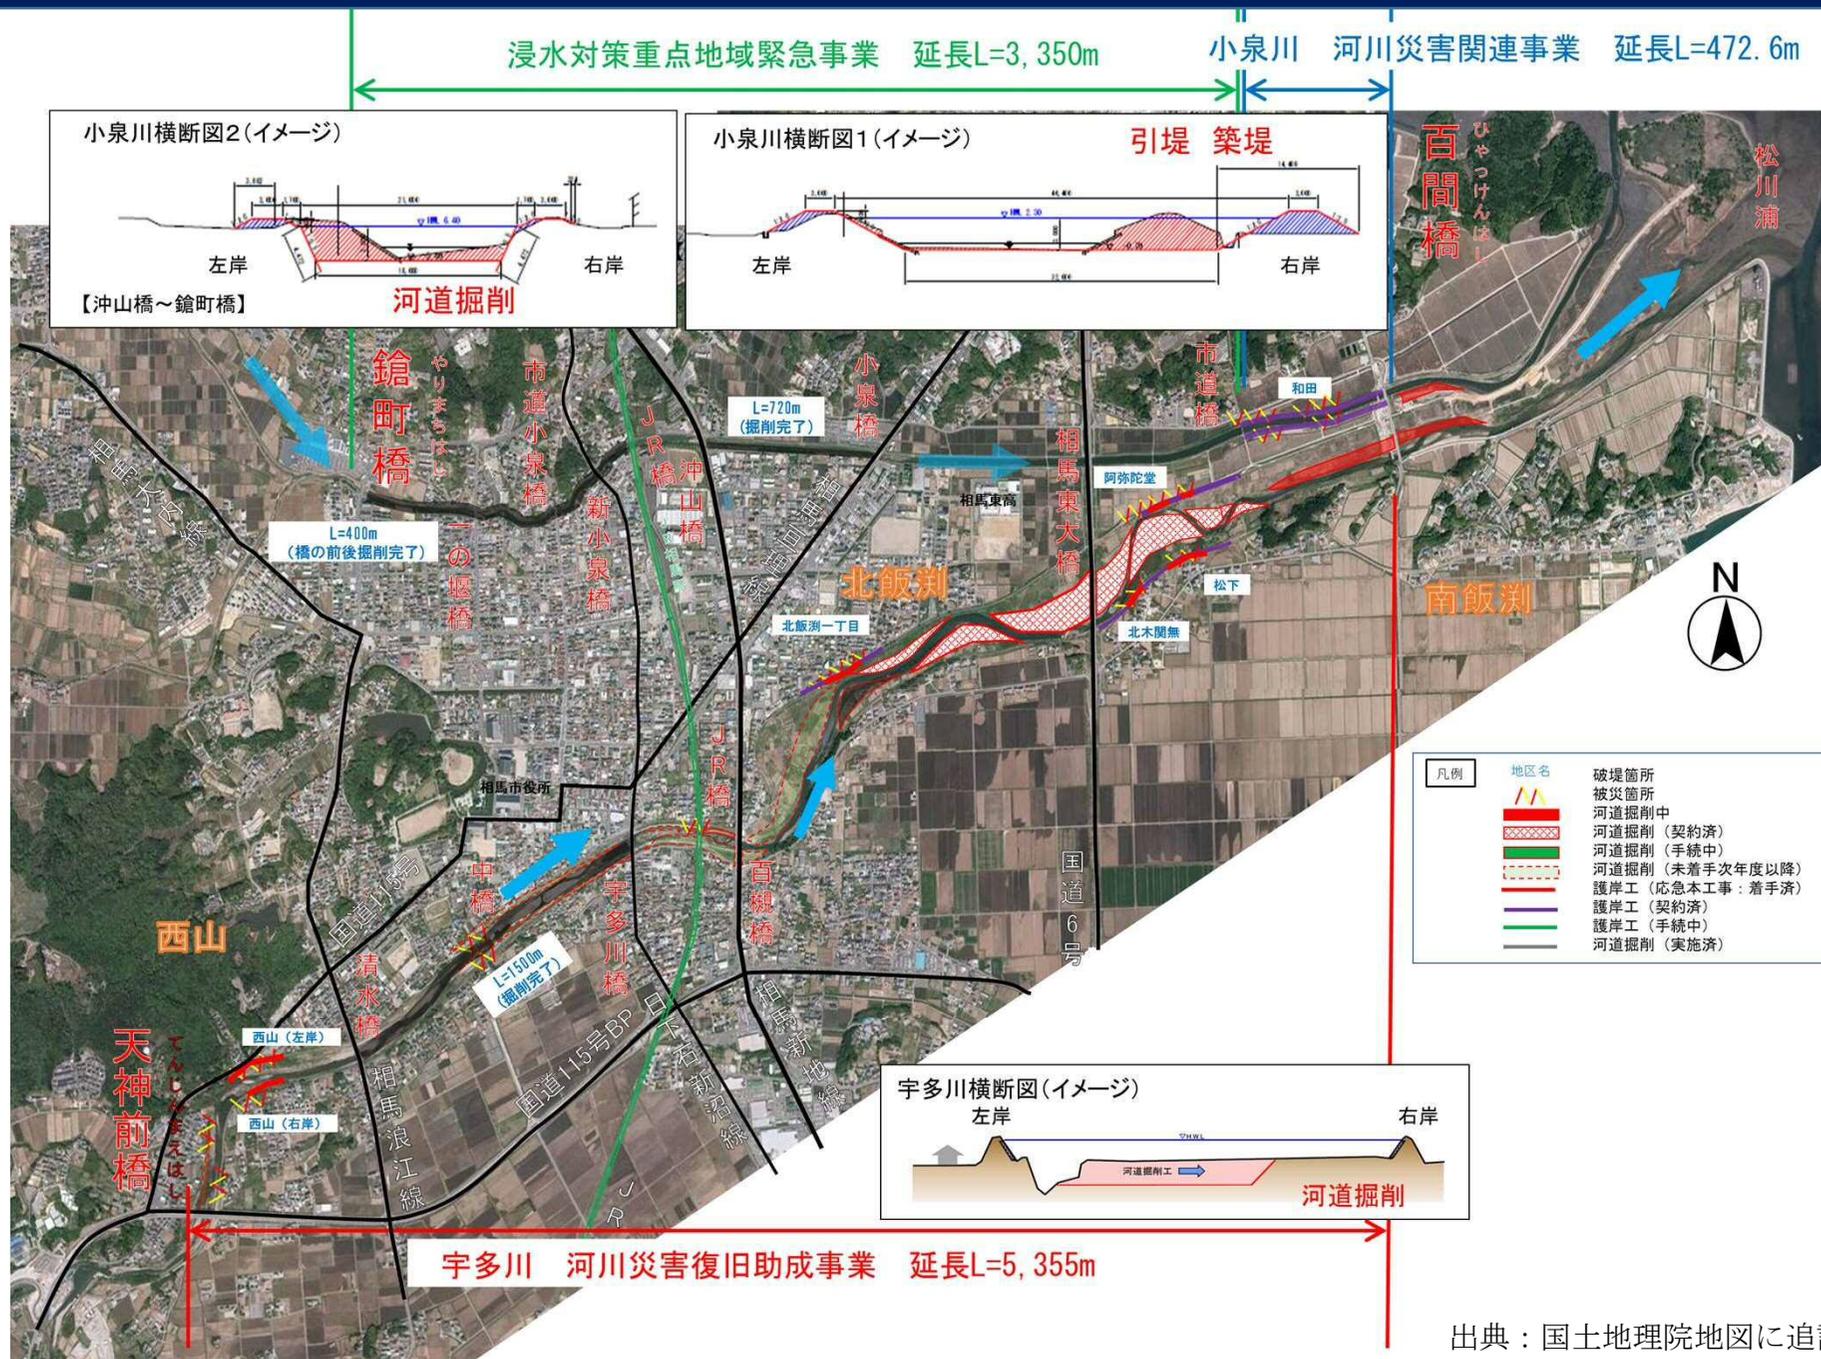

1 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

宇多川
相馬市南飯渚北木関無

河道掘削



施工状況



R3.6.1現在



1 宇多川や小泉川の改良復旧事業等について

宇多川
相馬市北飯渚

河道掘削



施工状況



施工状況



2 災害復旧事業の進捗状況について

令和3年6月末現在

事務所名	工種	被災 箇所数 A	施工中		完了済	
			箇所数 B	率 C=B/A	箇所数 D	率 E=D/A
相双建設 事務所	小計	249	228	92%	137	55%
	河川	206	187	91%	110	53%
	砂防	11	11	100%	3	27%
	道路	32	30	94%	24	75%
富岡土木 事務所	小計	136	136	100%	116	85%
	河川	98	98	100%	87	89%
	砂防	1	1	100%	1	100%
	道路	37	37	100%	28	76%
合 計	計	385	364	95%	253	66%
	河川	304	285	94%	197	65%
	砂防	12	12	100%	4	33%
	道路	69	67	97%	52	75%

※ 完了済み箇所は、施工中の内数である。

2 災害復旧事業の進捗状況について

三滝川
相馬郡新地町

大字福田字中里

復旧延長

護岸工

10m

進捗率

100%



施工前



施工状況



施工状況

完了



2 災害復旧事業の進捗状況について

宇多川
相馬市中川

護岸工

復旧延長

180.1m

進捗率

100%



施工前



施工状況



完了



2 災害復旧事業の進捗状況について

新田川
南相馬市原町区大谷

復旧延長

護岸工

640.7m

進捗率

80%



施工前



施工状況



R3.6.9現在



2 災害復旧事業の進捗状況について

新田川
南相馬市原町区大谷

復旧延長

護岸工

182.7m

進捗率

100%



施工前



施工状況



完了



2 災害復旧事業の進捗状況について

股田川 相馬郡飯舘村館東

復旧延長

護岸工

14.0m

進捗率


100%



施工前



施工状況

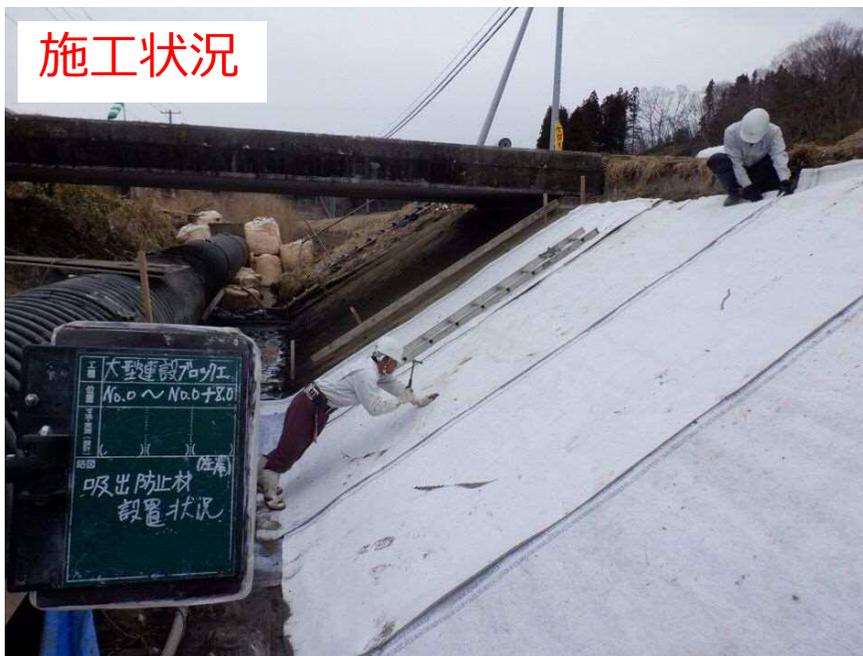

完了



2 災害復旧事業の進捗状況について

浅見川
双葉郡広野町大字上浅見川
字虻木地内外

復旧延長

護岸工

44.7m

進捗率

100%



施工状況



完了



2 災害復旧事業の進捗状況について

上戸渡広野線
双葉郡広野町大字上浅見川
字下箒平4号地内

復旧延長

護岸工

19.5m

進捗率

30%



施工前



施工状況



2 災害復旧事業の進捗状況について

小白井川 双葉郡川内村大字上川内

復旧延長	護岸工
	277m
進捗率	100%



2 災害復旧事業の進捗状況について

木戸川
双葉郡楡葉町大谷

復旧延長
護岸工

55m

進捗率
100%



被災直後



2 災害復旧事業の進捗状況について

北迫川
双葉郡楡葉町大谷

復旧延長 護岸工

29m

進捗率 100%



施工前



完了



施工状況



3 河川の河道掘削等の実施状況について

太田川
南相馬市原町区益田

河道掘削



施工前



施工状況



施工状況

3 河川の河道掘削等の実施状況について

北川
南相馬市原町区大原

河道掘削



施工前



施工状況



完了



4 河川の堤防補強等の実施状況について

請戸川
双葉郡浪江町大字苧宿

堤防天端舗装

施工状況



施工前



完了

施工状況



4 河川の堤防補強等の実施状況について

木戸川
双葉郡川内村大字下川内

堤防天端舗装

施工状況



施工前



施工状況



4 河川の堤防補強等の実施状況について

北迫川
双葉郡広野町大字下北迫

堤防天端舗装



施工前



施工状況



4 河川の堤防補強等の実施状況について

井出川
双葉郡楡葉町大字井出

堤防天端舗装

施工状況



施工状況



施工前



完了



工種	舗装工
位置	No. 2
法	() () ()
略図	
現在状況	

工種	表層工
位置	No. 10
法	() () ()
略図	
アスファルト舗装状況	

工種	表層工
位置	No. 02
法	() () ()
略図	
舗装完了	

4 河川の堤防補強等の実施状況について

富岡川
双葉町富岡町大字本岡

堤防天端舗装

施工状況



施工状況



5 河川改修事業の進捗状況について（木戸川）

木戸川 全体計画 L=2.4km



至田村市 (都路)



5 河川改修事業の進捗状況について（木戸川）

木戸川
双葉郡川内村上川内

河川改修



被災直後


施工状況



施工状況



5 河川改修事業の進捗状況について（浅見川）

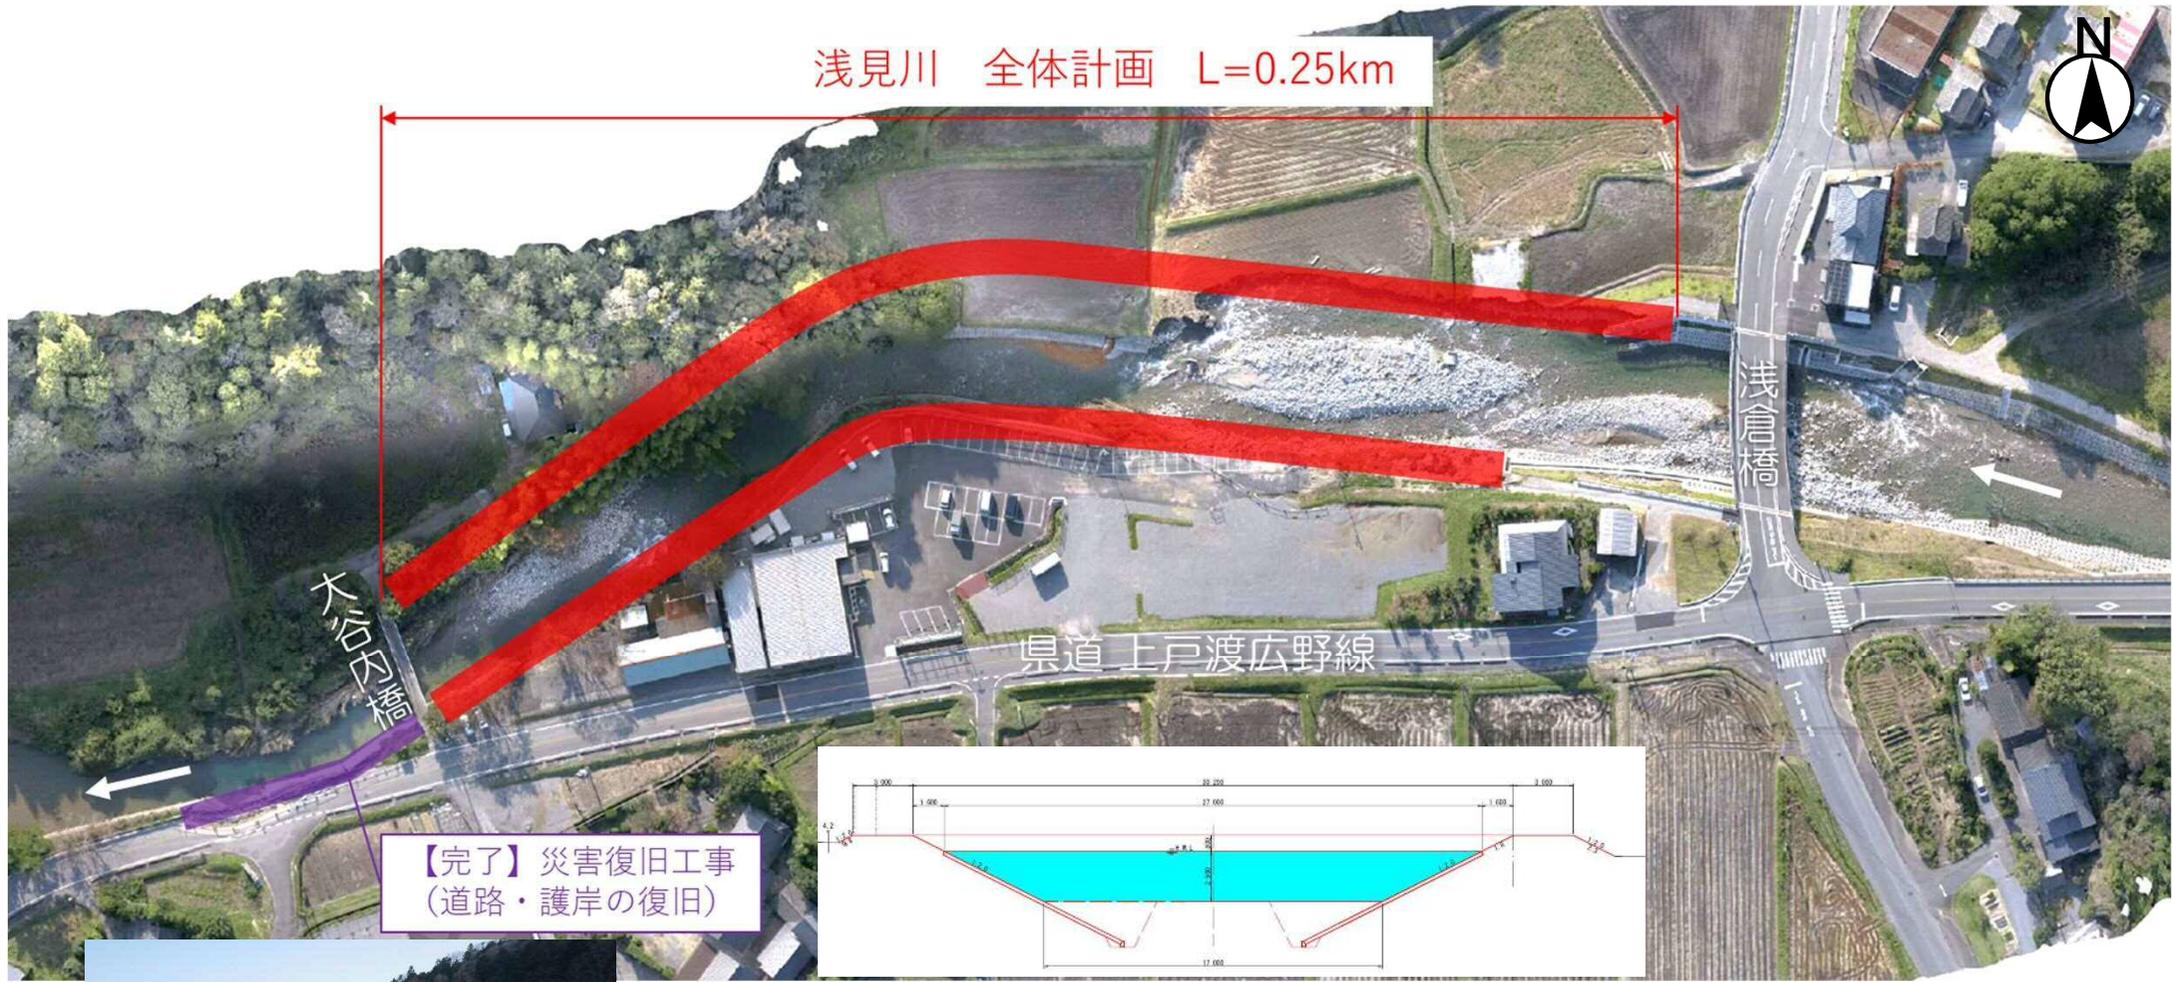

5 河川改修事業の進捗状況について（浅見川）

浅見川
双葉郡広野町上浅見川

河川改修




施工状況



施工状況



5 河川改修事業の進捗状況について（水無川）

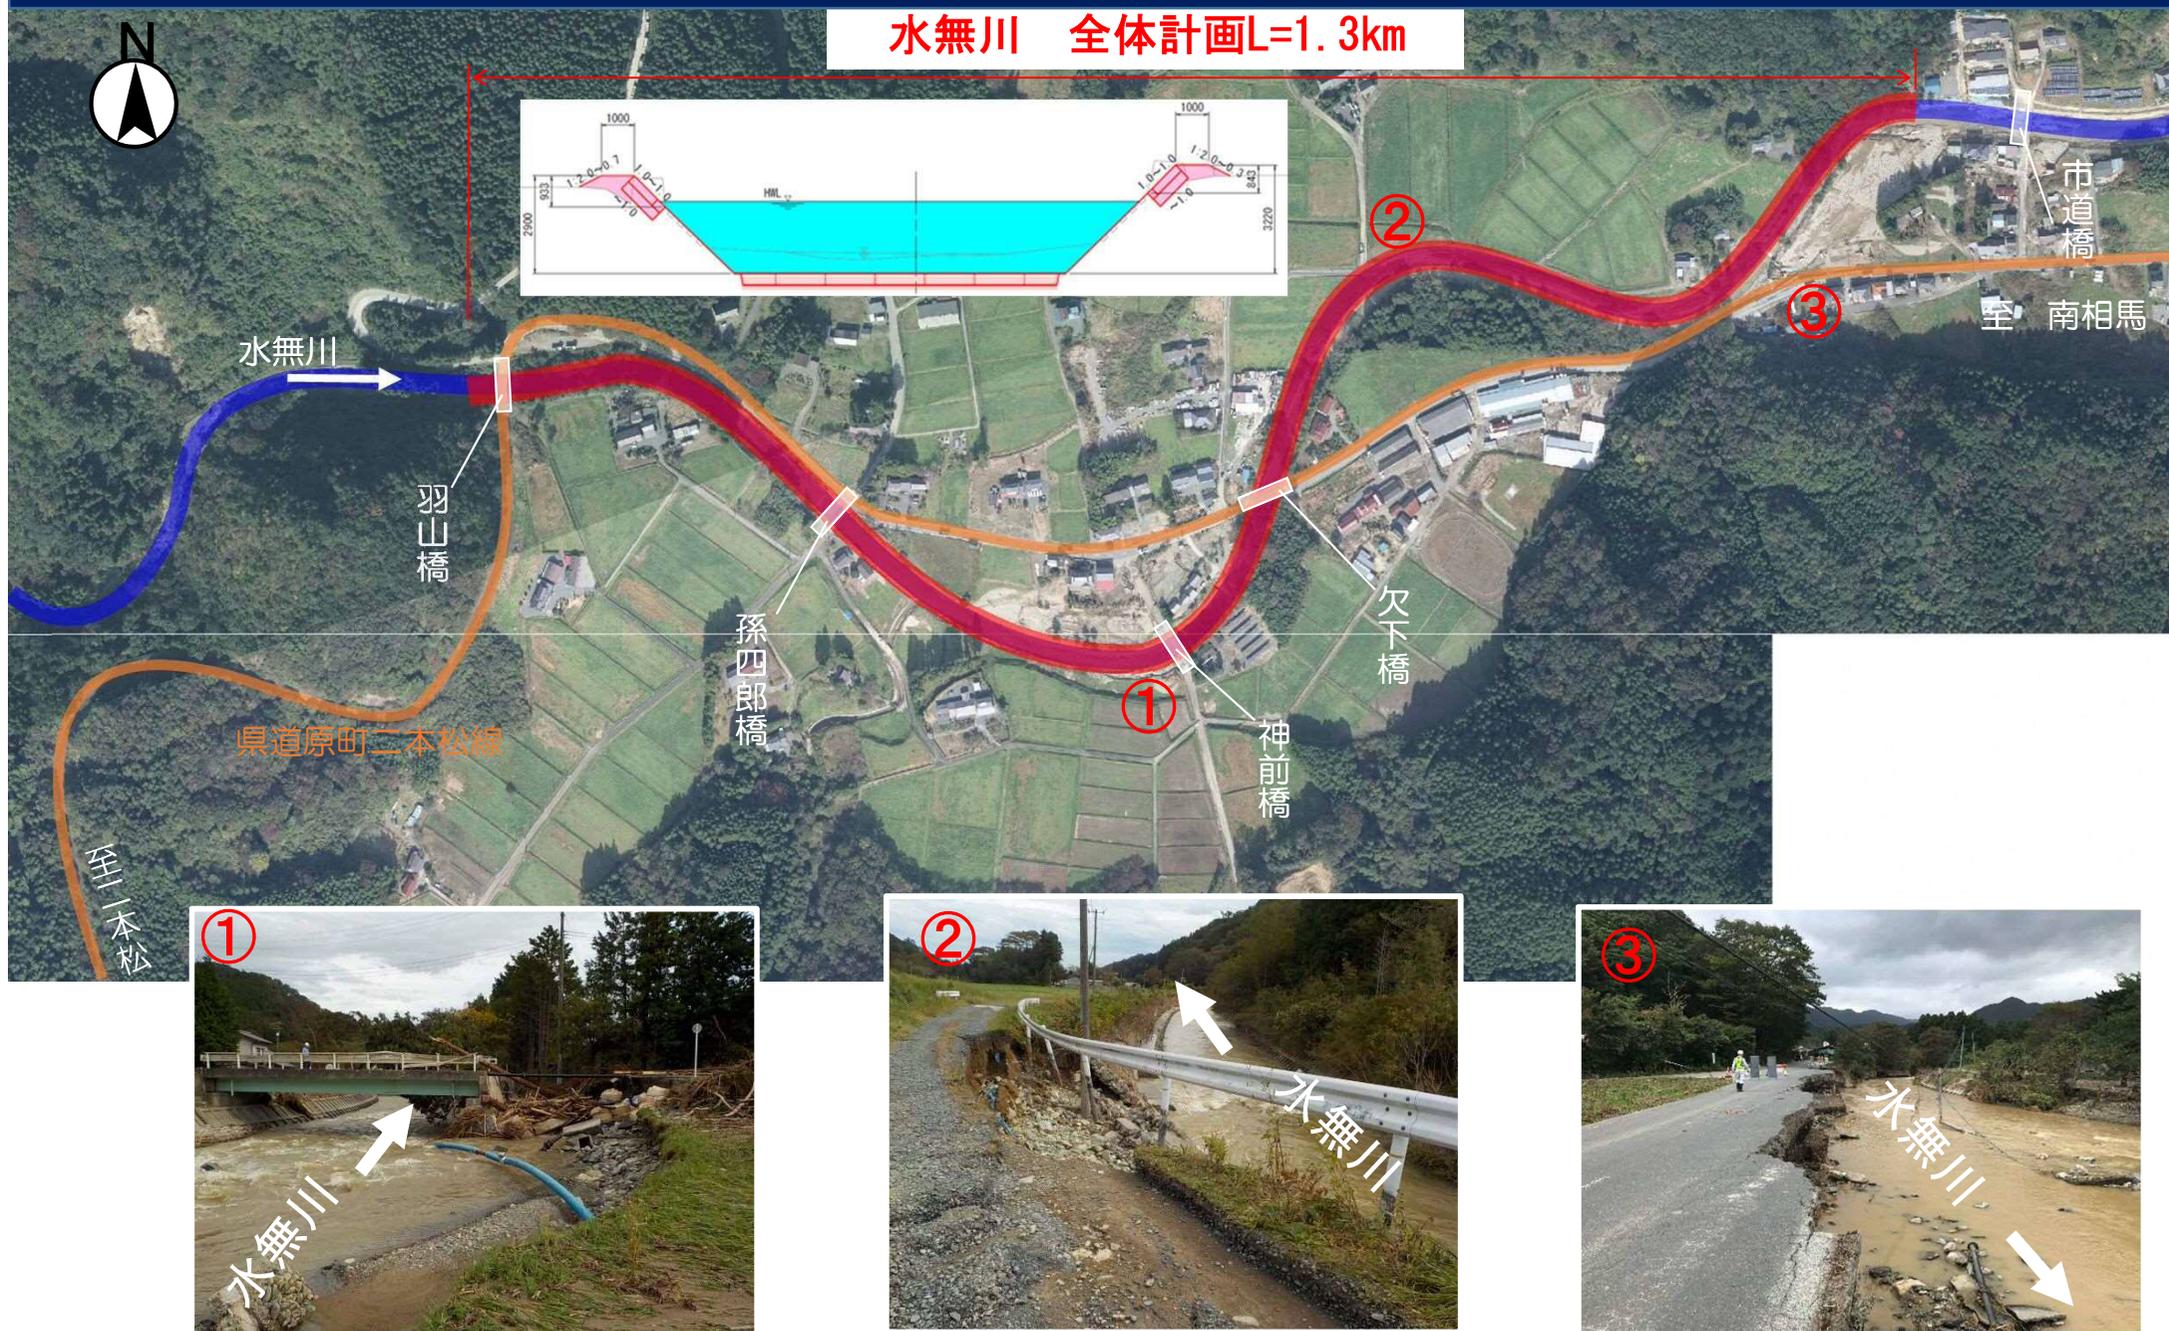

5 河川改修事業の進捗状況について（水無川）

水無川
南相馬市原町区高倉

河川改修



被災直後

水無川

施工状況



施工状況

