


県管理道路除染進捗図

2016年11月末現在

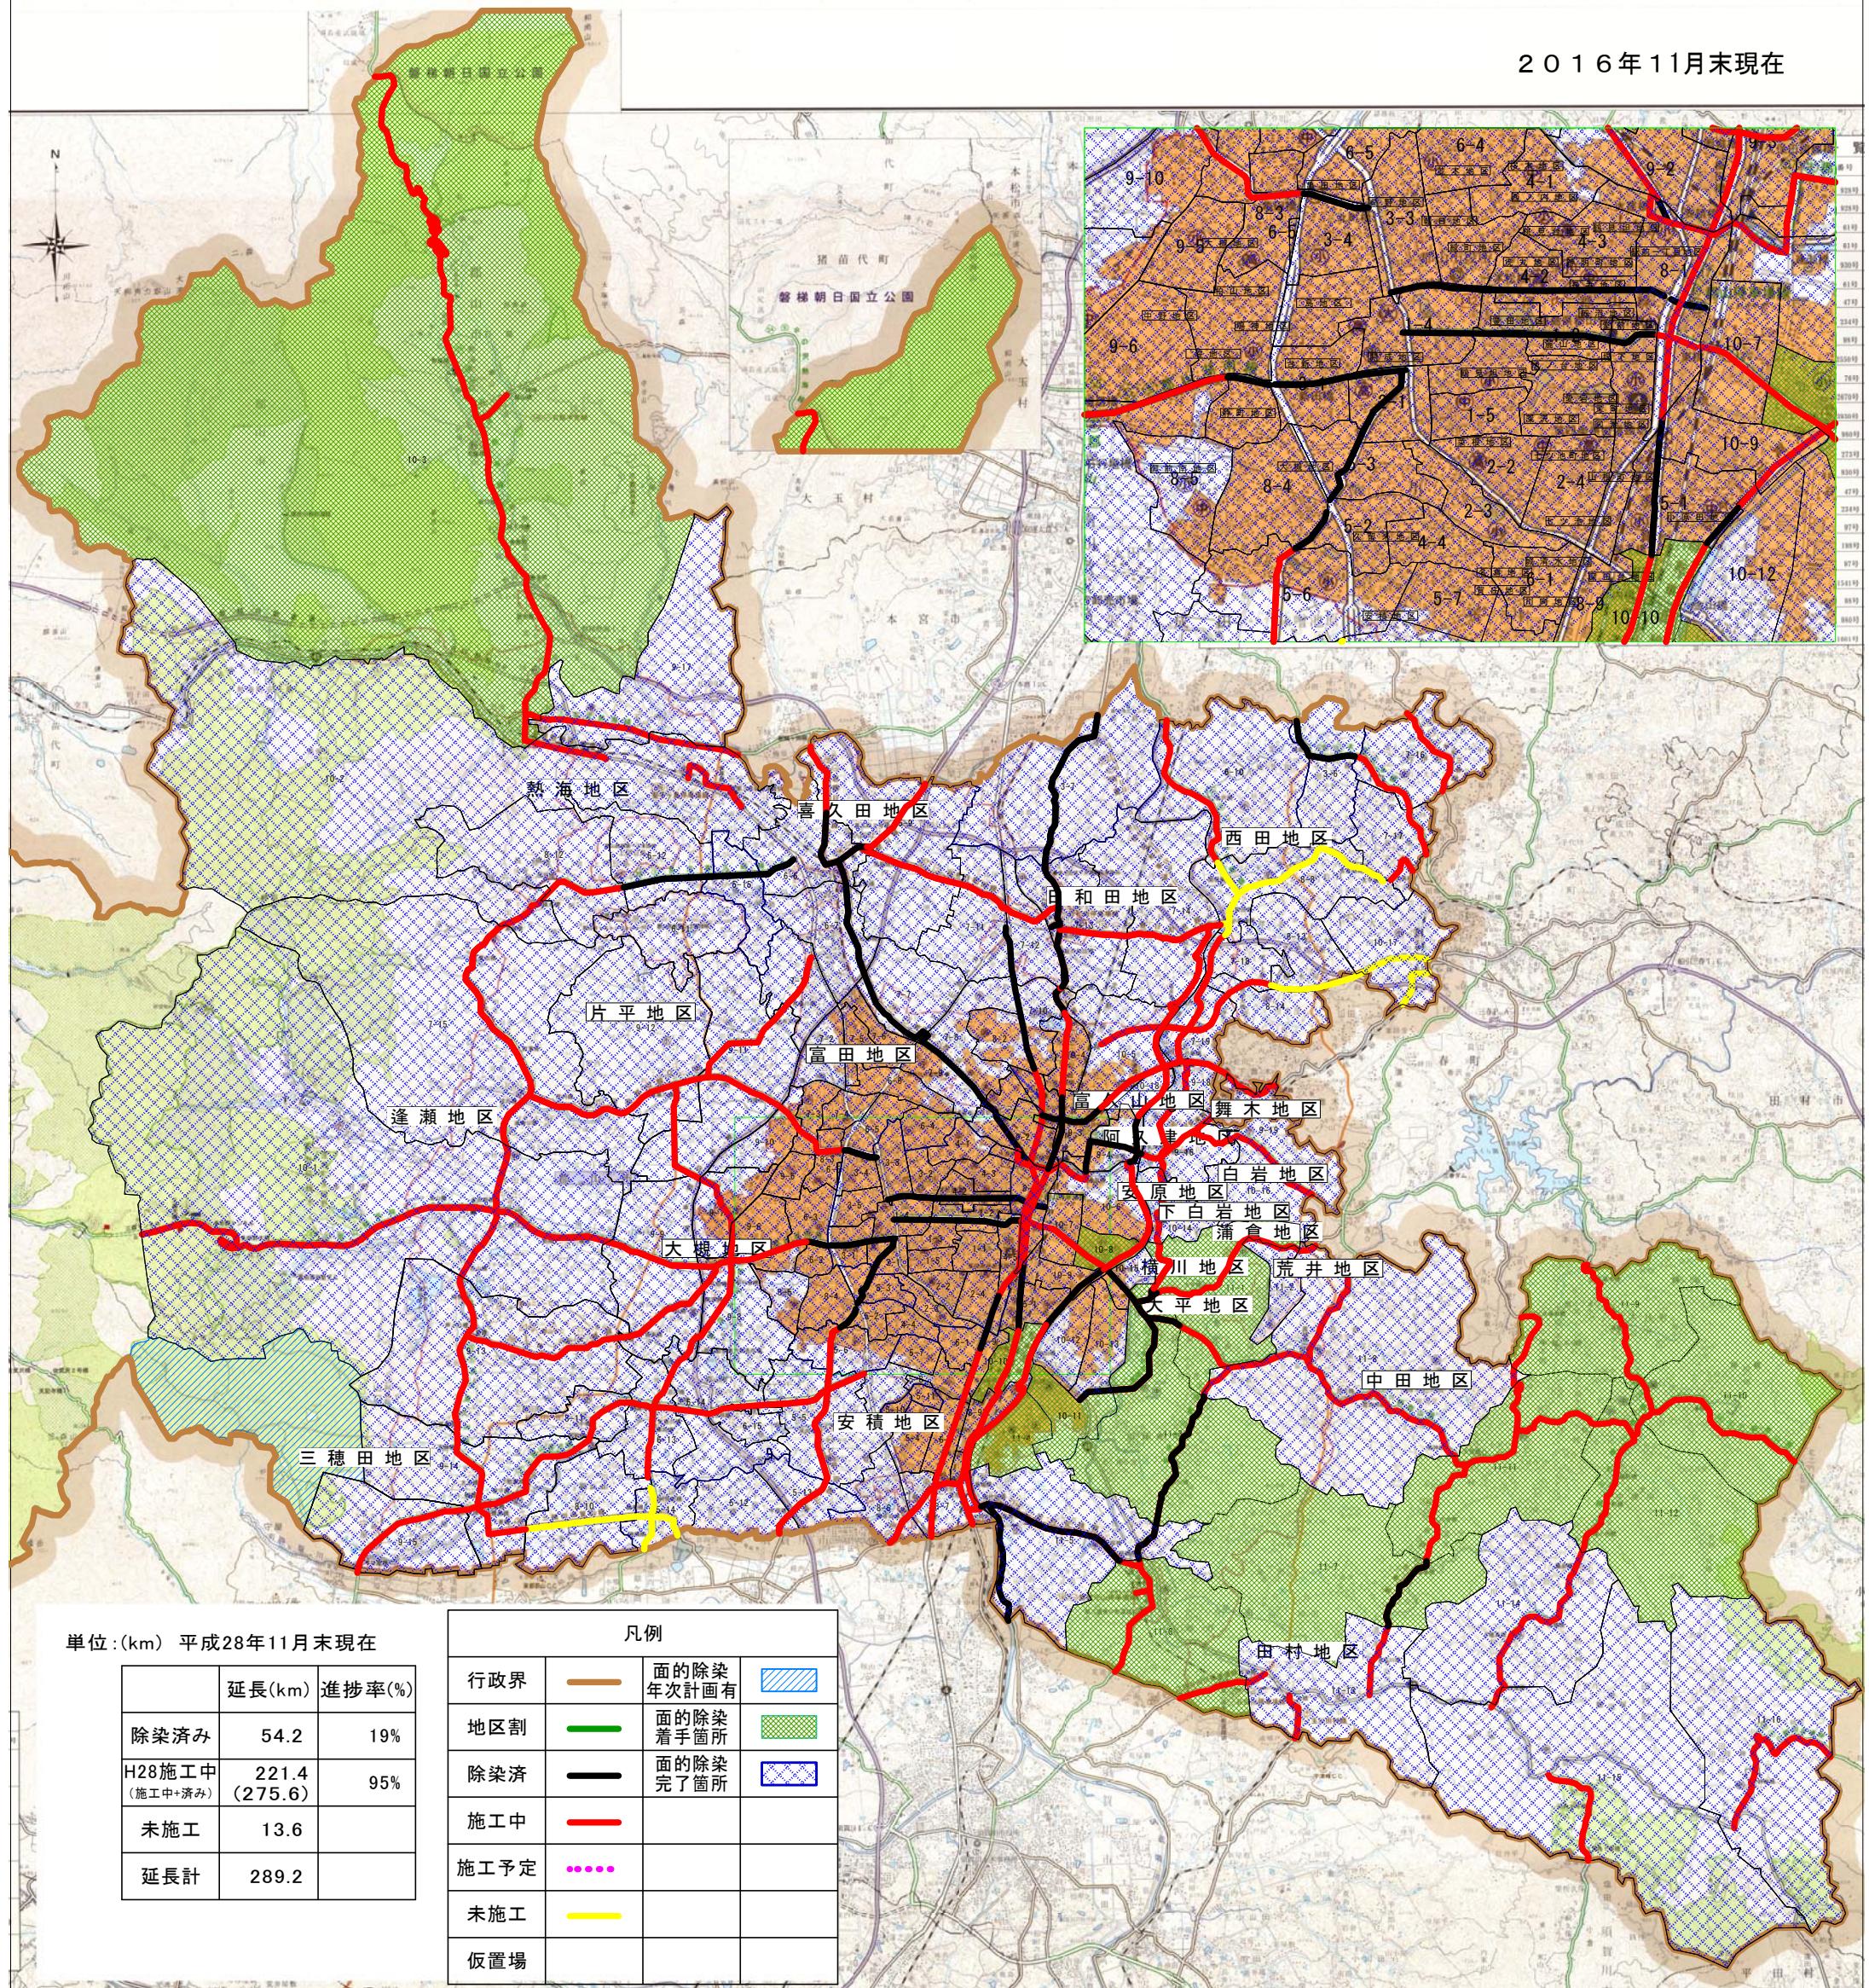


-変更箇所-
 -面的除染: 10-1,10-2,10-17,10-18,11-5完了
 -県道除染: 7-10工区 須賀川二本松線 L = 0.5km
 7-13工区 須賀川二本松線 L = 2.0km
 7-13工区 日和田停車場線 L = 0.2km
 9-1工区 荒井郡山線 L = 0.4km
 9-1工区 国道288号 L = 0.4km
 9-2工区 荒井郡山線 L = 0.9km
 9-2工区 須賀川三本松線 L = 0.2km
 9-3工区 須賀川三本松線 L = 1.2km
 9-4工区 国道288号 L = 0.8km
 9-4工区 郡山大越線 L = 1.7km
 9-4工区 須賀川二本松自転車道線 L = 1.8km
 8-1工区 荒井郡山線 L = 0.4km
 計 10.4 km 完了

追加施工中無し

1:50,000 (1mm=50m)


福島県三春土木事務所管内図

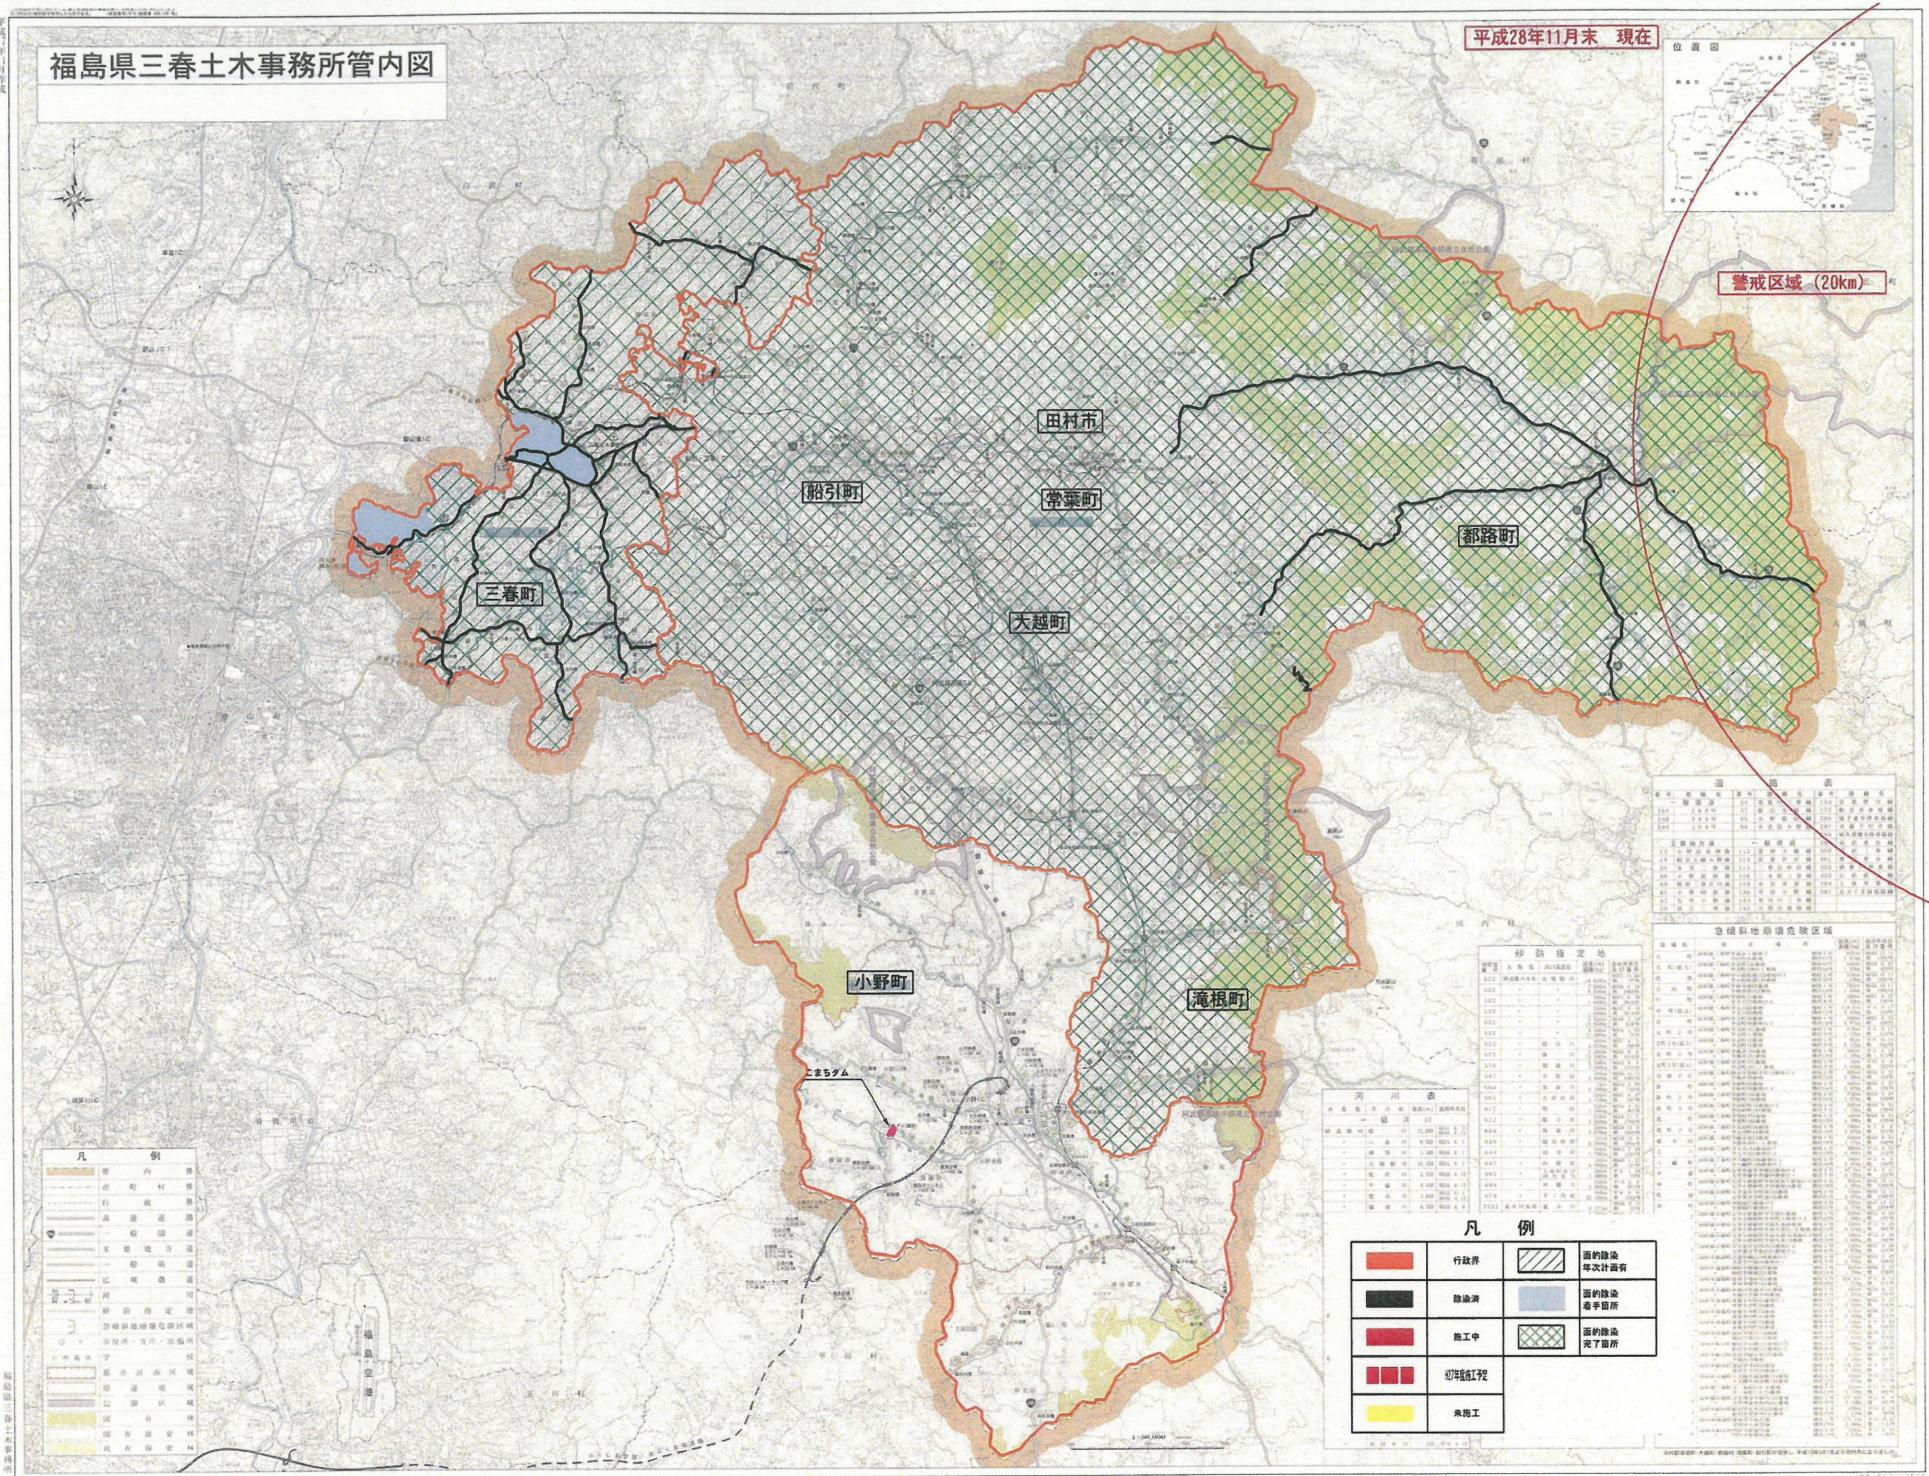

須賀川土木事務所管内 道路除染進捗状況図

平成23年9月作成

(平成28年11月末現在)

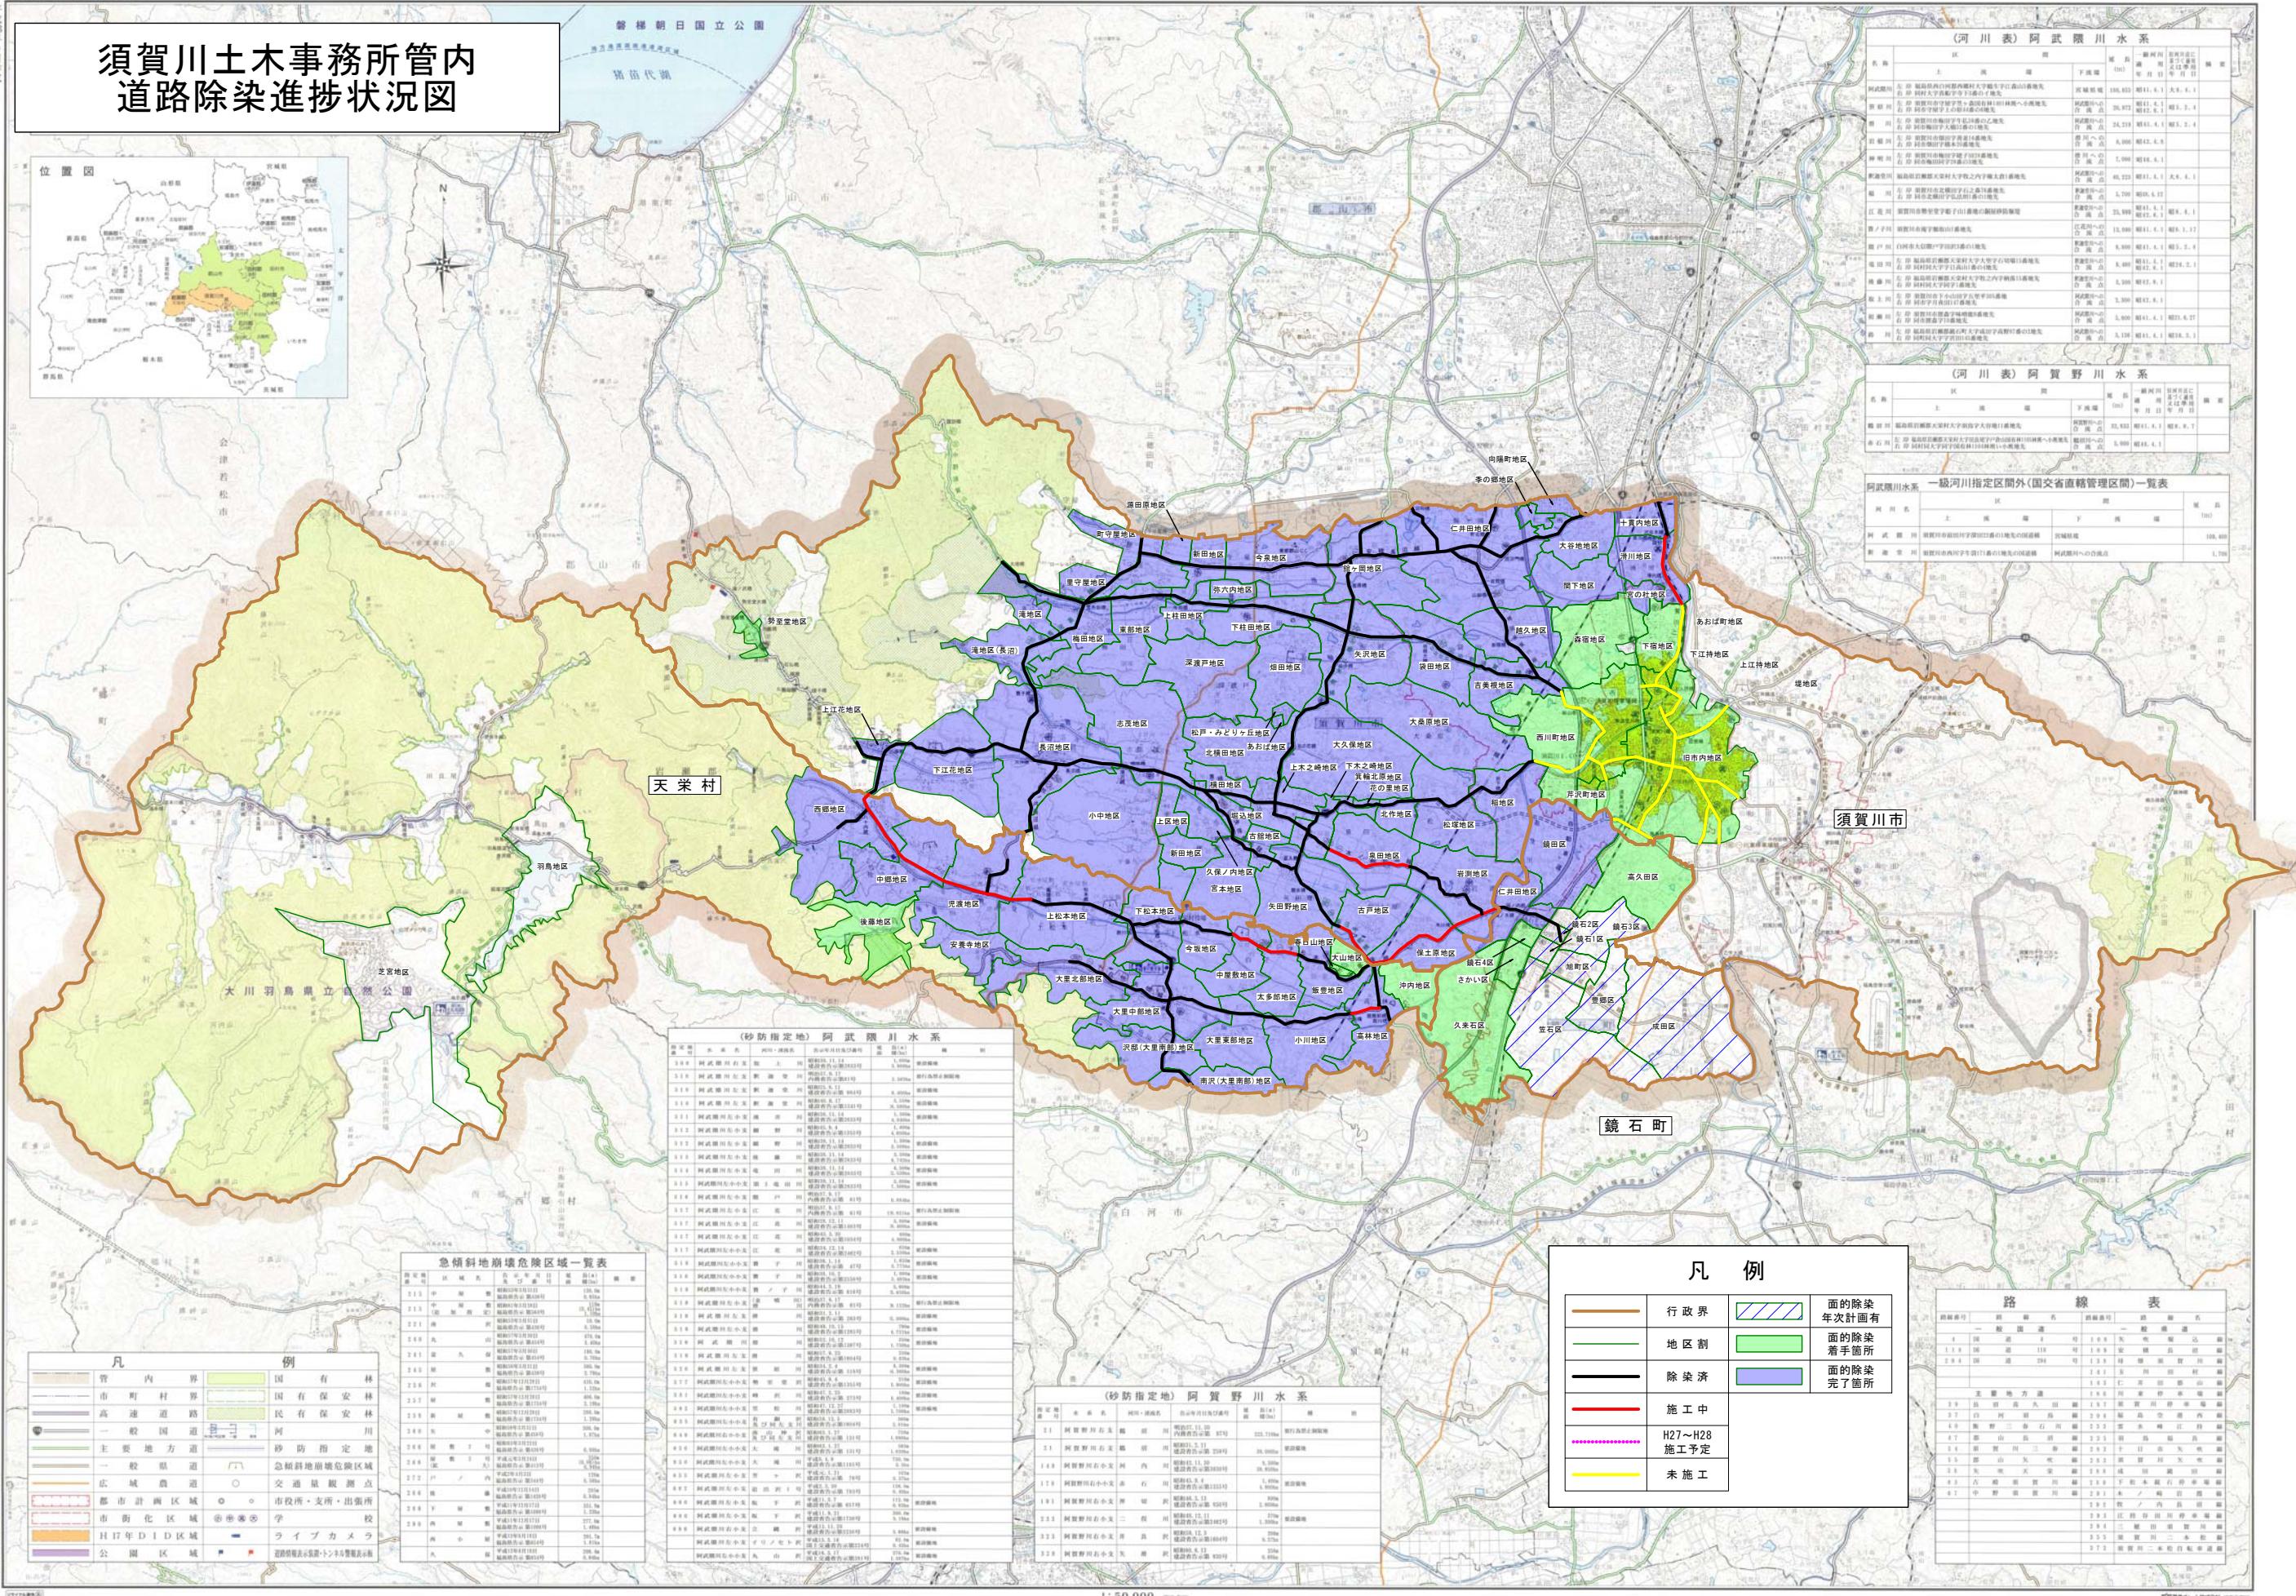


石川土木事務所管内

県管理道路除染進捗図

平成28年11月末現在


凡例

—	行政界
—	地区割
—	除染済
—	施工中
···	H28施工予定
—	未施工
▨	面的除染年次計画有
▨	面的除着手箇所
▨	面的除染完了箇所

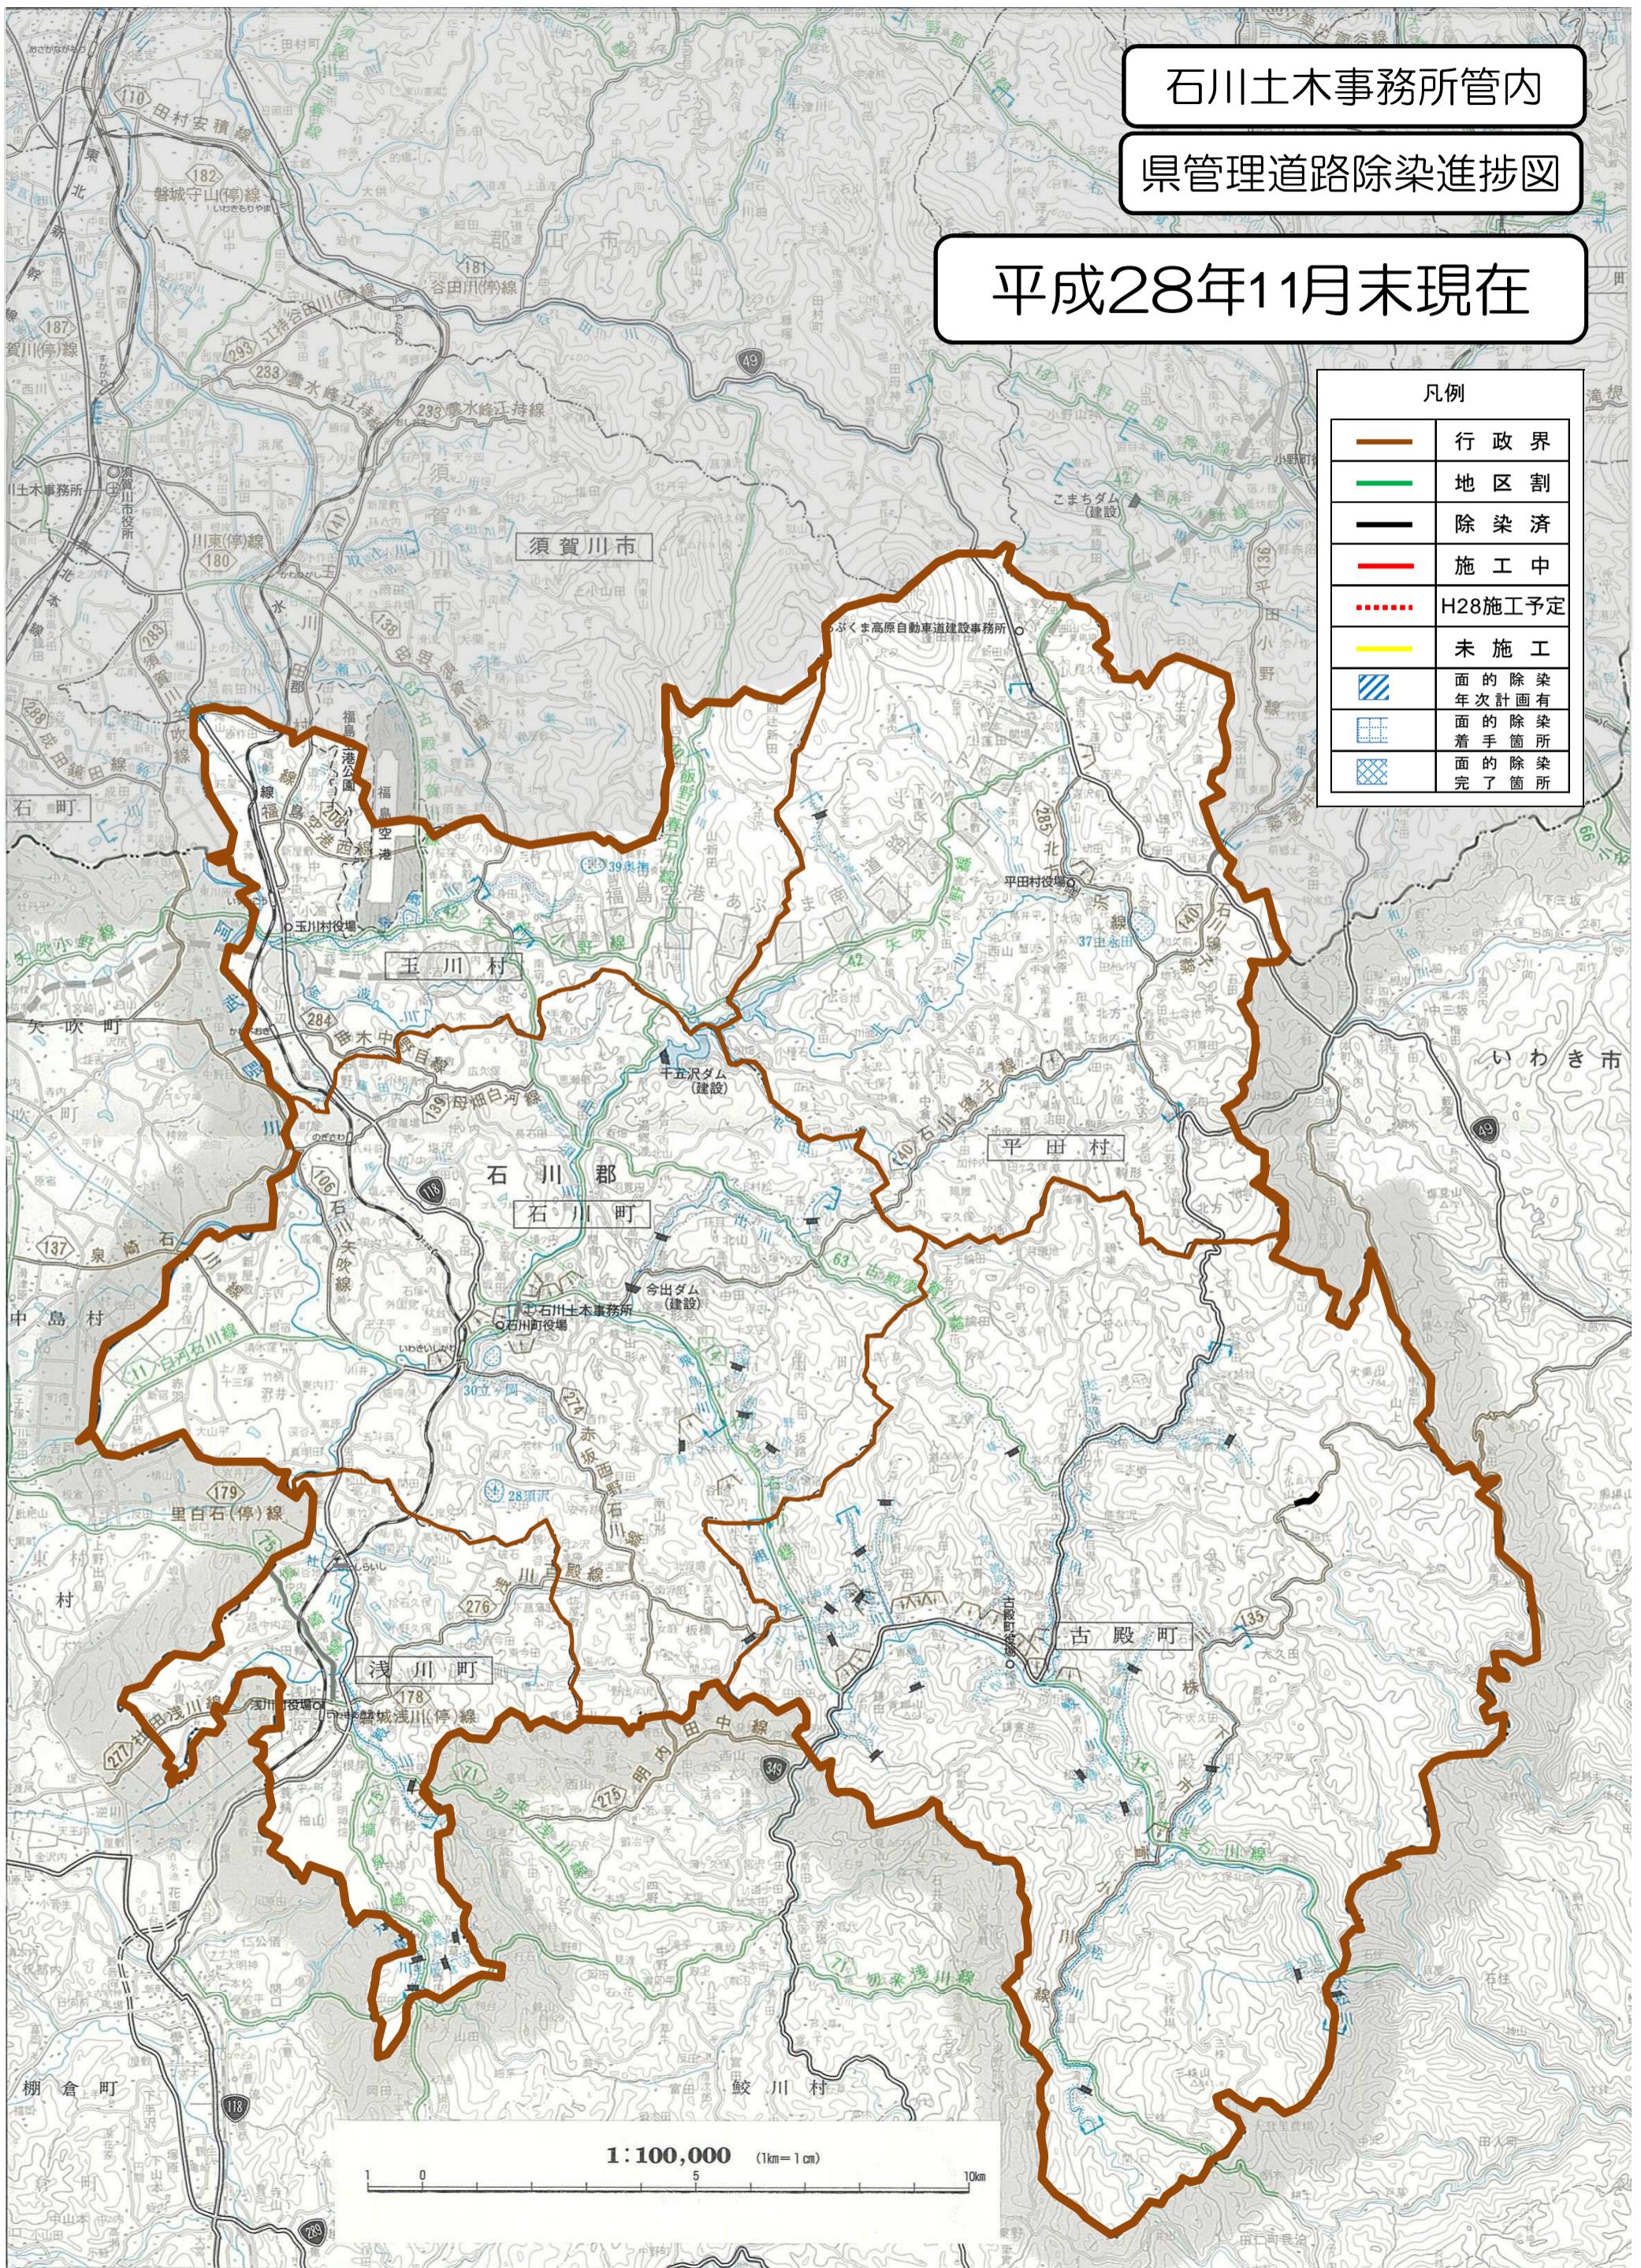


県管理河川公園除染進捗状況図

平成28年11月末現在

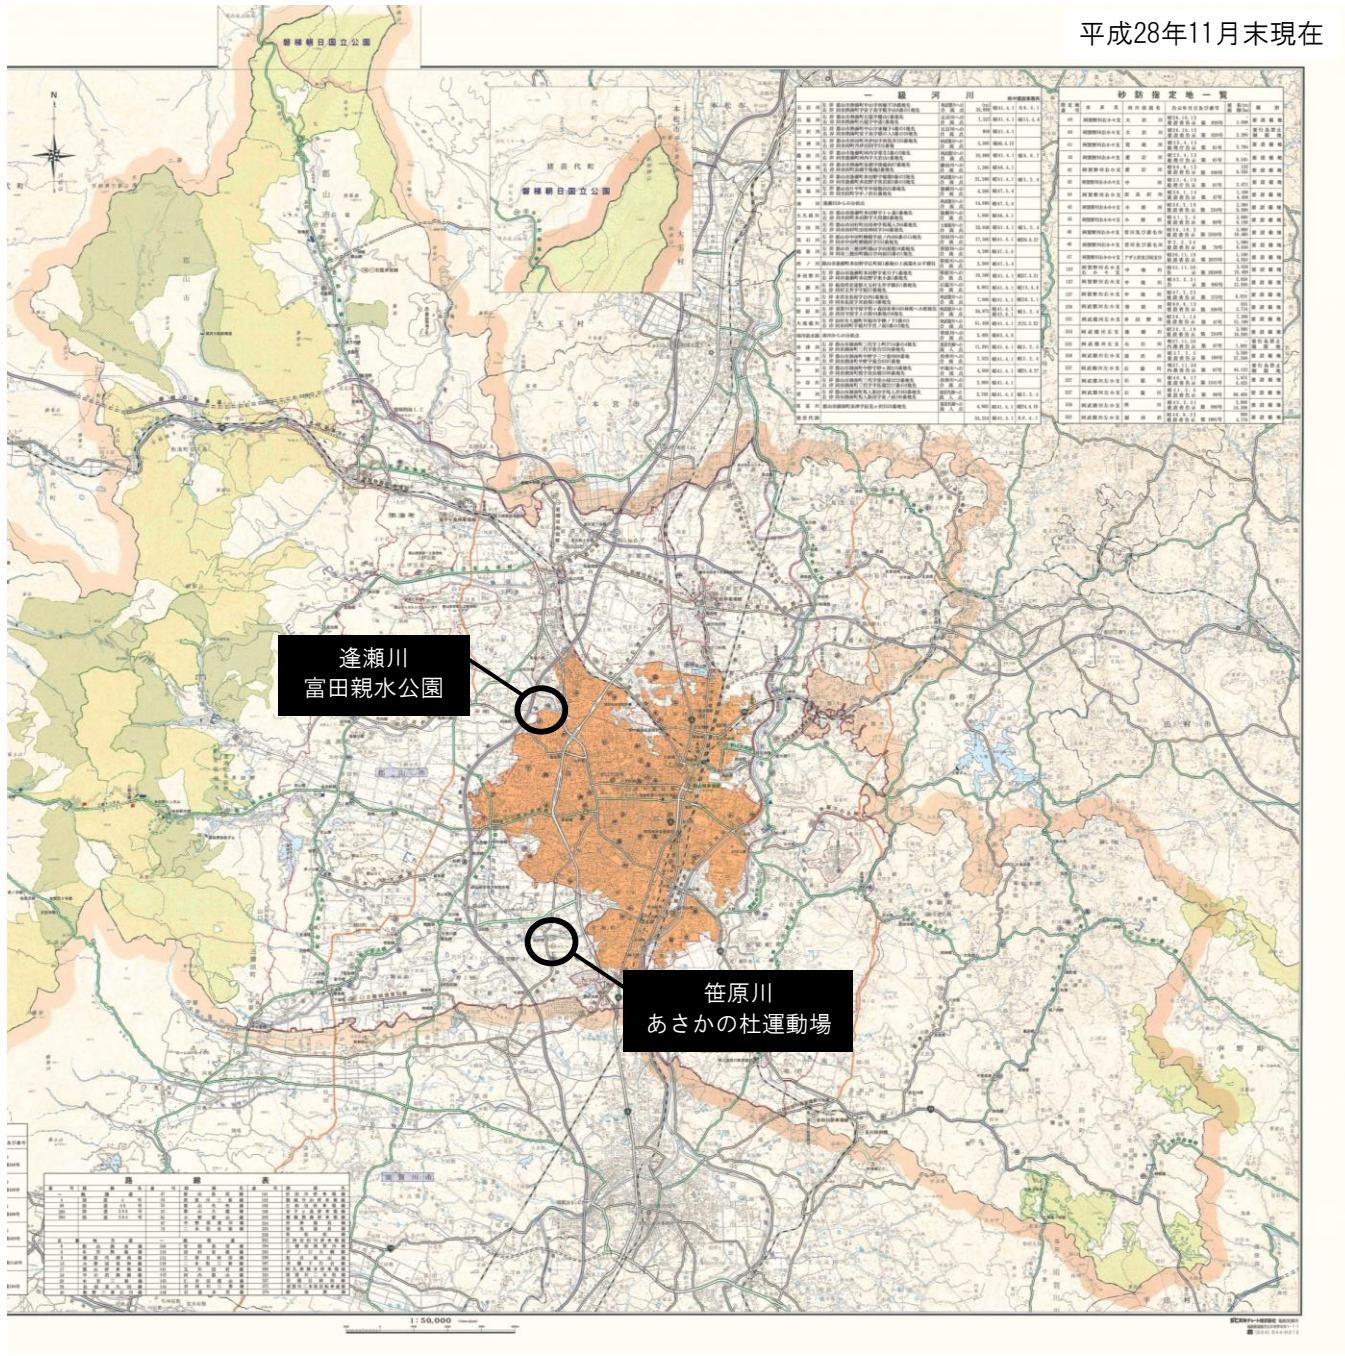

凡例	
○	除染済
○	施工中
○	H28施工予定
○	未実施

県管理公園・下水道施設除染進捗状況図

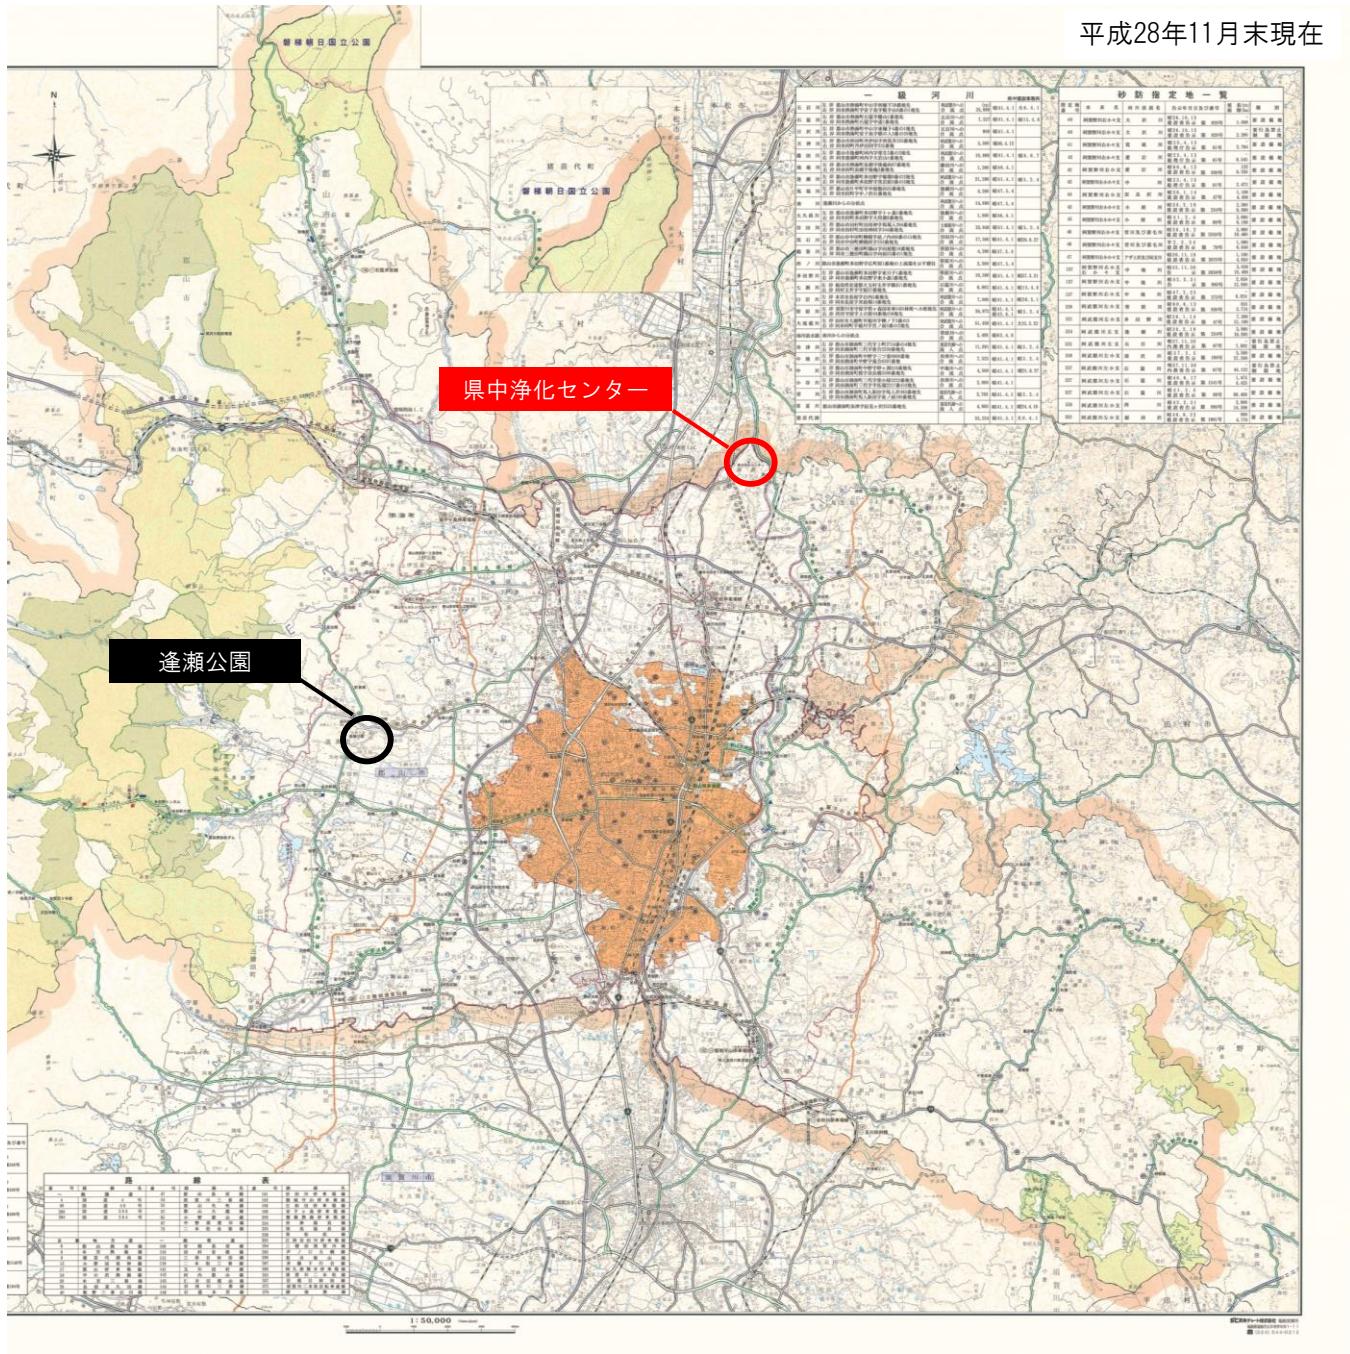


凡 例

○	除染済
○ (Red outline)	施工中
○ (Pink outline)	H28施工予定
○ (Yellow outline)	未実施


県管理公園・下水道施設除染進捗状況図

平成28年11月末現在

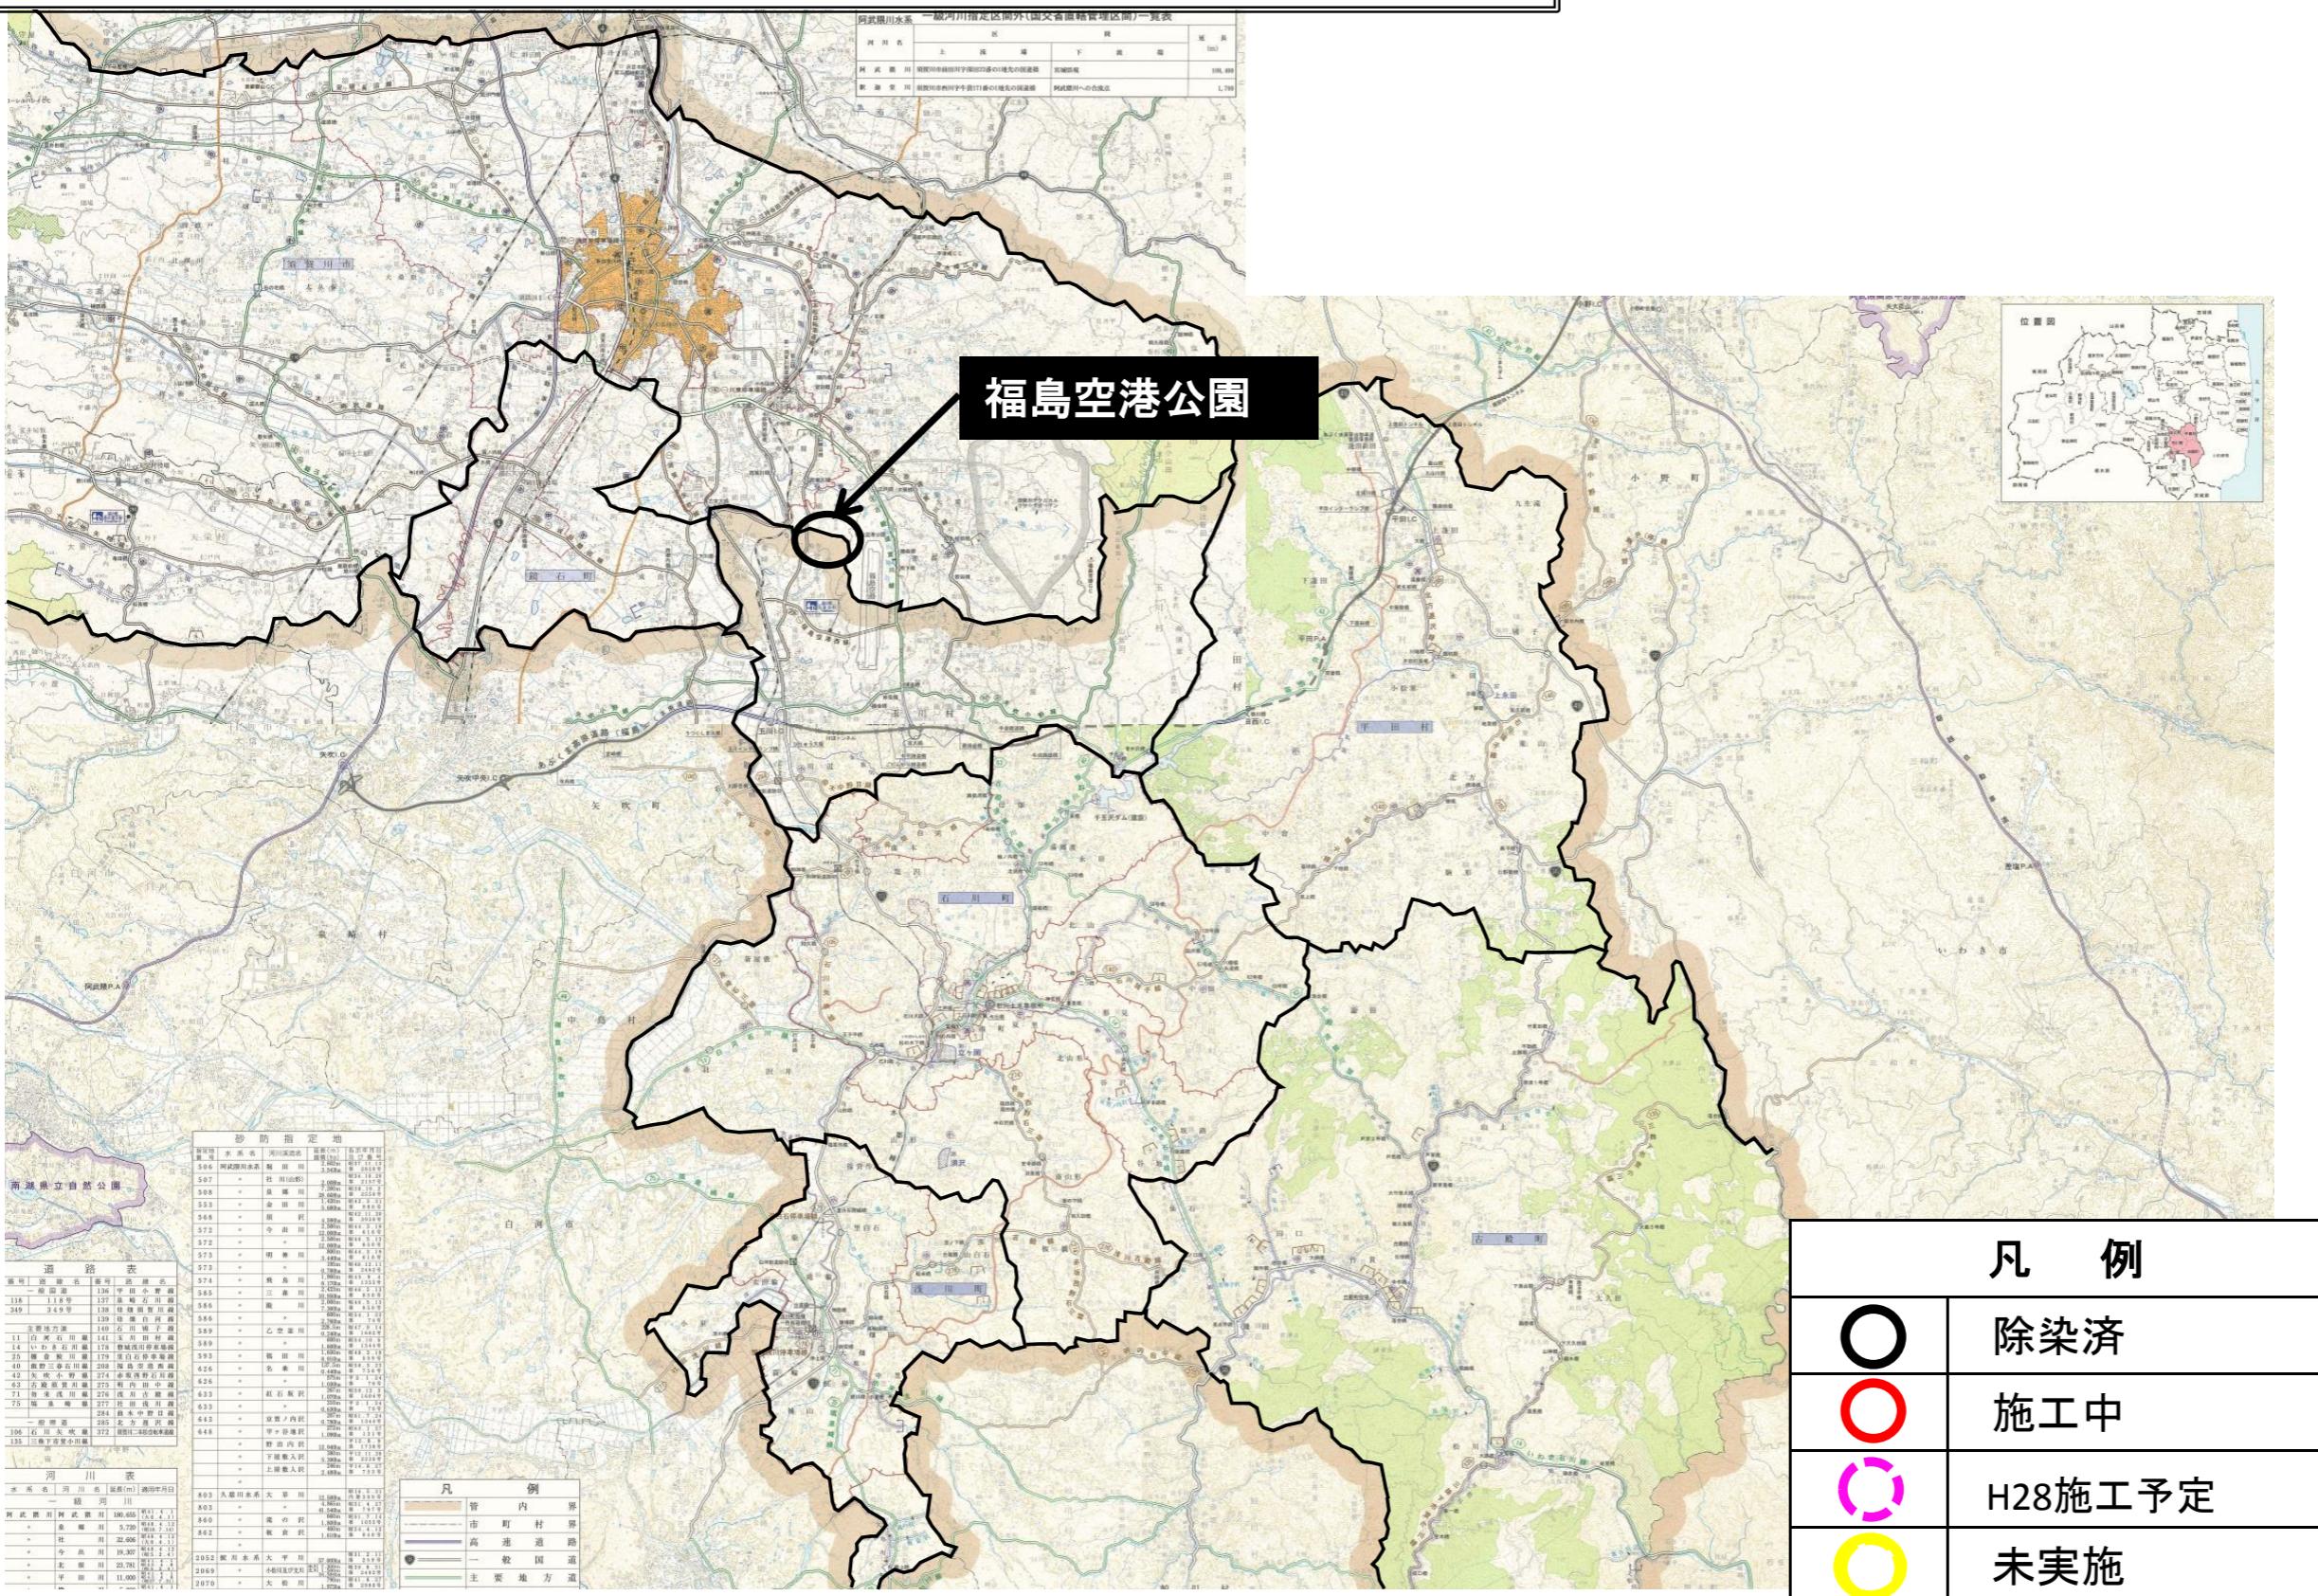

郡山県営住宅除染進捗図

平成28年11月末現在

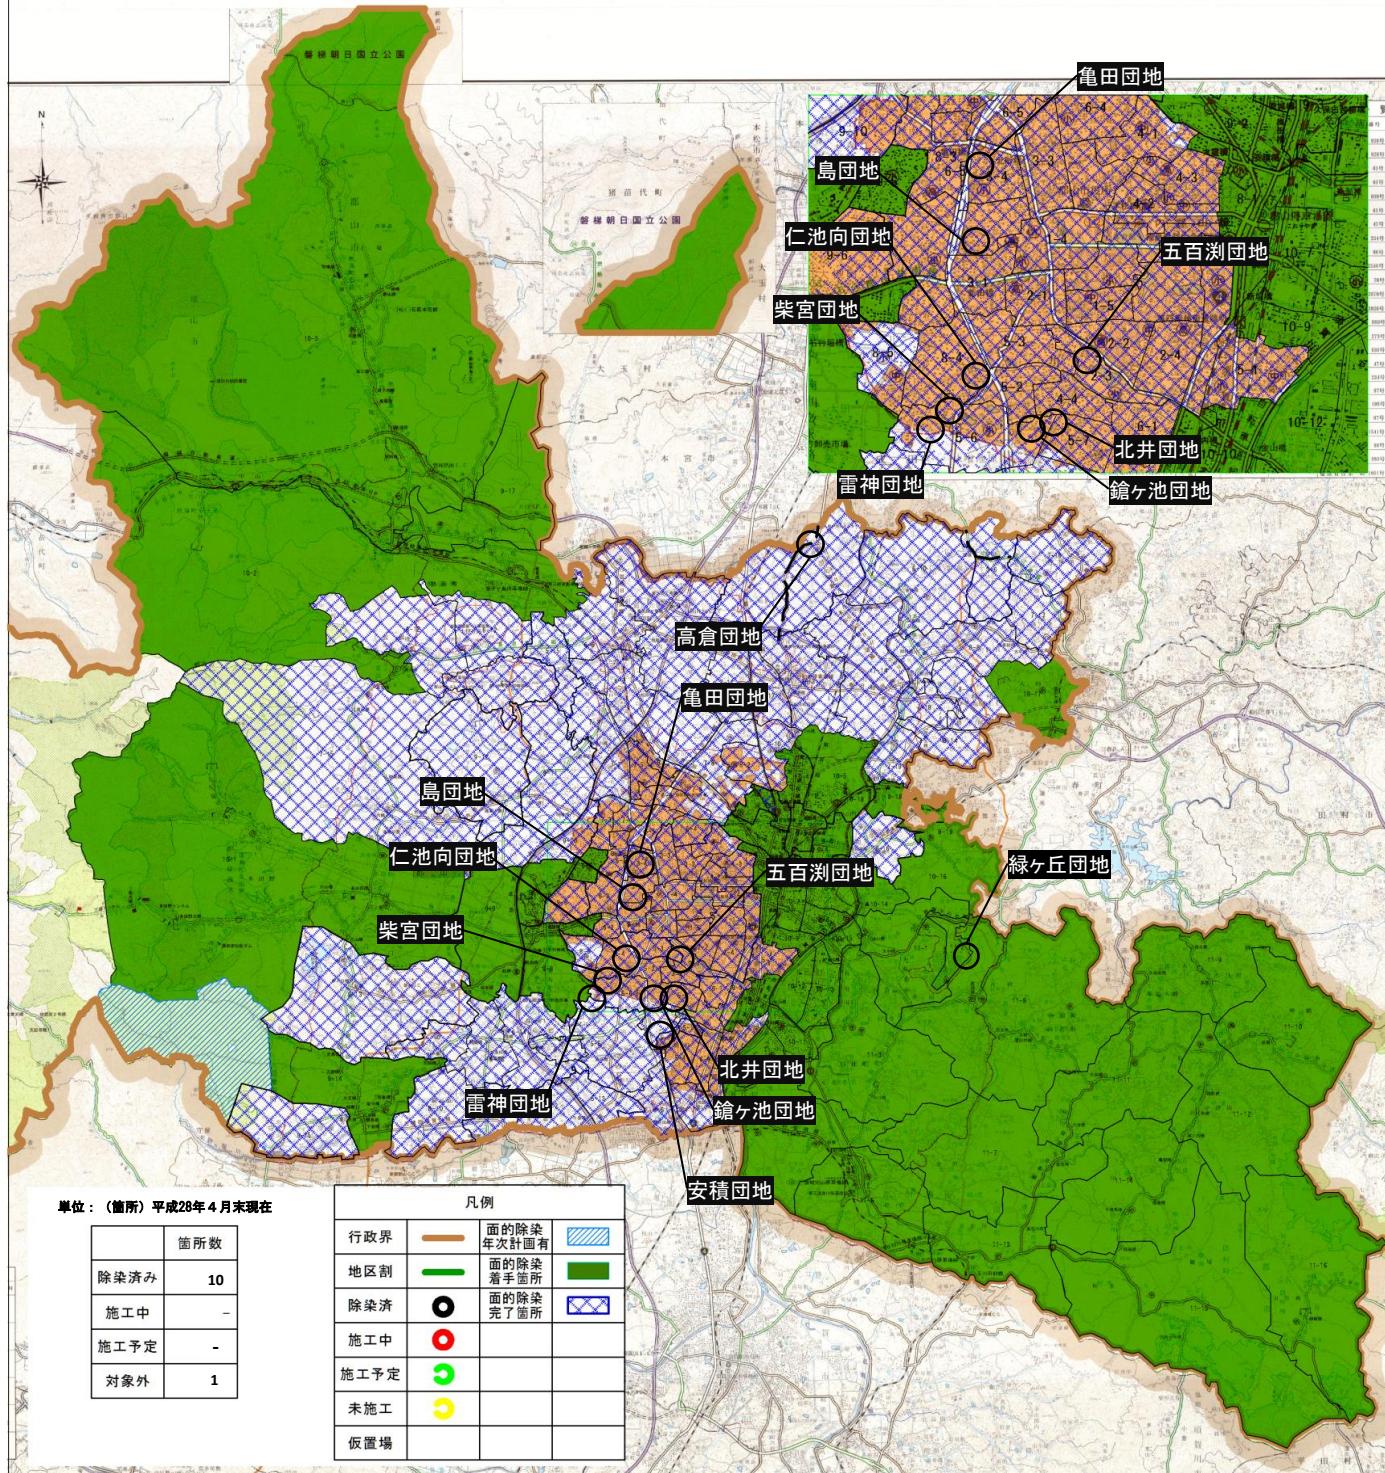

(平成28年4月末現在)

須賀川県営住宅除染進捗図
平成28年11月末現在

