

インフォメーション

土木企画課news

津波被災地における復旧・復興事業の進捗状況を公表！

津波被災地における公共土木施設等の復旧・復興事業について、津波被災地の復興まちづくりや帰還に向けた取組に弾みをつけるため、昨年度（H28.2.8）、事業箇所ごとに完了見通しを公表したところです。前回の公表から1年が経過し、平成28年度の成果を踏まえ、事業の進捗状況等を改めて公表しました。一部の工事では、台風等の影響により遅れが生じた箇所があるものの、予定よりも早く年度内に前倒し完了できた箇所もあり、復旧・復興事業は概ね順調に進捗しています。

詳細はこちら ⇒ <http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/mitoshi.html>

平成28年度の成果

施設名	H28完了箇所	H28完了数
河川	三滝川【新地町】、小泉川【相馬市】、新田川【南相馬市】、北迫川、浅見川【広野町】、末続川、仁井田川、夏井川、弁天川、諏訪川【いわき市】	10河川
海岸	木崎、谷地小屋、大戸浜【新地町】、北海老【相馬市・南相馬市】、南海老、南右田、北泉大磯、村上【建】、蛭沢【南相馬市】、下北迫、浅見川、折木【広野町】、末続、金ヶ沢、久之浜【漁】、草野下神谷、沼之内【建】、薄磯、豊間【建】、江ノ浦、岸浦、中ノ作、下神白、錦町【いわき市】	24海岸
排水機場	古磯部第二【相馬市】	1箇所
港湾・漁港	小浜漁港【いわき市】	1漁港
道路	落合浪江線：2箇所【浪江町】、広野小高線：2箇所【南相馬市】、浪江停車場線【浪江町】、北泉小高線【南相馬市】、長塚請戸浪江線【浪江町】、下渋佐南新田線【南相馬市】	8箇所
津波被災地道路	原町海老相馬線【相馬市】、広野小高線【広野町】、豊間四倉線、泉岩間植田線【いわき市】	4箇所
防災緑地	ひろの防災緑地【広野町】	1箇所
海岸防災林	なし	
治山施設	シウ神山地区防潮工【楢葉町】	1地区
合計		50箇所

※海岸の（ ）は、同名の海岸があるため管理者がわかるように、建設海岸を（建）、漁港海岸を（漁）と記載した。

各事業の完了見通し


対象施設	事業内容	完了年度	事業箇所	事業進捗見通し(箇所・地区・工区数[累計])						
				H27見	H28見	H29見	H30見	H31見	H32見	
①河川	被災した河川の堤防を復旧または新たに築造・かさ上げをする	H31	31	(1)	(13)	(19)	(29)	(31)		
②海岸	被災した海岸の堤防を復旧または新たに築造・かさ上げ及び消波堤や離岸堤等の復旧をする	H31	86	(18)	(44)	(69)	(85)	(86)		
③排水機場	被災した排水機場を復旧する。(海岸堤防に隣接し湛水被害を防止するポンプ場や樋門などの復旧)	H30	37	(27)	(30)	(32)	(37)			
④港湾・漁港	被災した港湾及び漁港の防波堤や岸壁等の施設を復旧する	H30	15	(4)	(6)	(13)	(15)			
⑤道路	被災した道路を原形に復旧する	H30	304	(285)	(298)	(302)	(304)			
⑥津波被災地道路	津波の襲来前に内陸部や高台に速やかに避難するための道路(バイパス・拉幅)を整備する	H32	21	(1)	(6)	(11)	(19)	(20)	(21)	
⑦防災緑地	津波を軽減し、市街地を守るために新たに植樹や盛土を築造する	H31	10		(1)	(3)	(7)	(10)		
⑧海岸防災林	津波や飛砂、強風等から農地を守る防災林を新たに築造する	H32	8			(2)	(2)	(8)		
⑨治山施設	被災した治山施設(防潮工、護岸工、盛土)を復旧する	H30	7	(2)	(3)	(3)	(7)			
全体					(338)	(401)	(452)	(503)	(512)	(519)
					841	891	942	993	1000	1000
					(65%)	(77%)	(87%)	(97%)	(99%)	(100%)
					96%	75%	85%	96%	99%	100%

平成29年度までに約9割、平成30年度までにほぼ完了の見通し。

※津波による被災を受けた、浜通り沿岸部の9市町村(新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、双葉町、富岡町、楢葉町、広野町、いわき市)内の事業。
※()はH28.2.8に公表した数字

平成28年度完了箇所の事例

【浅見川地区海岸、ひろの防災緑地、広野小高線、浅見川（広野町）】
津波に備えた多重防御（海岸堤防、防災緑地、道路）を県内で初めて整備、完了しました。

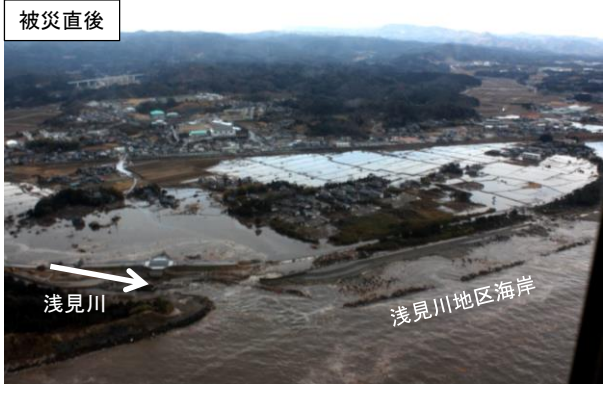

この記事の問い合わせ先：土木企画課 024-521-7869



復興・復興に向けた取り組みを紹介します

福島県 公共土木施設復旧・復興情報
～ふるさとの再生と帰還にむけて～ 福島県土木部

Web版はコチラ⇒ <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/dobokufukkou-top.html>

いしざききた いしざきみなみ もりやま
復興公営住宅石崎北・石崎南団地完成！守山団地一部完成！

田村市船引町地内の復興公営住宅石崎北団地6戸及び石崎南団地12戸が完成。また、郡山市田村町地内の守山団地の一部72戸が完成しました。石崎北団地及び石崎南団地は平成28年12月20日（火）に、守山団地は平成28年12月21日（水）に説明会を行い、入居者に鍵を引き渡しました。



この記事の問い合わせ先：県中建設事務所 建築住宅課 024-935-1415

みなみまち かみまち
復興公営住宅南町団地、上町団地完成！

南相馬市原町区南町地内の復興公営住宅南町団地255戸及び南相馬市原町区上町地内の復興公営住宅上町団地182戸が完成しました。南町団地は平成28年11月29日（火）に、上町団地は平成28年12月13日（火）に鍵引渡し式を行いました。



この記事の問い合わせ先：相双建設事務所 建築住宅課 0244-26-1204

たかはぎ
復興公営住宅高萩団地完成！

いわき市小川町地内の復興公営住宅高萩団地80戸が完成し、平成29年1月23日（月）に鍵引渡し式を行いました。平成29年2月1日（水）から入居を開始しています。



この記事の問い合わせ先：いわき建設事務所 建築住宅課 0246-24-6131


Report

■【県土木部全体】平成23年被災・災害復旧事業の進捗状況（平成29年1月31日現在）

- ・東日本大震災 着手 **98%** 完了 **85%**
- ・新潟・福島豪雨 着手 **100%** 完了**100%**
- ・台風15号 着手 **100%** 完了**100%**

※率の算定は事業実施箇所数に対し、事業着手した箇所数の割合を着手率、事業完了した箇所数の割合を完了率、として算出しています。

※帰還困難区域の査定が未実施の箇所は含まれていません。今後の査定実施により対象が増加する場合があります。

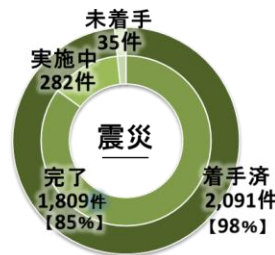

■もう一言

土木部職員の業務やその成果を広く共有するため、「ふくしまの未来を拓く業務発表会」を開催しました。発表会では、震災からの復旧・復興業務などをテーマとした20件の発表を行いました。詳しくは、下記アドレスから御覧ください。

→ <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025b/gyumu.html>

問い合わせ先：技術管理課 024-521-7460

福島県土木部 土木企画課 防災担当

TEL:024-521-7890 FAX:024-521-7950

Mail:doboku_bousai@pref.fukushima.lg.jp
