
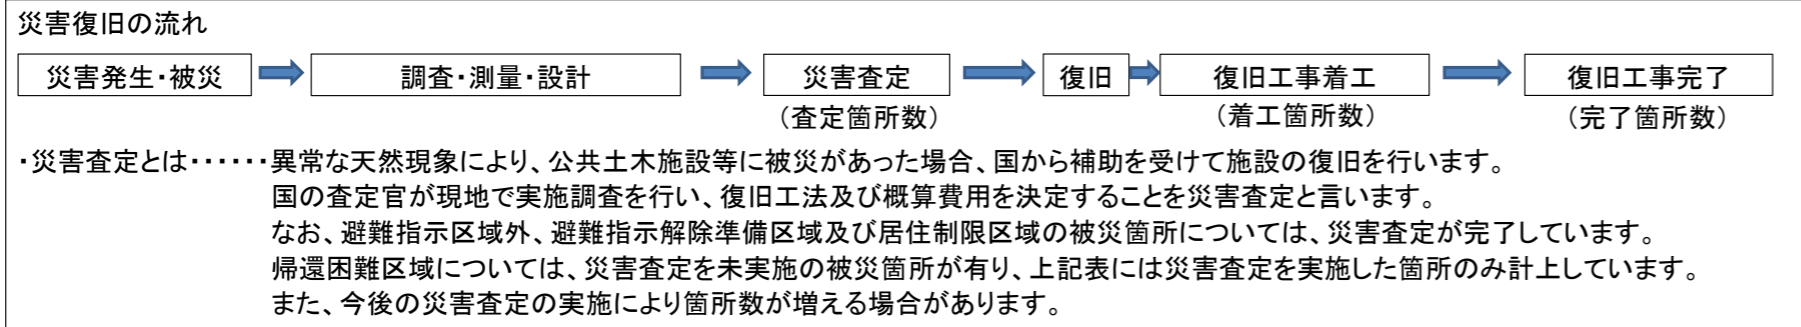







東日本大震災の災害復旧の進捗状況 今後の見通しについて

平成29年12月31日時点

県全体(避難指示区域外+避難指示区域内)		対査定箇所				
県全体(避難指示区域外+避難指示区域内)		A	B	C	B/A	C/A
		査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率
県全体 合計		2,136	2,108	1,956	98.7%	91.6%
河川・砂防		280	271	249	96.8%	88.9%
海岸		157	156	121	99.4%	77.1%
道路・橋梁		802	795	782	99.1%	97.5%
港湾		331	331	321	100.0%	97.0%
漁港		469	458	386	97.7%	82.3%
下水		3	3	3	100.0%	100.0%
公園		5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅		89	89	89	100.0%	100.0%
避難指示区域外		査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率
避難指示区域外 合計		1,784	1,782	1,715	99.9%	96.1%
河川・砂防		215	215	211	100.0%	98.1%
海岸		131	131	114	100.0%	87.0%
道路・橋梁		609	609	609	100.0%	100.0%
港湾		331	331	321	100.0%	97.0%
漁港		401	399	363	99.5%	90.5%
下水		3	3	3	100.0%	100.0%
公園		5	5	5	100.0%	100.0%
公営住宅		89	89	89	100.0%	100.0%
避難指示区域内		査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率
避難指示区域内 合計		352	326	241	92.6%	68.5%
河川・砂防		65	56	38	86.2%	58.5%
海岸		26	25	7	96.2%	26.9%
道路・橋梁		193	186	173	96.4%	89.6%
漁港		68	59	23	86.8%	33.8%
避難指示解除準備区域		査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率
避難指示解除準備区域 合計		272	260	179	95.6%	65.8%
河川・砂防		54	54	36	100.0%	66.7%
海岸		25	25	7	100.0%	28.0%
道路・橋梁		125	122	113	97.6%	90.4%
漁港		68	59	23	86.8%	33.8%
居住制限区域		査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率
居住制限区域 合計		22	22	22	100.0%	100.0%
河川・砂防		2	2	2	100.0%	100.0%
道路・橋梁		20	20	20	100.0%	100.0%
帰還困難区域		査定箇所	着工箇所	完了箇所	着工率	完了率
帰還困難区域 合計		58	44	40	75.9%	69.0%
河川・砂防		9	0	0	0.0%	0.0%
海岸		1	0	0	0.0%	0.0%
道路・橋梁		48	44	40	91.7%	83.3%

平成29年度末見込み		平成30年度末見込み		平成31年度末見込み	
F	F/A	G	G/F	H	H/A
完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
2,033	95.2%	2,122	99.3%	2,136	100.0%
255	91.1%	270	96.4%	280	100.0%
127	80.9%	153	97.5%	157	100.0%
793	98.9%	802	100.0%	802	100.0%
331	100.0%	331	100.0%	331	100.0%
430	91.7%	469	100.0%	469	100.0%
3	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
5	100.0%	5	100.0%	5	100.0%
89	100.0%	89	100.0%	89	100.0%
完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
1,762	98.8%	1,784	100.0%	1,784	100.0%
211	98.1%	215	100.0%	215	100.0%
115	87.8%	131	100.0%	131	100.0%
609	100.0%	609	100.0%	609	100.0%
331	100.0%	331	100.0%	331	100.0%
399	99.5%	401	100.0%	401	100.0%
3	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
5	100.0%	5	100.0%	5	100.0%
89	100.0%	89	100.0%	89	100.0%
完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
271	77.0%	338	96.0%	352	100.0%
44	67.7%	55	84.6%	65	100.0%
12	46.2%	22	84.6%	26	100.0%
184	95.3%	193	100.0%	193	100.0%
31	45.6%	68	100.0%	68	100.0%
完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
205	75.4%	268	98.5%	272	100.0%
42	77.8%	53	98.1%	54	100.0%
12	48.0%	22	88.0%	25	100.0%
120	96.0%	125	100.0%	125	100.0%
31	45.6%	68	100.0%	68	100.0%
完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
22	100.0%	22	100.0%	22	100.0%
2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
20	100.0%	20	100.0%	20	100.0%
完了箇所	完了率	完了箇所	完了率	完了箇所	完了率
44	75.9%	48	82.8%	58	100.0%
0	0.0%	0	0.0%	9	100.0%
0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
44	91.7%	48	100.0%	48	100.0%

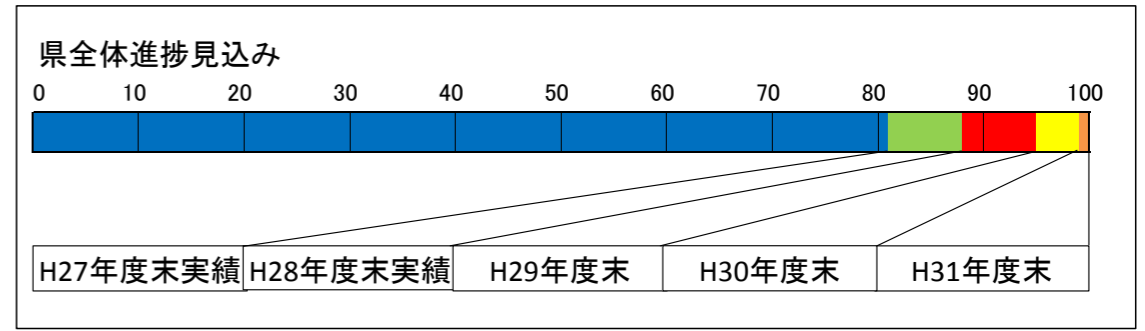

※第44次査定(平成29年2月実施)及び第47次査定(平成29年12月実施)箇所については、完了時期未定。(完了目標年次については、既公表年次としている。)

※着工率、完了率は査定箇所に対する割合

※災害査定実施箇所のみ記載

※避難指示区域内の箇所数は、すべての市町村で区域再編の終了した平成25年8月8日時点の区域で計数を整理しているため、田村市、南相馬市、川内村、葛尾村、楢葉町、浪江町、川俣町、飯館村、富岡町の避難指示が解除になっている区域の箇所も含む。
