

# 除染完了報告書

～県土木部が経験した除染の記録～

平成 30 年 3 月

福島県土木部技術管理課

## 巻頭言

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、県内に放射性物質が放出され県土が汚染されました。これによる人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とし、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染への対処に関する特別措置法（平成23年8月30日公布）」が施行されました。福島県土木部はその規定により、平成24年度から県有施設の除染を実施してきましたが、平成30年1月に除染実施区域における除染作業は完了しました。

福島第一原子力発電所事故は、放射性物質の放出を伴う国内では最も深刻な原子力事故であり、除染は前例のない措置です。本報告書は、その除染業務により得られた経験をまとめ、福島第一原子力発電所事故の資料として、また県土再生の記録として後世に残したいと思い、まとめたものです。

# 目次

1	除染の概要	3
1-1	経緯	3
1-1-1	放射性物質汚染対処特別措置法	3
1-1-2	除染実施区域と実施主体	3
1-1-3	県土木部の除染対象	4
1-2	予算	5
1-2-1	財源	5
1-3	除染の方法	6
1-3-1	除染業務のフロー	6
1-3-2	道路除染	9
1-3-3	河川除染	13
1-3-4	公園除染	13
1-3-5	県営団地除染	15
1-3-6	運搬・保管	17
1-3-7	安全対策等	19
1-4	これまでの主な出来事	21
1-4-1	発注者支援業務の活用	21
1-4-2	仮置場の不足	22
1-4-3	会計実地検査の受検	22
2	除染の実施状況	24
2-1	投資額と実施延長・箇所数	24
2-2	市町村別除染実施状況	24
2-3	除染作業前後の状況	26
3	平成30年度以降の対応	31
3-1	除染土壌等の中間貯蔵施設への搬出の考え方	31
3-2	県管理施設の現場保管土と搬出計画	31
資料1	市町村別除染実施箇所	33
資料2	除染業務契約一覧	77

## 1 除染の概要

### 1-1 経緯

#### 1-1-1 放射性物質汚染対処特別措置法

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波による浸水のため、福島第一原子力発電所は全ての電源を失い、冷却機能が停止しました。その結果、水素爆発が引き起こされ、これによって放出された放射性物質は県内に広く降り注ぎました。

この事故由来の放射性物質によって汚染された土壌等を処理するため、平成 23 年 8 月 30 日に「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染への対処に関する特別措置法（以下、「放射性物質汚染対処特別措置法」という。）」が公布され、平成 24 年 1 月 1 日に全面施行されました。

この法律は、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質（以下「事故由来放射性物質」という。）による環境の汚染が生じていることに鑑み、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めること等により、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とし（放射性物質汚染対処特別措置法第 1 条）であり、この法律に則って、県内では土壌等の除染等の措置が進められてきました。

#### 1-1-2 除染実施区域と実施主体

放射性物質汚染対処特別措置法には、「除染特別地域」と「汚染状況重点調査地域」が指定されています。

「除染特別地域」は、警戒区域又は計画的避難区域の指定を受けたことがある地域が指定され、国による除染等の措置が実施されました。一方、「汚染状況重点調査地域」は、年間追加被ばく線量が 1mSv※以上の市町村が指定され、指定された市町村では、年間追加被ばく線量が 1mSv 以上となる区域について除染実施計画を定め、除染を実施する区域を決定することとなりました。

福島県内では 59 市町村の内、「汚染状況重点調査地域」として指定され、除染実施計画を策定した 36 市町村において除染が実施されました（図 1 参照）。県土木部は、それらの市町村のうち 31 市町村（表 15 参照）において、県土木部管理施設（道路・河川・砂防・公園・下水道・県営団地等）の除染を実施することとなりました（表 1 参照）。

※ Sv（シーベルト）：人体が放射線を受けた場合の影響の程度を示す単位。

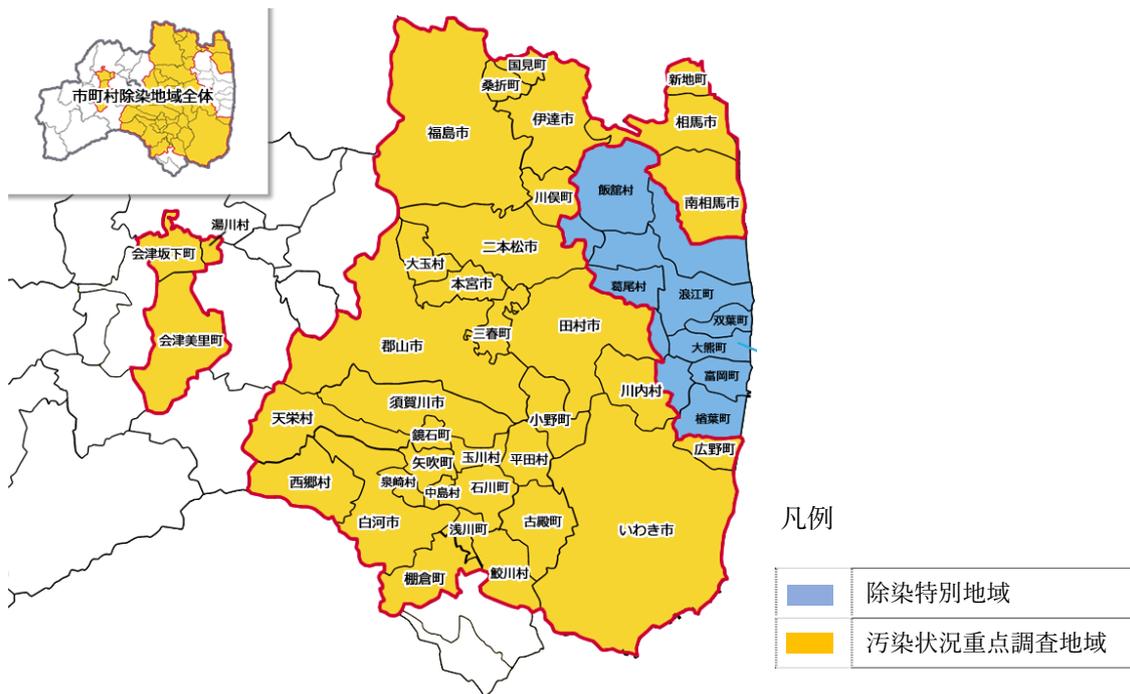


図 1 除染実施区域

表 1 除染の役割分担

年間追加被ばく線量		計画策定	実施主体	財政措置
1mSv 以上	旧警戒区域・旧計画的避難区域 (除染特別地域)	国	国	国費
	上記以外 (汚染状況重点調査地域)	市町村	市町村 県：県有施設 国：国有施設	
1 mSv 未満		除染を実施しない地域		

### 1-1-3 県土木部の除染対象

県土木部は、「汚染状況重点調査地域」に指定され除染実施計画を策定した市町村のうち、年間追加被ばく線量が1mSv (0.23 $\mu$ Sv/h※) 以上となる地域・範囲(除染実施区域)を対象に、管理施設である道路・河川・砂防・公園・下水道・県営団地等の除染を表2のとおり実施してきました。

※ 年間追加被ばく線量 1mSv は、1時間当たりの空間線量(以下、「空間線量率」と

いう。)に安全側に換算すると、 $0.23\mu\text{Sv/h}$ にあたとされています。

換算の考え方は、次のとおりです。

- ・ 追加被ばく線量年間  $1\text{mSv}$  を 1 時間あたりに換算すると、 $0.19\mu\text{Sv/h}$  と考えられます。(1 日のうち屋外に 8 時間、屋内 (遮へい効果 (0.4 倍) のある木造家屋に 16 時間滞在するという生活パターンを仮定)
- ・ 空間線量率を測定する場合、自然放射線 (日本平均は、 $0.04\mu\text{Sv/h}$ ) も併せて測定されるため、これを加え、 $0.19+0.04=0.23\mu\text{Sv/h}$  となります。

(環境省『放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 (平成 28 年度版)』より)

表 2 除染実施箇所

道路	1,635	km
河川・砂防	27	箇所
公園・下水道	9	箇所
県営団地	48	団地
他	3	箇所

福島第一原子力発電所事故当初、人の健康保護の観点から、まずは生活圏である住宅周辺や農地、生活圏近隣の森林等において除染が進められました。一方、河川については、水の遮へい効果があること、陸域からの土砂の流入や流域内での土砂の移動などがあることから、除染対象とはされておりませんでした。しかし、モニタリングや調査・研究を踏まえ、平成 26 年 12 月に環境省が除染関係ガイドラインの追補版 (河川・湖沼等関係) を策定し、これにより、水の遮へい効果が期待できずに空間線量が高く、かつ、一般公衆の活動が多い生活圏に該当すると考えられる箇所については、必要に応じ、除染を実施できるようになりました。土木部では管理河川のうち 27 箇所において除染を実施しました。

## 1-2 予算

### 1-2-1 財源

県は、国が制定した「放射線量低減対策特別緊急事業費補助金」を財源として、「福島県民健康管理基金」を造成し、同基金から一般会計予算に繰り入れ、全額国費にて除染を実施してきました。

### 1-3 除染の方法

#### 1-3-1 除染業務のフロー

「除染関係ガイドライン（環境省）」及び「除染業務に係る技術指針（福島県）」に基づき、表3の流れに沿って、除染実施の必要性及び除染方法を判断し、除染を実施しました。収集した除去土壌等の多くは、市町村が設置した仮置場へ搬出しました。

表 3 除染作業の基本的な流れ

<実施項目>	<目的・内容>
除染実施区域内 詳細測定	<p>個々の施設等における除染実施の必要性の判断及び除染方法の決定のために詳細測定する。</p> <p><b>【除染実施の必要性判断の考え方】</b></p> <p>「道路」の場合は、まず歩道の中央線上付近など、人が多くの時間を過ごす場所で、10～30m ピッチで空間線量率を測定する※。次に大字等を目安に区分を設定し、当該区分毎に測定値の平均が、基準値 <math>0.23 \mu\text{Sv/h}</math> 以上か未満かにより除染実施の必要性を判断する。</p> <p>「河川」の場合は、河川周辺的生活圏において空間線量率の分布が把握できるような間隔で測定し※、その平均値を基に、除染実施の必要性を判断する。</p> <p>「公園」の場合は、10～30m 程度に区切った各メッシュにつき1点で測定する※。空間線量率のばらつきが少ないと考えられる場合には均等に分散させた場所等5点程度を測定する。その平均値を基に、除染実施の必要性を判断する。</p> <p>「県営団地」の場合は、庭等の屋外で、人が比較的多くの時間を過ごすことが想定される場所等5点程度を測定し※、その平均値を基に、除染実施の必要性を判断する。</p> <p>※ 測定高さ 1m</p>
作業開始前線量測定 (事前モニタリング)	除染作業による除染の効果を確認するため、除染作業開始前に測定する。
除染等の措置	事前測定において、空間線量率が $0.23 \mu\text{Sv/h}$ 以上の箇所について、市町村除染実施計画に基づく方法により除染を実施する。
除去土壌の積込・搬出	収集した除染土壌等を大型土のう等に詰め、指定の仮置場へ搬出する。
作業終了後線量測定 (事後モニタリング)	除染作業による除染の効果を確認するため、除染作業終了後に測定する。

空間線量率の測定には、次の機器を使用しました（表4参照）。

<空間線量率を確認する場合（測定高さ 1m）>

- ・ NaI シンチレーションサーベイメータ

表 4 空間線量率測定機器

	
NaI シンチレーションサーベイメータ	測定の様子

また、除染作業中に除染対象（屋根、建物の側面、ガードレール、標識、ホットスポットとなる雨樋や集水桝など）の表面の汚染の程度を把握するために、対象物の表面近くの空間線量率や表面汚染密度を確認することがありました。その際に用いた測定機器は、以下のとおりです（表5参照）。

<表面汚染の程度を確認する場合（測定高さ 1cm）>

- ・ GM サーベイメータ
- ・ NaI シンチレーションサーベイメータ（遮へい体使用）

表 5 表面汚染密度測定機器

	
GM サーベイメータ例	測定の様子

### 1-3-2 道路除染

道路除染は、表6の基本的な流れ、図2のイメージのとおり実施しました。

表6 道路除染の基本的な流れ

法面除染	各市町村で実施している範囲の法面について、除草や表土の剥ぎ取りを実施。
------	-------------------------------------



除草の様子

道路付属物除染	ガードレールや標識など、線量に影響するものだけに限り、布やブラシ等で拭き取りを実施。
---------	--



道路付属物洗浄の様子

路面除染	<p>手作業により締固まった土砂・落葉・堆積物を撤去。          高圧洗浄機や路面清掃車、ブラシにより洗浄。敷砂利部については、敷砂利の撤去を行い、購入砂利等により原形復旧。</p>
------	---



高圧洗浄機



路面清掃車

側溝除染	<p>側溝清掃は除染作業の最後に実施することとされ、蓋を撤去し、蓋の裏側を高圧洗浄。次に、側溝清掃車や人力により側溝部の土砂を撤去し、高圧洗浄を実施。</p>
------	---



道路側溝除染の様子

排水処理	<p>周辺環境への二次汚染を防止するために下記の取組みを徹底。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高圧洗浄を実施する際には、周りに洗浄水を飛散させないよう養生を実施</li> <li>・ 回収した汚染水は、水処理施設へ移送し、凝集剤（ポリ塩化アルミニウムなど）または静置により上澄み水と泥を分離させ、上澄み水はろ過した上で放水。或いは、現場にてろ過剤を用いて排水処理を実施</li> </ul>
------	---



汚染水飛散養生の様子



回収型高圧洗浄機による除染



凝集剤を添加



ろ過前：200Bq/kg



ろ過後：10Bq/kg

ろ過剤による処理

↓  
除去土壌の運搬・保管へ（1-3-6参照）

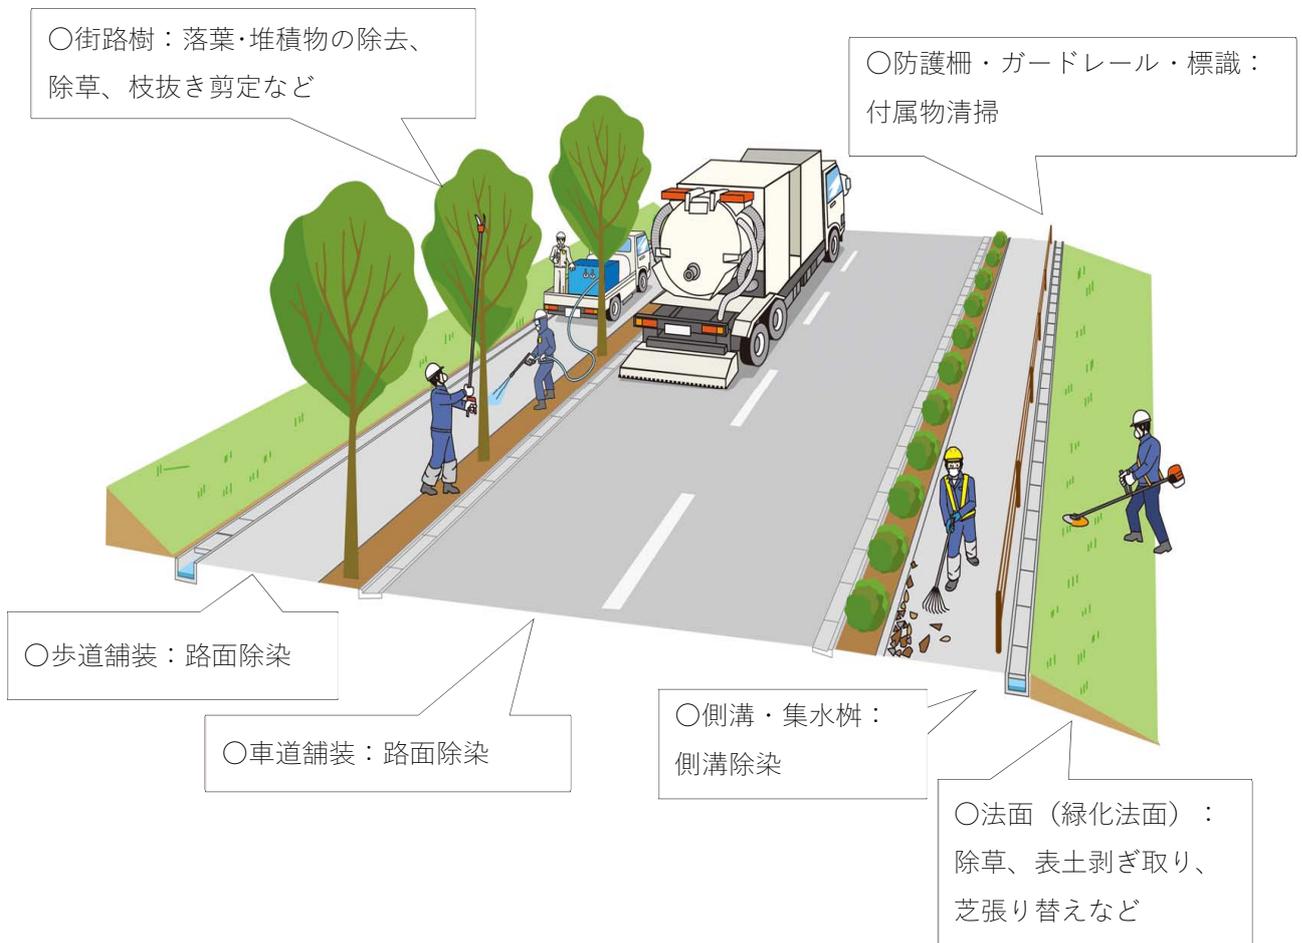


図 2 道路除染のイメージ

### 1-3-3 河川除染

河川は、主に下記のとおり除染を実施しました（表7参照）。

- ・除草：刈取り高を10cm以下として除草し、線量の低減効果が得られない場合には、更に表土剥ぎ取りを実施
- ・芝生除染：サンプル試験などにより芝の深刈り深度を決定し、定めた深さで切削する。深刈りの線量低減効果が確認できない場合、芝を剥ぎ取り（六角川親水公園（二本松市）では5cm）し、芝張り替えを実施。

六角川親水公園（二本松市）で実施したサンプル試験は、浅刈り（地表上1cm程度）、深刈り（地表下1cm程度）、剥ぎ取り（地表下3cm程度）したケースにおいて空間線量率を測定し、それぞれの低減効果を確認した。

表7 河川除染の様子



- ・通路除染：締固まった土砂・粗大塵埃等を撤去し、路面清掃車や高圧洗浄機、ブラシ等による除染を実施。敷砂利部については、汚染部分を撤去し、購入砂利を補填し原形復旧を実施。

### 1-3-4 公園除染

公園は、主に下記のとおり除染を実施しました（表8参照）。

- ・除草：刈取り高を10cm以下として除草し、線量の低減効果が得られない場合には、更に表土剥ぎ取りを実施。
- ・天地返し：表土部10cmと、地下10~30cmの土を掘削入れ替え。
- ・表土剥ぎ取り：サンプル試験などにより、剥ぎ取り厚さを決定し、表土剥ぎ取りを実施（例：あづま総合運動公園（福島市）では5cm）。汚染されていない土を客土し、敷き均し、締め固めを実施。

表 8 公園除染の様子

	
<p>表土剥ぎ取りの様子</p>	<p>表土剥ぎ取り（人力）の様子</p>
	
<p>客土敷き均しの様子</p>	<p>転圧の様子</p>

- ・芝生除染：サンプル試験などにより芝の深刈り深度を決定し、定めた深さで切削する。深刈り（地表下 1cm 程度）で線量の低減効果が得られない場合には、更に剥ぎ取り（例：あづま総合運動公園（福島市）では 5cm）、芝張り替えを実施。
- ・樹木の剪定：樹木の根元周辺で、地表面の落葉の除去と除草を実施。常緑樹については、生育に影響を与えない範囲で、枝抜き剪定や刈り込みを実施。
- ・施設洗浄：屋根・雨樋・外壁等について、ゴミや苔、泥等を除去。線量が高い場合のみ、高圧洗浄を実施。
- ・遊具清掃：金属表面をブラシや布などで拭き取り作業を実施。
- ・駐車場清掃：締固まった土砂・粗大塵埃等を撤去し、路面清掃車や高圧洗浄機、ブラシ等による除染を実施。

### 1-3-5 県営団地除染

県営団地除染は、表9の基本的な流れ、図3のイメージのとおり実施しました。

表9 県営団地除染の基本的な流れ

屋根・雨樋・外壁等の除染	ゴミや苔、泥等を除去。線量が高い場合のみ、高圧洗浄を実施。
--------------	-------------------------------



屋根・雨樋・外壁等の除染の様子

庭等の除染	草木の除去や芝の剥ぎ取り（例：福島市では5cm程度）、表土剥ぎ取り（例：福島市では1cm程度）を実施。剥ぎ取り箇所は、芝の張り替えや客土を実施。
-------	--



庭の除染の様子



芝張り替えの様子

↓

駐 車 場 除 染	締固まった土砂・粗大塵埃等を撤去し、高圧洗浄機、ブラシ等による洗浄を実施。
-----------	---------------------------------------



駐車場除染の様子

↓

側溝等の除染 排 水 処 理	道路除染と同様
-------------------	---------

↓

除去土壌の搬出・保管へ（1-3-6参照）

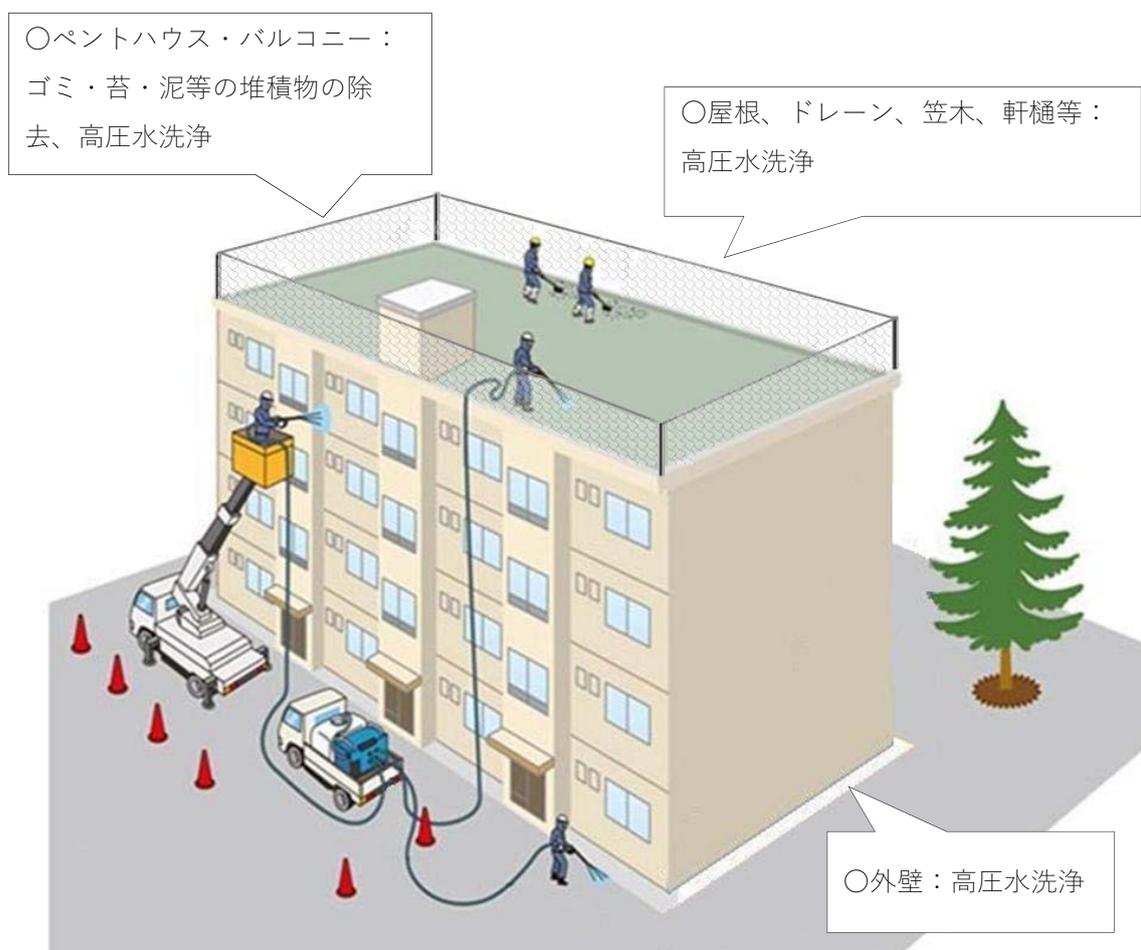


図 3 県営団地除染のイメージ

### 1-3-6 運搬・保管

各現場で除染により除去した土壌は、フレキシブルコンテナ等に入れ、線量測定の後、現場保管箇所や仮置場に運搬します。除去土壌を収集・運搬する際には、放射性物質が人の健康や生活環境に影響を及ぼすことを防ぐため、以下の安全対策を図りました。

#### 【安全対策】

##### ① 飛散・流出・漏れ出しの防止

- ・ フレキシブルコンテナや大型土のう等の容器に入れて運搬する（表 10 参照）
- ・ シートによる養生、有蓋運搬車の利用（表 10 参照）
- ・ 可能な限り水切りを行う

表 10 運搬の様子



② 放射線防護

- ・ 運搬車の表面 1 m の空間線量率は  $100 \mu\text{Sv/h}$  以下

③ 運搬ルート

- ・ 可能な限り住宅街、商店街、通学路、狭い道を避ける
- ・ 通勤通学時間帯を避ける

④ その他

- ・ 運搬中は車体外側に標識を掲示（除去土壌運搬中、運搬車名など）
- ・ 危険物（爆発性・引火性）の混載禁止

除去土壌は、放射性物質汚染対処特別措置法により福島県大熊町・双葉町に建設される中間貯蔵施設へ搬出することとされています。中間貯蔵施設へ搬出するまでの間は、以下の保管形態により、適切に保管しています。

【保管形態】

(1) 市町村や県で設置した仮置場

除去土壌等の保管は、除染実施主体が行いますが、除染した現場等での保管が困難な場所もあったため、市町村と協議の上、市町村が設置した仮置場に保管しました。なお、福島市・伊達市においては、県管理仮置場も設置し、除去土壌等を保管しました。

(2) 除染した現場等での保管（以下、現場保管）

市町村による仮置場の設置に先立ち実施した除染で発生した除去土壌は、県営団地や公園の敷地内、道路待避所等に現場保管しました。また、県営団地については、地上が使えるよう地下に保管しました。

保管に当たっては、放射性物質による生活環境への影響を防ぐため、主に、以下の安全対策を実施しました。ただし①と⑤については、上記（1）県で設置した仮置場のみ適用しています。

## 【安全対策】

- ① 関係者以外の接近を防止
  - ・ 周囲を囲うとともに、掲示板を設ける
- ② 飛散・流出の防止
  - ・ 雨水や地下水が進入しないよう、表面を防水シートで覆う
- ③ 公共水域・地下水の汚染防止
  - ・ 流出防止のため、保管場所の底面を遮水シート等で覆う
- ④ 遮へいによる放射線の遮断
  - ・ 表面に盛土や土のう等の遮へい材を設置することにより、放射線を遮断する
- ⑤ 空間線量率と地下水の継続的なモニタリング
  - ・ 保管場所等境界における空間線量率を、週に1度測定し記録する
  - ・ 保管場所周縁の地下水の水質へ影響がないことを確認するため、月に1度、地下水の水質検査を行い記録する

### 1-3-7 安全対策等

除染作業員の安全確保は労働安全衛生法に加え、放射線被ばくの低減を図るために、「東日本大震災により生じた放射能物質により汚染された土壌等を除染する為の業務等に係る電離放射線障害防止規則（除染電離則）」及び「除染電離則ガイドライン」に基づき、表 11 の措置を図りました。

表 11 除染電離則による安全対策（抜粋）

線量管理	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 2.5 <math>\mu</math>Sv/h 以下の作業場所：外部被ばく線量を1日毎に記録管理する</li><li>・ 2.5 <math>\mu</math>Sv/h を超える作業場所：外部被ばく線量を1日毎に記録管理するとともに、内部被ばく線量の測定を行う</li><li>・ 記録・保管：事業者は、線量の測定結果を作業員に知らせるとともに30年間保管しなければならない（ただし、5年間保存した後または作業員が離職した後は国機関に引き渡すことができる）</li></ul>
汚染の防止	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 事業者は、汚染土壌を湿潤化するなど、粉じんの発散を抑制するための措置を講じなければならない</li><li>・ 事業者は、内部被ばく防止のため、保護具（防じんマスク、長袖衣類、綿手袋、ゴム長靴）を除染等業務従事者に着用させなければならない（図4参照）</li></ul>

<p>安全衛生教育の実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業者は、労働者に対し、次の科目について特別教育を実施しなければならない             <ol style="list-style-type: none"> <li>① 電離放射線の生態に与える影響と被ばく線量の管理の方法に関する知識（学科）</li> <li>② 除染等作業の方法に関する知識（学科）</li> <li>③ 除染等作業に使用する機械等の構造と取扱いの方法に関する知識（学科）</li> <li>④ 関係法令（学科）</li> <li>⑤ 除染等作業の方法と使用する機械等の取扱い（実技）</li> </ol> </li> </ul>
<p>健康診断</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業者は、労働者に対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際、及びその後6ヶ月毎に1回、次の項目について健康診断を行わなければならない             <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;特殊健康診断内容&gt;</li> <li>① 被ばく歴の有無の調査及びその評価</li> <li>② 白血球数及び白血球百分率の検査</li> <li>③ 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査</li> <li>④ 白内障に関する眼の検査</li> <li>⑤ 皮膚の検査</li> </ul> </li> </ul>

### 内部被ばくのおそれが小さい場合の服装（例）



高所作業時や落下物の恐れがある場合などは、ヘルメットを着用すること

図 4 防護具の例

#### 1-4 これまでの主な出来事

前例のない除染業務や、平時の事業規模をはるかに上回る予算執行のための人手不足など非常事態のために様々な問題・課題が生じ、解決に取り組んできました。主要な内容を以下に記します。

##### 1-4-1 発注者支援業務の活用

職員は膨大な復旧・復興事業に追われ、慢性的な人手不足が大きな課題となりました。そこで、人員不足を補い、円滑な業務の執行を図ることで、放射性物質による環境汚染の影響を出来るだけ速やかに低減するため、平成 24 年度から発注者支援業務を導入しました。この発注者支援業務は、関係機関との調整業務や設計積算業務、現場監督業務等、職員の業務の一部を外部に委託するものです(表 12 参照)。発注者支援業務を活用したことにより、膨大な業務を関係機関と連携を図りながら、除染業務を着実に進捗させることが出来ました。

表 12 発注者支援業務年度予算

年度	年度予算計（百万円）	件数（件）	のべ人数（人）
H24	45	6	7
H25	189	15	18
H26	309	24	26
H27	298	21	23
H28	260	14	15
H29	209	11	11
計	1,310	91	100

#### 1-4-2 仮置場の不足

県内の多くの市町村が、除染土壌等の仮置場の確保・設置に難航しました。発生した除染土壌は同一地区内に仮置きすることが望ましいとする市町村が多く、地区毎に仮置場を確保することが求められたためです。

その対応として土木部は、各市町村や地元との調整を踏まえ、独自に一時保管場所として仮々置場を確保し、また福島県都市公園条例を改正（平成 28 年 10 月）して市の仮置場として県有地を使用できるようにするなど、対応しました。

#### 1-4-3 会計実地検査の受検

平成 28 年度から、除染作業業務委託について会計実地検査が実施されました。受検の概要は以下のとおりです。

<平成 28 年度 福島県及び管内市町村受検結果概要>

- ・ 実施日：平成 29 年 1 月 23 日（月）～1 月 27 日（金）
- ・ 検査対象：契約が平成 26 年度から平成 28 年 6 月 30 日までに行ったもの
- ・ 該当件数／該当契約金額：143 件／11,277 百万円  
 （内訳）平成 26 年度：38 件／3,891 百万円  
 平成 27 年度：94 件／6,393 百万円  
 平成 28 年度：11 件／993 百万円

<平成 29 年度 福島県及び管内市町村受検結果概要>

- ・ 実施日：平成 30 年 1 月 22 日（月）～1 月 26 日（金）
- ・ 検査対象：契約の履行期間が平成 27・28 年度に掛かるもの
- ・ 該当件数／該当契約金額：184 件／18,649 百万円

(内訳) 平成 26 年度 : 37 件 / 3,888 百万円  
平成 27 年度 : 91 件 / 8,158 百万円  
平成 28 年度 : 56 件 / 6,603 百万円

## 2 除染の実施状況

### 2-1 投資額と実施延長・箇所数

県土木部は、平成 24 から 29 年度にかけて、約 258 億円の予算を投じ、除染業務を実施しました。総延長と箇所数は表 13 のとおりです。年度毎の予算と完了道路延長・箇所数は表 14 のとおりです。

表 13 (表 2 再掲) 県土木部の除染実施総延長・箇所数

道路	1,635	km
河川・砂防	27	箇所
公園・下水道	9	箇所
県営団地	48	団地
他	3	箇所

表 14 進捗推移と年度予算

年度	道路	河川・砂防	公園・下水道	県営団地	他	年度予算計 (百万円)
	完了延長 (km)	完了箇所数	完了箇所数	完了箇所数	完了箇所数	
H24	21	1	0	2	1	284
H25	311	1	0	9		4,114
H26	254	3	3	22	2	4,640
H27	279	3	2	7		4,818
H28	548	16	4	8		7,209
H29	222	3	0	0		4,686
計	1,635	27	9	48	3	25,751

### 2-2 市町村別除染実施状況

除染実施計画を策定した市町村における県管理施設の除染実施状況は、表 15 のとおりです。各市町村の除染実施箇所については、巻末の資料 1 を参照ください。

また、除染の効果として、作業後の空間線量率は作業前に比べ、低減が図られました(巻末資料 1.2 参照)。

表15 市町村別除染実施状況

除染実施計画策定市町村	道路		河川・砂防	公園・下水道	県営団地	他
	県管理総延長(km)	実施延長(km)	実施箇所	実施箇所	実施箇所	実施箇所
1 福島市	338.362	171.170	1	1	19	1
2 郡山市	377.160	285.242	2	2	16	2
3 いわき市	636.831	49.400	—	1	1	—
4 白河市	159.139	93.850	6	—	5	—
5 須賀川市	196.612	74.970	—	1	3	—
6 相馬市	93.219	8.700	—	—	1	—
7 二本松市	218.395	182.200	1	1	—	—
8 田村市	253.003	53.281	—	—	—	—
9 南相馬市	213.379	128.800	4	1	3	—
10 伊達市	220.192	179.600	2	—	—	—
11 本宮市	75.529	64.220	—	1	—	—
12 桑折町	18.549	17.000	3	—	—	—
13 国見町	23.326	14.100	3	1	—	—
14 川俣町	64.035	42.500	—	—	—	—
15 大玉村	38.937	17.400	—	—	—	—
16 鏡石町	10.008	1.650	—	—	—	—
17 天栄村	74.383	29.900	—	—	—	—
18 会津坂下町	対象外					
19 湯川村	24.531	16.814	—	—	—	—
20 会津美里町	対象外					
21 西郷村	64.470	38.100	5	—	—	—
22 泉崎村	14.567	9.700	—	—	—	—
23 中島村	19.981	0.700	—	—	—	—
24 矢吹町	53.474	10.310	—	—	—	—
25 棚倉町	84.235	7.100	—	—	—	—
26 鮫川村	対象外					
27 石川町	調査にて終了(0.23 $\mu$ Sv/h未満)		対象外			
28 玉川村	調査にて終了(0.23 $\mu$ Sv/h未満)		対象外			
29 平田村	調査にて終了(0.23 $\mu$ Sv/h未満)		対象外			
30 浅川町	調査にて終了(0.23 $\mu$ Sv/h未満)		対象外			
31 古殿町	69.802	0.411	—	—	—	—
32 三春町	68.585	60.640	—	—	—	—
33 小野町	対象外					
34 広野町	40.336	31.330	—	—	—	—
35 川内村	79.815	46.250	—	—	—	—
36 新地町	対象外					
合計	3,530.9	1,635.3	27	9	48	3

対象外: 除染実施計画を策定している市町村の内、市町村との協議により、県管理施設が除染対象外となった箇所

### 2-3 除染作業前後の状況

除染作業前後の状況を次ページ以降に掲載しました。

表 16 道路除染 作業前後の状況

作業前		作業後	
道路			
			
			
			

表 17 河川除染 作業前後の状況

作業前		作業後	
河 川			
			
			
			

表 18 公園除染 作業前後の状況

		作業前	作業後
公園			
			
			
			

表 19 県営団地除染 作業前後の状況

作業前		作業後	
県 営 団 地			
			
			
			

### 3 平成 30 年度以降の対応

#### 3-1 除染土壌等の中間貯蔵施設への搬出の考え方

放射性物質汚染対処特別措置法により、県内の除去土壌等は中間貯蔵施設へ搬出することとされていますが、除去土壌等の搬出方針は、年度毎に各市町村に割り当てられた搬出可能量をもとに策定されます。県が除染した施設の除去土壌等は、各市町村の搬出可能量の枠組みの中にあるため、市町村の搬出計画に合わせて搬出先・時期等の調整を図っていく必要があります。

#### 3-2 県管理施設の現場保管土と搬出計画

除染作業は平成 29 年度に完了したものの、一部の県営団地等敷地内や県土木部管理仮置場に現在も除去土壌等が保管されています（表 20 参照）。

搬出時期については、優先的に搬出されている学校等に保管されている除染土壌等から、環境省・各市町村・県との調整により、順に決められます。

中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送は、平成 27 年度から開始され、徐々に輸送量は増えていますが、平成 30 年度以降も当面続きます。県は、保管している除去土壌等について、漏れなく確実に中間貯蔵施設へ搬出するよう、引き続き保管土壌を管理するとともに、関係機関と搬出に向けた調整を図って参ります。

表 20 土木部の現場保管土壌等（平成 30.3.31 現在）

保管の状況	箇所数	保管量（袋） ※1 m <sup>3</sup> =1 袋換算
① 公所等の現場保管数 【県営団地敷地内、事務所敷地内、公園】	31 箇所	23,627 袋
② 県仮置場の保管数【保原土木・民地】	2 箇所	524 袋
③ 県仮置場の保管数【県中建設・待避所】	1 箇所	1,779 袋
④ 県仮置場の保管数 【県北建設・チェーン着脱所等】	2 箇所	524 袋
合計（①+②+③+④）	36 箇所	26,454 袋



## 資料1 市町村別除染実施箇所

1. 福島市	35
2. 郡山市	39
3. いわき市	43
4. 白河市	46
5. 須賀川市・鏡石町	49
6. 相馬市	51
7. 二本松市	52
8. 田村市	55
9. 南相馬市	56
10. 伊達市	58
11. 本宮市	60
12. 桑折町・国見町	62
13. 川俣町	64
14. 大玉村	65
15. 天栄村	66
16. 湯川村	67
17. 西郷村	68
18. 泉崎村・中島村・矢吹町	70
19. 棚倉町	72
20. 石川町・玉川村・平田村・浅川町・古殿町	73
21. 三春町	74
22. 広野町	75
23. 川内村	76

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地図（タイル）を複製したものである。（承認番号 平 29 情複、第 1637 号）

また、更に複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。




# 福島市 道路除染

No.	契約路線河川等名	工期（始）	工期（終）	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	国道114号 外	2013/4/30	2017/3/31	1.29	0.53	58.9%
②	国道115号 外	2014/7/10	2018/3/30	2.48	0.51	79.4%
③	国道399号 外	2014/11/21	2018/3/30	2.08	0.09	95.7%
④	上名倉飯坂伊達線 外	2013/7/29	2018/3/30	0.95	0.23	95.7%
⑤	水原福島線 外	2013/11/1	2018/3/30	2.72	0.12	95.6%
⑥	南福島停車場線	2017/1/6	2018/3/30	0.51	0.10	80.4%
⑦	福島飯坂線 外	2013/4/30	2018/3/30	2.16	1.45	32.9%
⑧	金谷川停車場線	2013/1/30	2013/3/29	0.64	0.58	9.4%
⑨	福島停車場線 外	2013/4/30	2013/8/16	0.90	0.46	48.9%
⑩	福島安達線 外	2014/1/30	2016/3/28	1.00	0.34	66.0%
⑪	折戸笹谷線 外	2014/9/18	2015/6/30	0.57	0.26	54.4%
⑫	庭坂福島線	2014/8/22	2014/10/20	0.38	0.03	92.1%
⑬	福島微温湯線 外	2014/8/22	2014/11/14	0.26	0.21	19.2%
⑭	霊山松川線 外	2015/1/19	2015/12/16	1.48	0.21	85.8%
⑮	大沢広表線 外	2015/2/10	2016/3/28	1.34	0.30	77.6%
⑯	川俣安達線 外	2015/2/13	2015/12/18	0.80	0.55	31.3%
⑰	福島保原線 外	2015/5/18	2016/3/28	1.19	1.18	0.8%
⑱	土湯温泉線 外	2015/10/5	2016/9/30	0.84	0.12	85.7%
⑲	福島吾妻裏磐梯線 外	2015/11/30	2016/12/20	0.55	0.26	52.7%
⑳	飯坂瀬ノ上線 外	2016/8/8	2018/3/30	0.55	0.18	67.3%
㉑	飯坂保原線	2017/1/13	2018/3/30	0.68	0.09	86.8%

■ 他実施路線（上表路線名の「外」に含まれるもの）

- ㉒ 本宮土湯温泉線
- ㉓ 飯野三春石川線
- ㉔ 飯坂桑折線
- ㉕ 松川渋川線
- ㉖ 松川停車場戸ノ内線
- ㉗ 金谷川停車場石内線
- ㉘ 東福島停車場線
- ㉙ 庭坂停車場線
- ㉚ 木幡飯野線
- ㉛ 福島飯野線
- ㉜ 山口渡利線
- ㉝ 岡部渡利線
- ㉞ 八島田笹木野停車場線
- ㉟ 中野梶町線
- ㊱ 東湯野寺屋敷線
- ㊲ 山口保原線
- ㊳ 上小国下川原線
- ㊴ 穴原十綱線
- ㊵ 国見福島線

# 福島市 【道路除染】

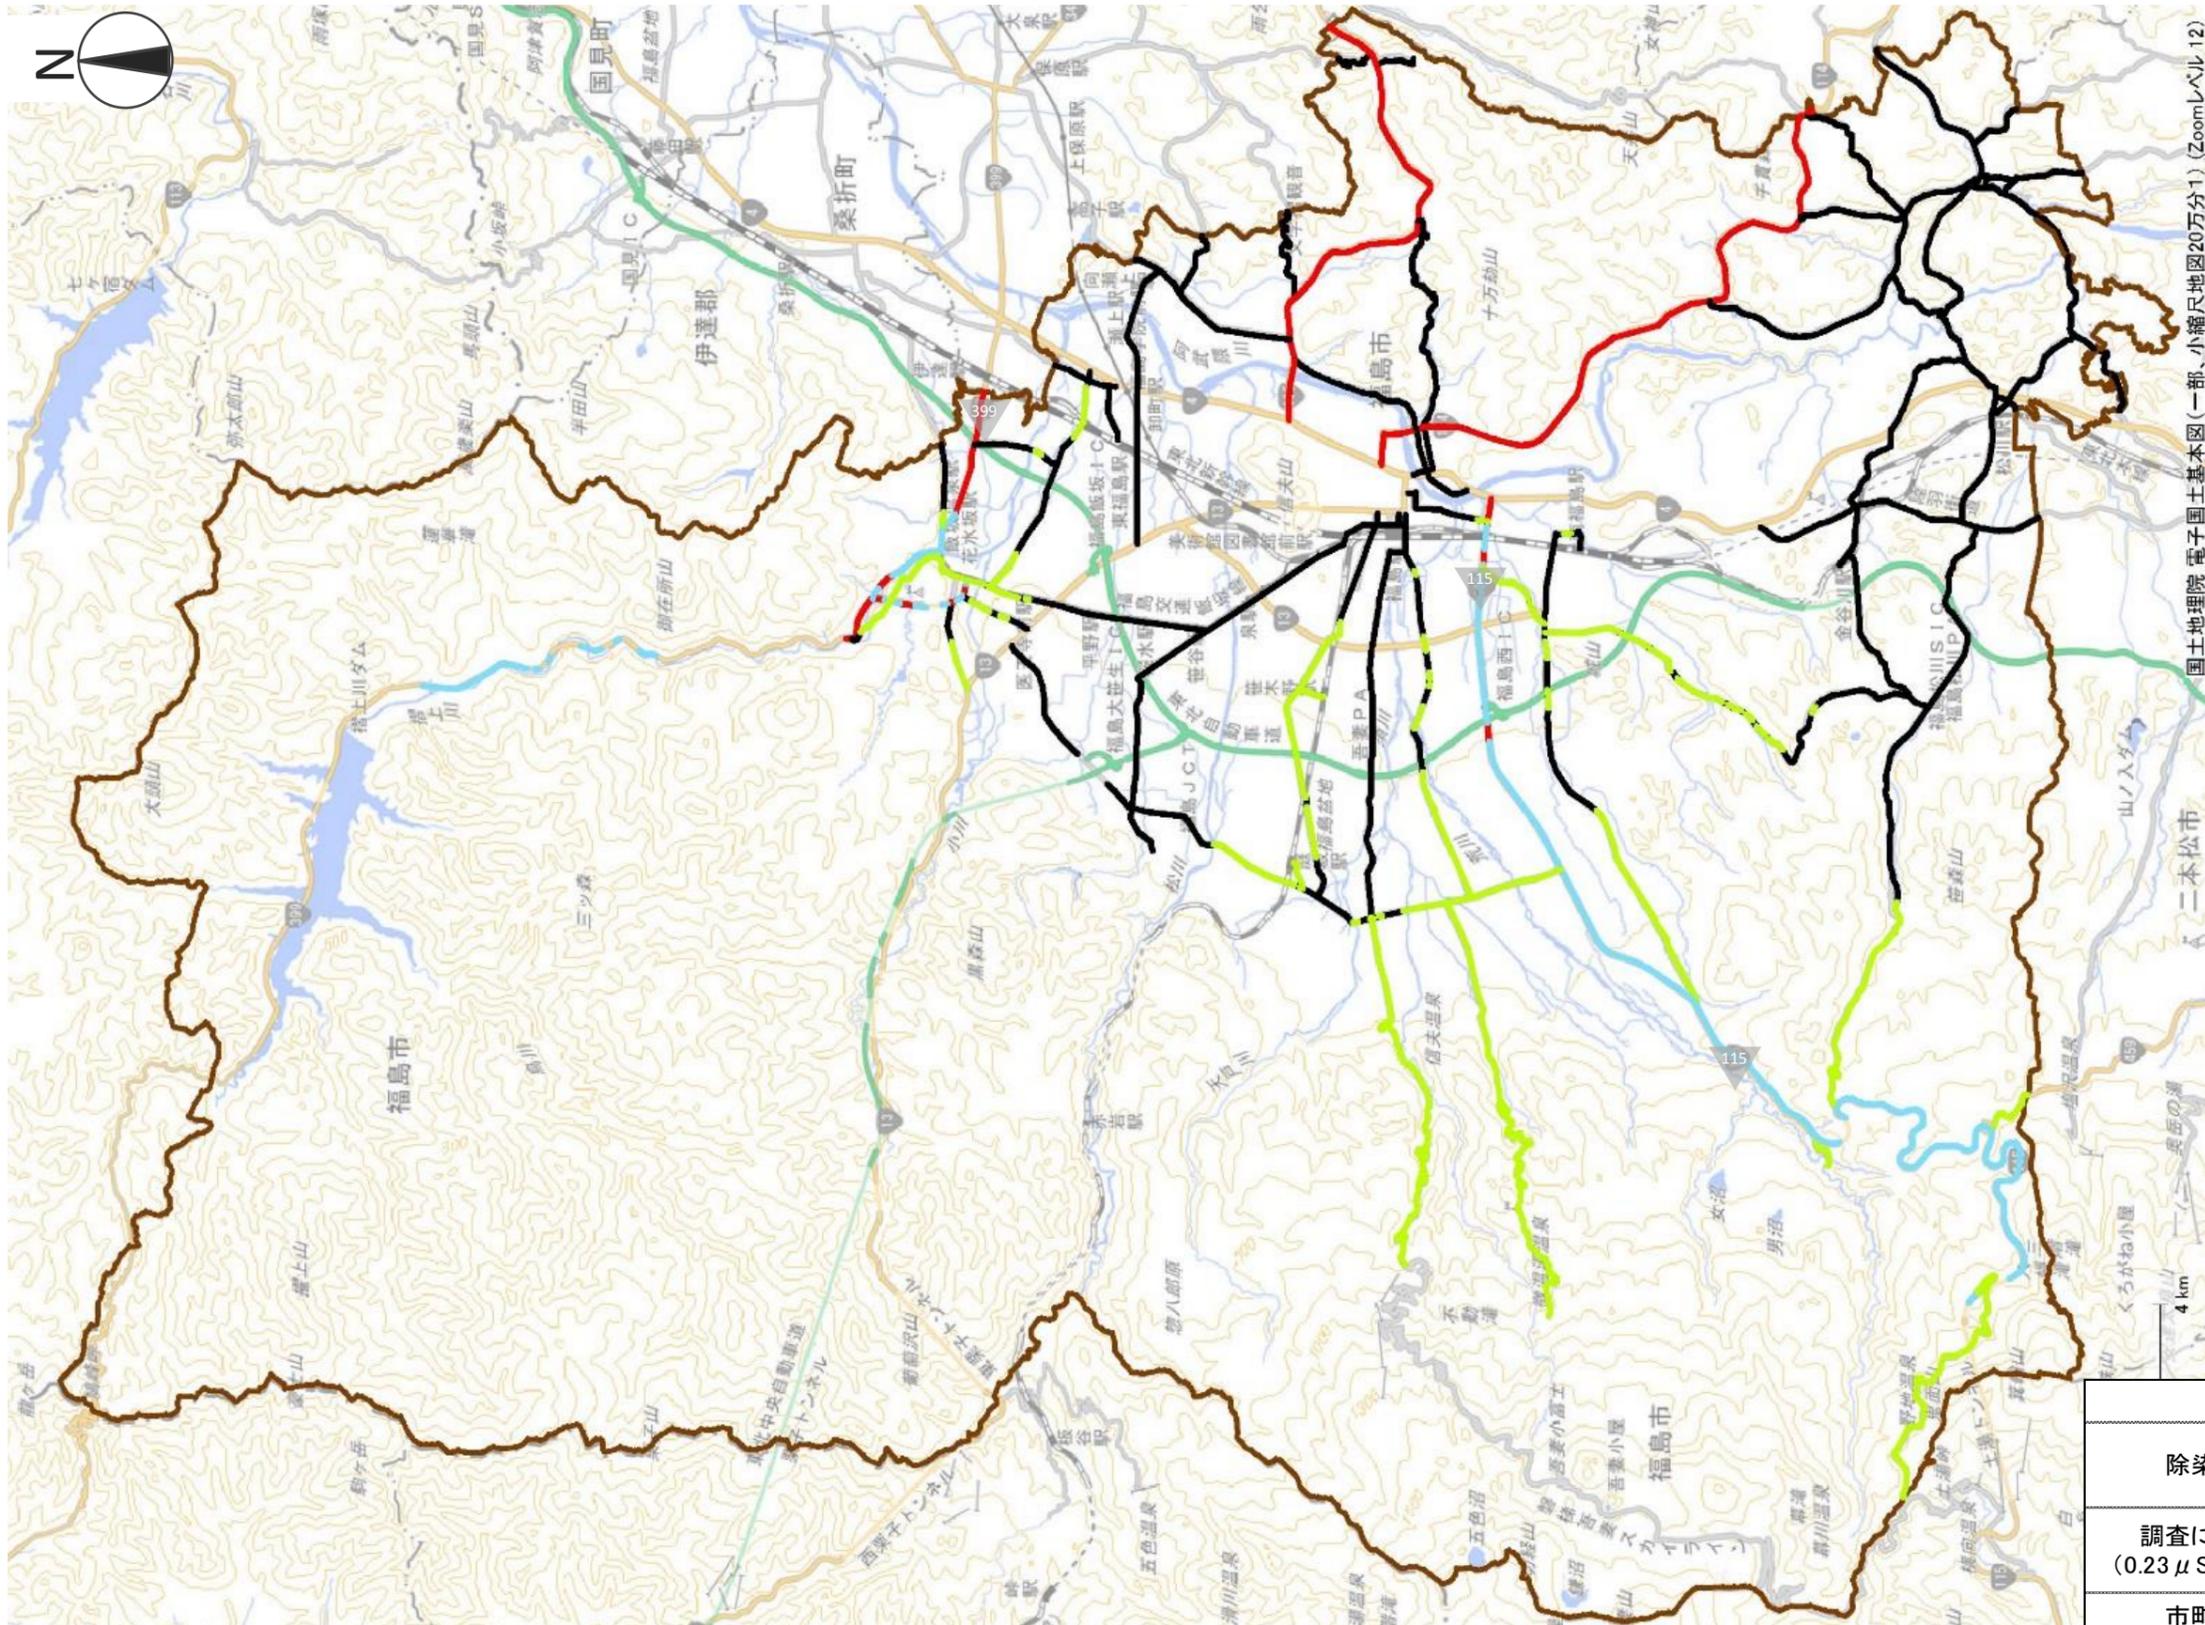

国土地理院 電子国土地基本図(一部、小縮尺地図20万分1) (Zoomレベル12)

【凡例】		
除染実施	国道	■
	県道	■
調査にて終了 (0.23 μSV/h未満)	国道	■
	県道	■
市町村界		■

# 福島市 【河川・公園・他除染】



## (1) 河川除染

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化( $\mu\text{SV/h}$ )		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	松川筋	2017/2/3	2018/3/30	0.68	0.20	70.6%


## (2) 公園除染

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化( $\mu\text{SV/h}$ )		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	あづま総合運動公園	2012/12/28	2015/2/27	1.68	0.22	86.9%

## (3) 他

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)
①	県北建設事務所黒岩分室	H26年度	

# 福島市 【県営団地除染】

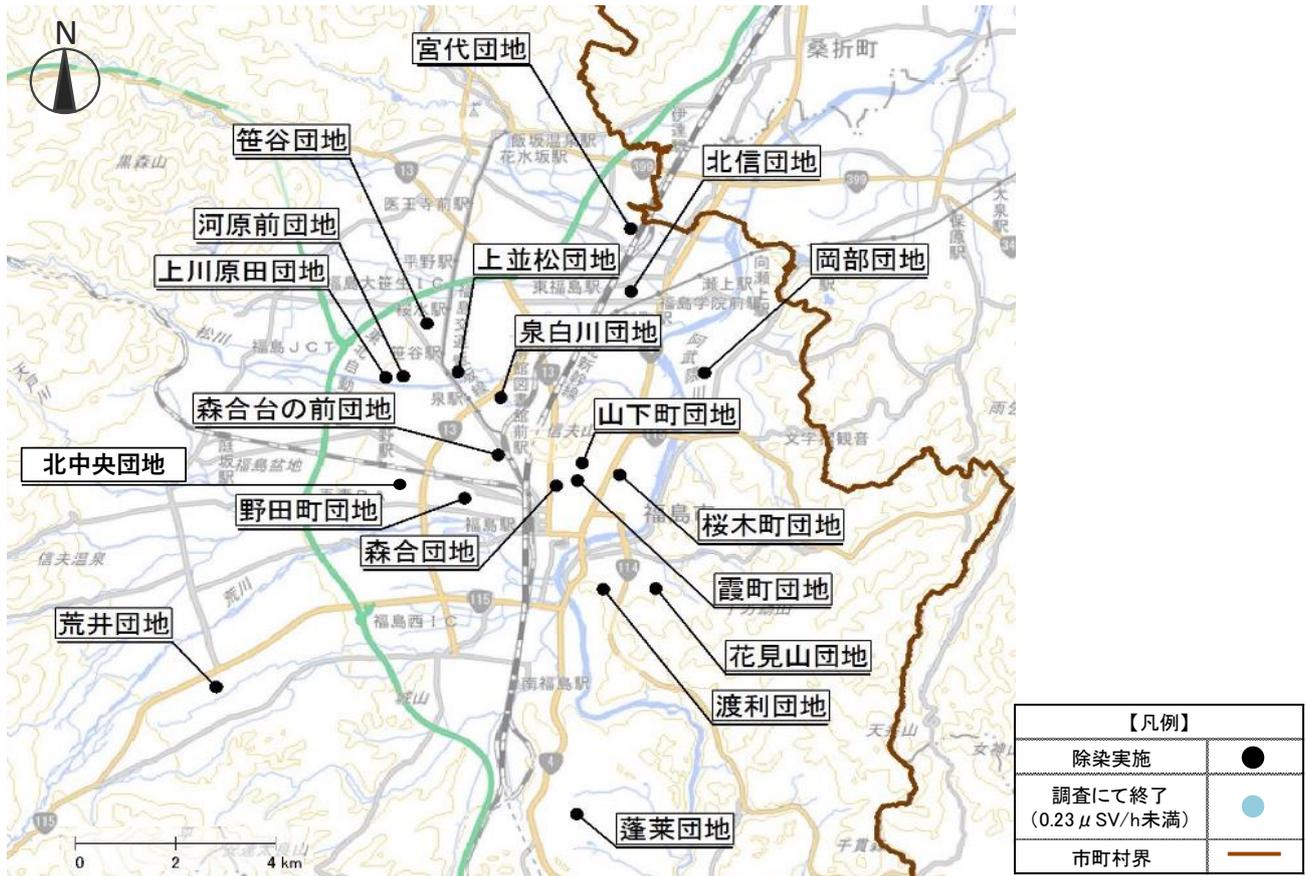

No.	契約路線河川等名	工期（始）	工期（終）	除染による空間線量の変化(μSV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	泉白川団地	2013/1/22	2015/3/31	1.05	0.09	91.4%
②	北信団地	2015/2/5	2015/7/14	2.45	0.65	73.5%
③	山下町団地 外	2013/2/6	2013/12/20	1.20	0.22	81.7%
④	桜木町団地	2013/2/15	2013/12/20	0.94	0.36	61.7%
⑤	蓬莱団地 外	2013/1/18	2014/7/31	1.50	0.99	34.0%
⑥	霞町団地外	2013/2/14	2013/12/20	0.90	0.19	78.9%
⑦	荒井団地	2015/10/15	2016/4/20	0.31	0.13	58.1%
⑧	野田町団地（児童遊園）	2013/2/13	2013/4/19	0.60	0.22	63.3%
⑨	森合台ノ前団地	2015/1/29	2015/8/31	0.44	0.28	36.4%
⑩	笹谷団地 外	2013/2/13	2015/8/31	1.26	0.09	92.9%

■ 他実施団地（上表路線河川等名の「外」に含まれるもの）

- |         |         |
|---------|---------|
| ⑪ 渡利団地  | ⑯ 上川原団地 |
| ⑫ 岡部団地  | ⑰ 花見山団地 |
| ⑬ 宮代団地  | ⑱ 森合団地  |
| ⑭ 上並松団地 | ⑲ 北中央団地 |
| ⑮ 河原前団地 |         |


# 郡山市 道路除染

No.	契約路線河川等名	工期（始）	工期（終）	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	国道288号	2017/1/16	2017/8/31	0.33	0.19	42.4%
②	須賀川二本松線 外	2013/10/11	2016/11/18	1.11	0.77	30.6%
③	本宮熱海線外	2016/7/6	2017/6/30	0.49	0.20	59.2%
④	郡山湖南線 外	2013/10/11	2015/9/30	1.44	0.47	67.4%
⑤	荒井郡山線外	2015/6/30	2016/11/17	0.91	0.72	20.9%
⑥	仁井田郡山線 外	2015/7/1	2017/3/31	0.55	0.15	72.7%
⑦	長沼喜久田線外	2015/8/17	2017/3/31	1.32	0.21	84.1%
⑧	岩根日和田線外	2015/9/11	2017/3/24	0.66	0.20	69.7%
⑨	郡山大越線外	2015/12/10	2017/1/31	0.72	0.23	68.1%
⑩	郡山長沼線外	2015/12/10	2017/6/30	0.54	0.27	50.0%
⑪	三春日和田線外	2016/1/6	2017/8/31	0.65	0.18	72.3%
⑫	芦ノ口大槻線外	2016/2/2	2017/3/31	0.51	0.11	78.4%
⑬	二本松金屋線 外	2016/3/9	2017/7/31	1.45	0.22	84.8%
⑭	小野郡山線外	2016/3/1	2016/10/31	0.25	0.19	24.0%
⑮	二本松三春線外	2016/6/8	2017/7/31	0.82	0.22	73.2%
⑯	河内郡山線外	2016/7/5	2017/3/31	0.57	0.45	21.1%
⑰	阿久津舞木停車場線外	2016/7/6	2017/4/28	0.67	0.20	70.1%
⑱	郡山矢吹線外	2017/1/16	2017/8/31	0.39	0.21	46.2%
⑲	郡山停車場線外	2016/8/30	2017/3/31	0.48	0.43	10.4%

## ■ 他実施路線（上表路線名の「外」に含まれるもの）

- ⑳ 小野田母神線
- ㉑ 中の沢熱海線
- ㉒ 本宮三春線
- ㉓ 飯野三春石川線
- ㉔ 須賀川三春線
- ㉕ 安積長沼線
- ㉖ 田村安積線
- ㉗ 玉川田村線
- ㉘ 谷田川三春線
- ㉙ 石筵本宮線
- ㉚ 谷田川停車場線
- ㉛ 磐城守山停車場線
- ㉜ 日和田停車場線
- ㉝ 安子ヶ島停車場線
- ㉞ 磐梯熱海停車場線
- ㉟ 江持谷田川停車場線
- ㊱ 三穂田須賀川線
- ㊲ 齋藤下行合線
- ㊳ 須賀川二本松自転車道線

# 郡山市 【道路除染】

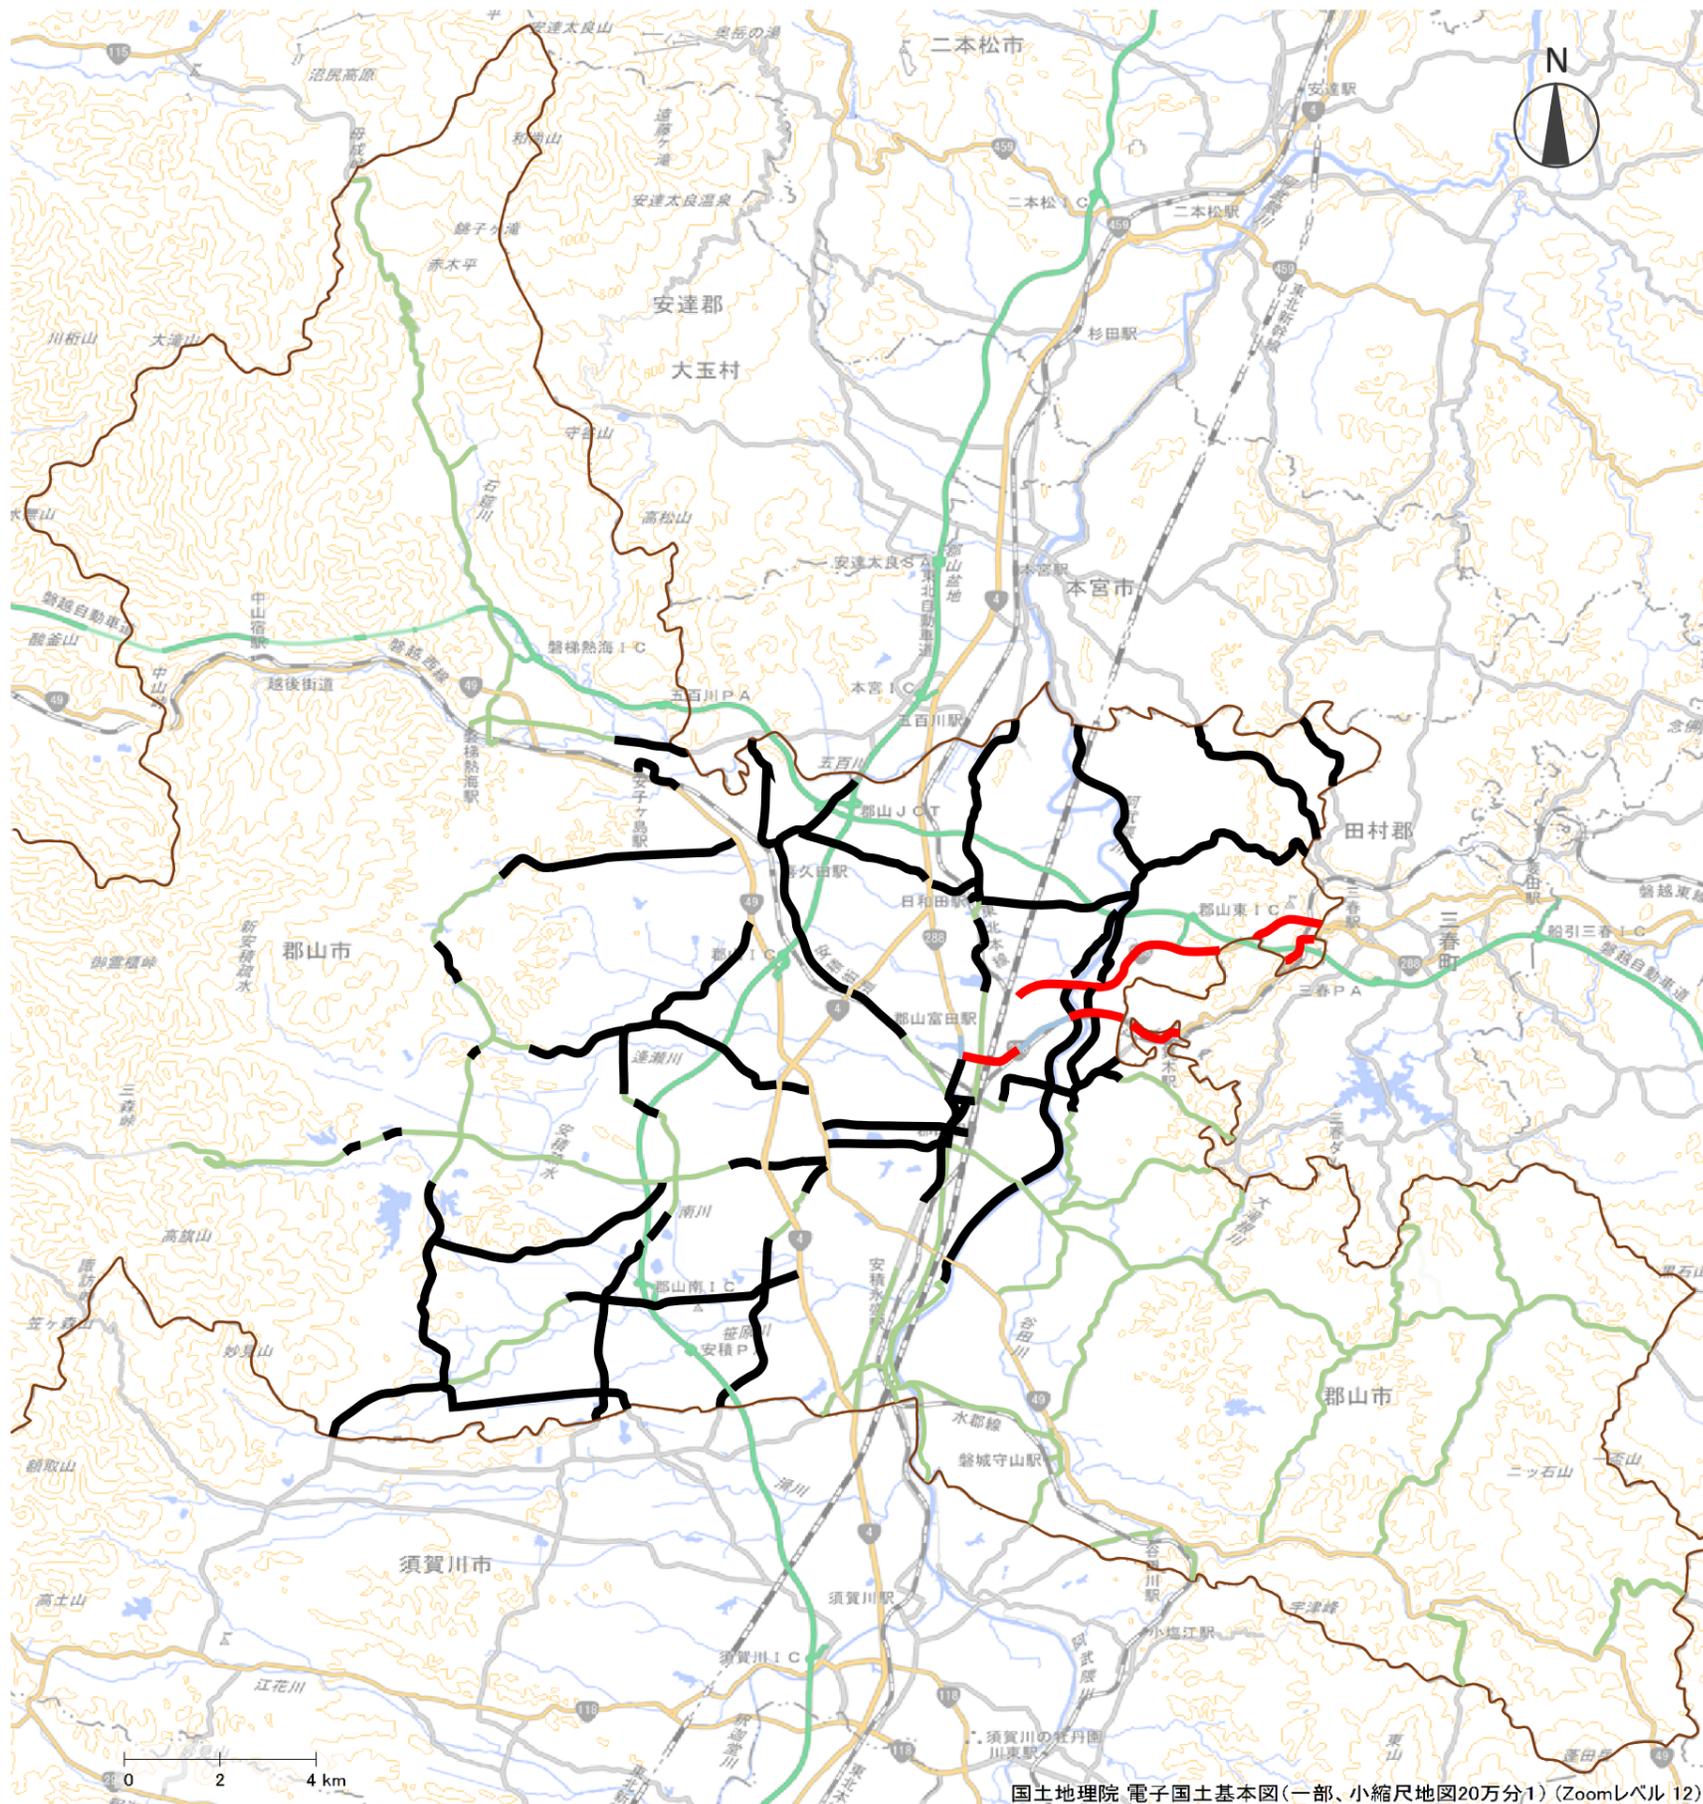

国土地理院 電子国土基本図(一部、小縮尺地図20万分1) (Zoomレベル 12)

【凡例】		
除染実施	国道	<span style="color: red;">—</span>
	県道	<span style="color: black;">—</span>
調査にて終了 ( $0.23 \mu\text{SV/h}$ 未満)	国道	<span style="color: lightblue;">—</span>
	県道	<span style="color: green;">—</span>
市町村界		<span style="color: brown;">—</span>

# 郡山市

## 【河川・公園・下水道・他除染】

### (1) 河川除染


- ① 富田親水公園（市が実施）
- ② あさかの杜運動場（市が実施）

### (2) 公園・下水道除染


No.	契約路線河川等名	工期（始）	工期（終）	除染による空間線量の変化( $\mu\text{SV/h}$ )		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	逢瀬公園	2013/12/18	2014/12/25	0.53	0.31	41.5%
②	県中浄化センター	2013/7/25	2017/3/17	1.10	0.53	51.8%
③	県中流域下水道建設事務所	2014/9/26	2015/1/30	0.75	0.29	61.3%

### (3) 他

No.	契約路線河川等名	工期（始）	工期（終）
①	県中建設事務所	H24年度	

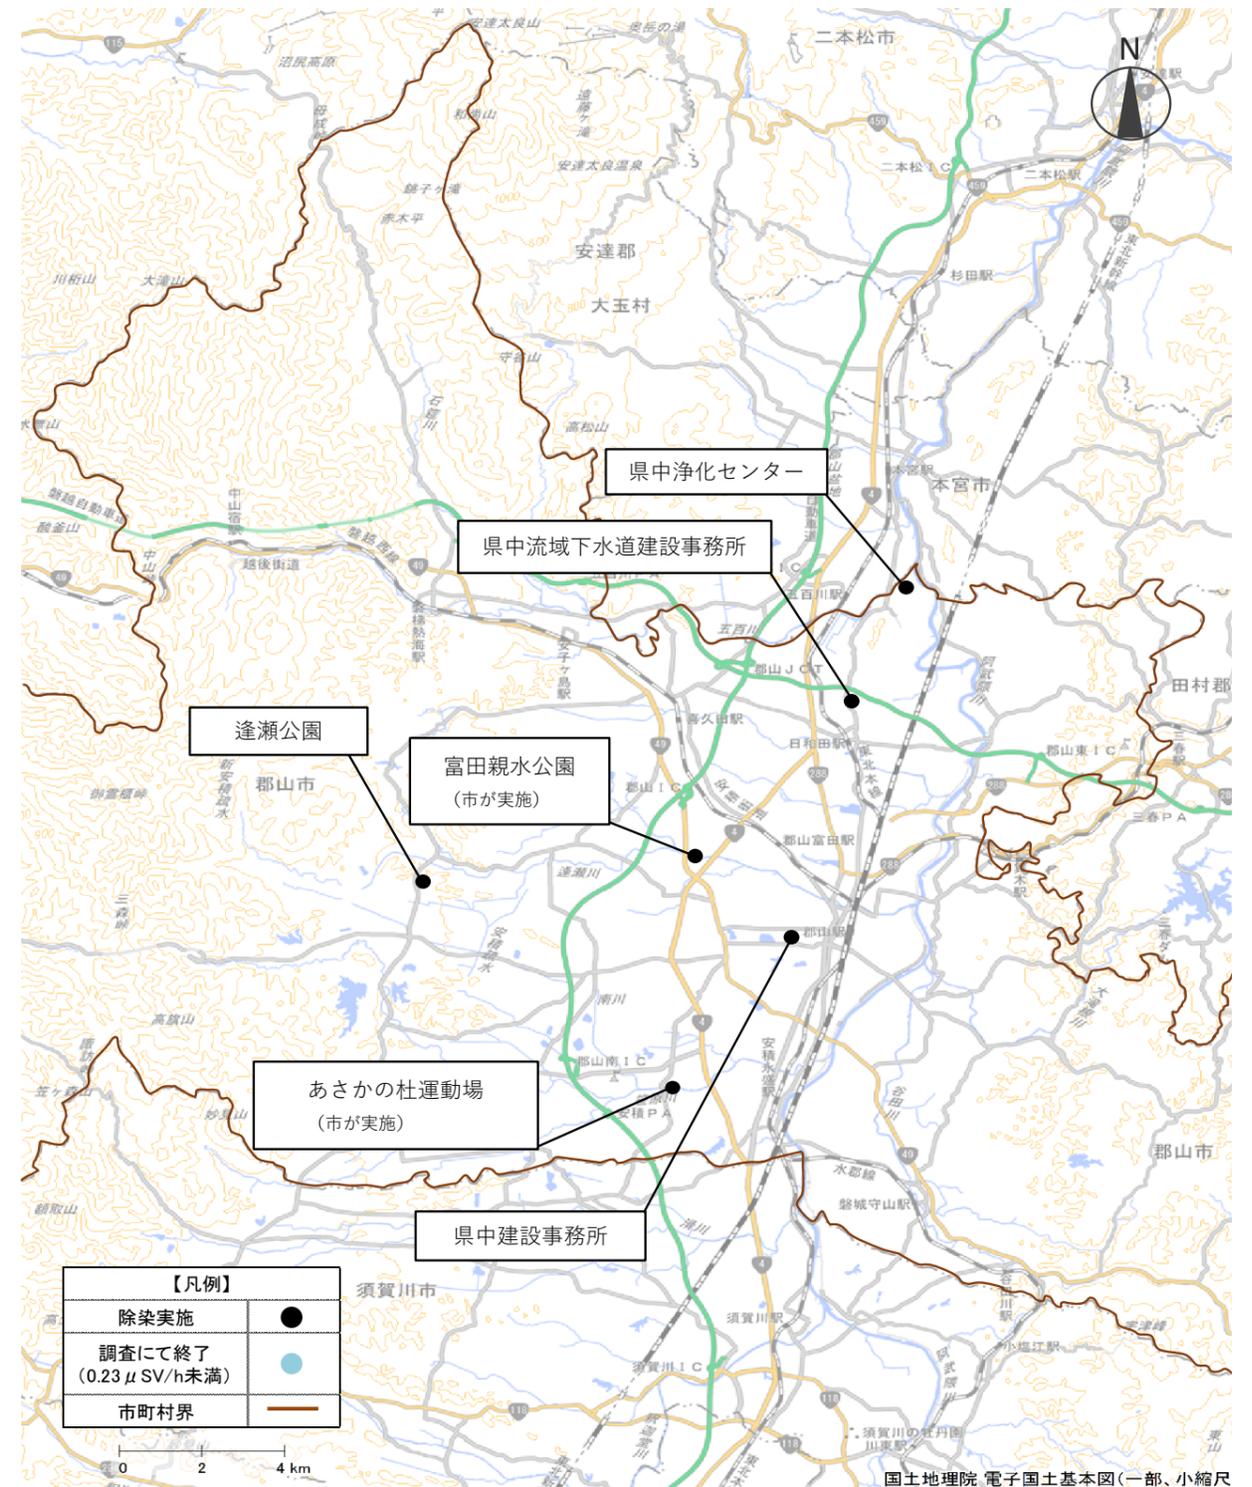

# 郡山市 【県営団地除染】

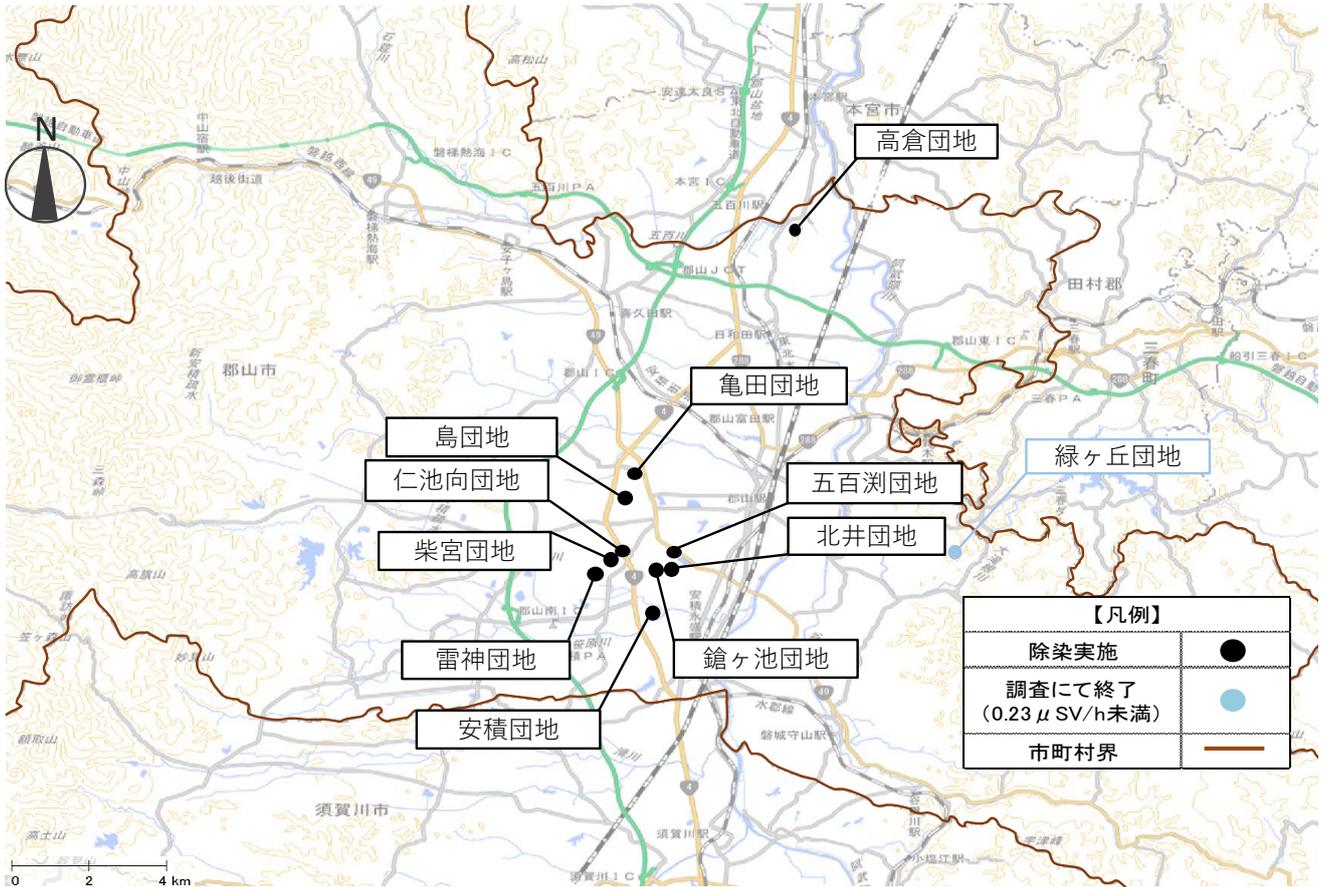

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化( $\mu\text{SV/h}$ )		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	県営住宅柴宮団地 外	2012/10/10	2014/3/28	1.05	0.22	79.0%
②	県営住宅五百淵団地	2012/12/21	2013/6/14	0.75	0.31	58.7%
③	県営住宅高倉団地 外	2013/2/4	2013/7/12	1.00	0.42	58.0%
④	仁池向団地	2014/12/24	2015/4/30	0.35	0.18	48.6%
⑤	島団地 外	2015/9/16	2016/1/29	0.41	0.21	48.8%
⑥	緑ヶ丘団地	2016/2/12	2016/4/28	0.22	モニタリングで終了	

■ 他実施団地（上表路線河川等名の「外」に含まれるもの）

- ⑦ 亀田団地
- ⑧ 北井団地
- ⑨ 安積団地
- ⑩ 鎗ヶ池団地
- ⑪ 雷神団地
- ⑫ 鶴見坦団地


# いわき市 道路除染

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	国道289号外	2017/2/1	2017/6/30	0.44	0.15	65.9%
②	国道399号外	2016/7/21	2017/9/29	0.52	0.38	26.9%
③	いわき浪江線 外	2015/2/20	2017/9/29	0.44	0.12	72.7%
④	折木筒木原久之浜線 外	2015/12/25	2017/3/21	0.25	0.10	60.0%
⑤	上川内川前線 外	2016/7/21	2017/9/29	0.41	0.25	39.0%

■ 他実施路線（上表路線名の「外」に含まれるもの）

- ⑥ 小野富岡線
- ⑦ 小名浜小野線
- ⑧ 吉間田滝根線
- ⑨ 甲塚古墳線
- ⑩ 下高久谷川瀬線
- ⑪ 白岩久ノ浜線
- ⑫ 片倉末続停車場線
- ⑬ 上戸渡広野線
- ⑭ 川前停車場上三坂線
- ⑮ 神俣停車場川前線
- ⑯ 湯の岳別所線
- ⑰ 豊間四倉線
- ⑱ 勿来浅川線
- ⑲ 才鉢前山線

# いわき市 【道路除染】

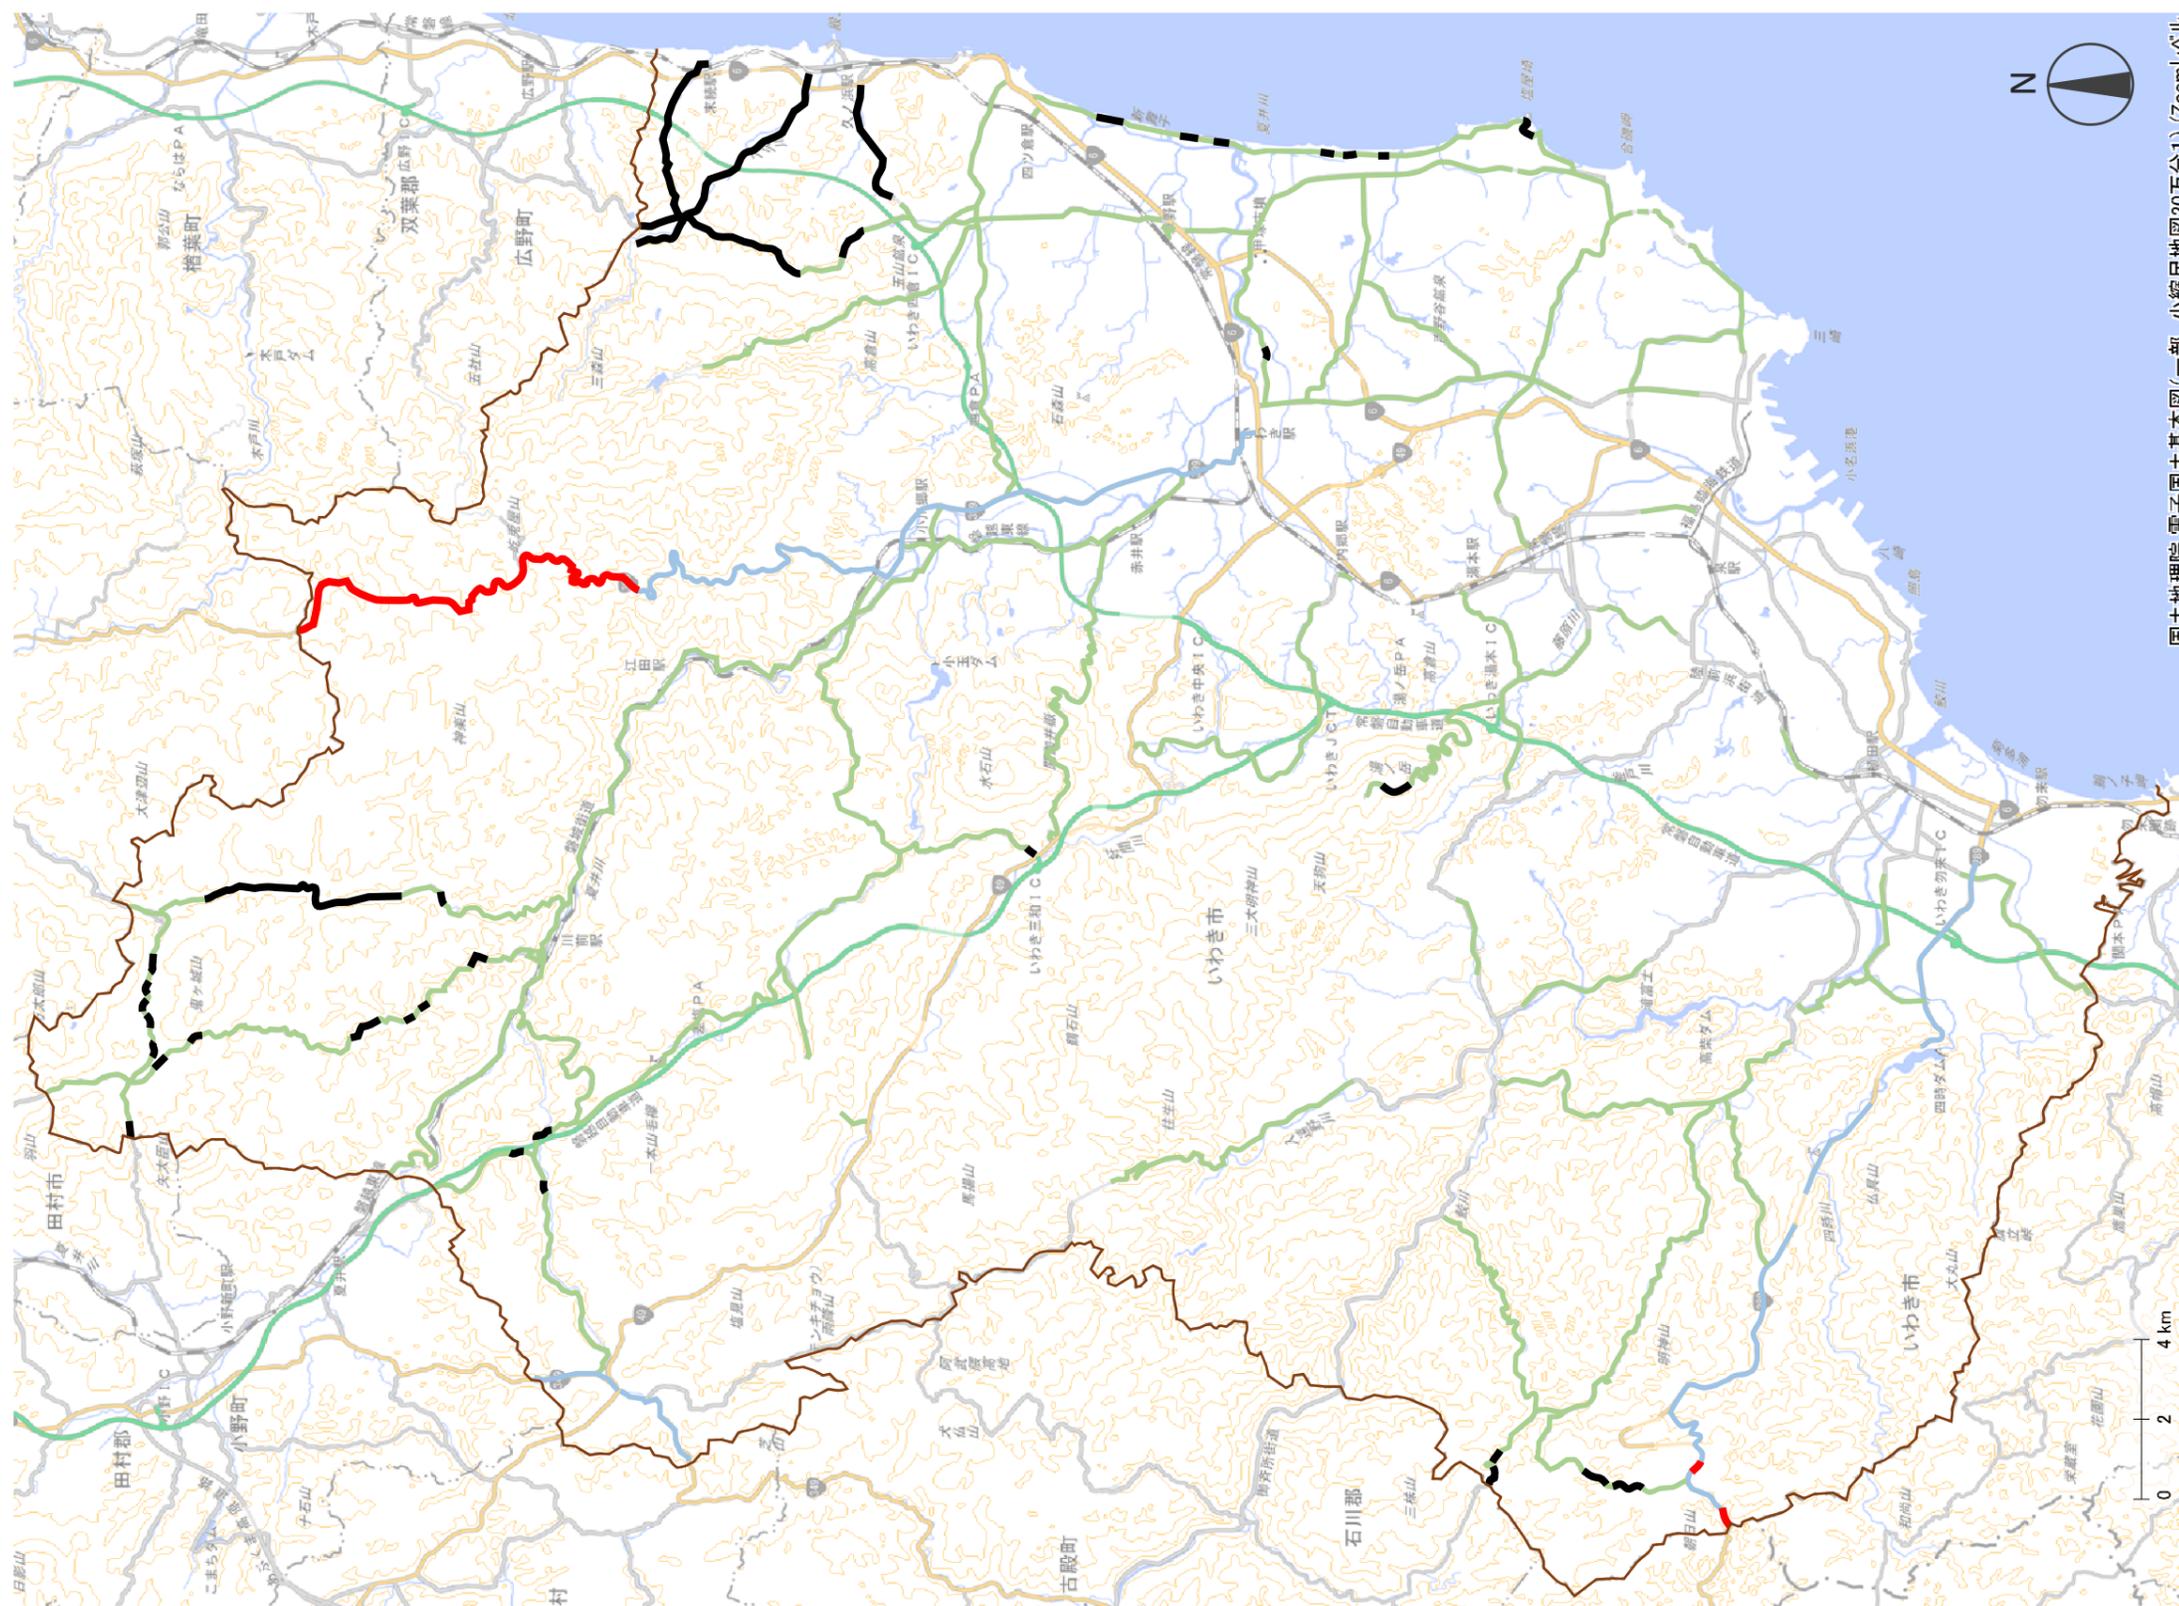

国土地理院 電子国土基本図(一部、小縮尺地図20万分1) (Zoomレベル)

【凡例】		
除染実施	国道	—
	県道	—
調査にて終了 (0.23 μSV/h未満)	国道	—
	県道	—
市町村界		—

# いわき市 【公園・県営団地除染】



## (1) 公園除染

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化( $\mu\text{SV/h}$ )		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	県営いわき公園	2015/2/5	2016/5/31	0.35	0.29	17.1%

## (2) 県営団地除染

No.	路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化( $\mu\text{SV/h}$ )		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	梅ヶ丘団地	2013/11/27	2014/3/27	0.84	0.14	83.3%


# 白河市 道路除染

No.	契約路線河川等名	工期（始）	工期（終）	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	国道289号 外	2016/3/18	2017/2/10	0.29	0.11	62.1%
②	国道294号 外	2013/9/18	2016/3/18	0.66	0.24	63.6%
③	矢吹天栄線 外	2013/2/28	2014/3/31	0.82	0.52	36.6%
④	白坂停車場線	2015/2/6	2015/3/26	0.74	0.19	74.3%

■ 他実施路線（上表路線名の「外」に含まれるもの）

- ⑤ 白河石川線
- ⑥ 白河停車場線
- ⑦ 白河羽鳥線
- ⑧ 伊王野白河線
- ⑨ 母畑白河線
- ⑩ 白坂停車場小田倉線
- ⑪ 久田野停車場線
- ⑫ 南湖公園線
- ⑬ 高萩久田野停車場線
- ⑭ 増見小田倉線
- ⑮ 十日市矢吹線
- ⑯ 白坂関辺線

# 白河市 【道路除染】

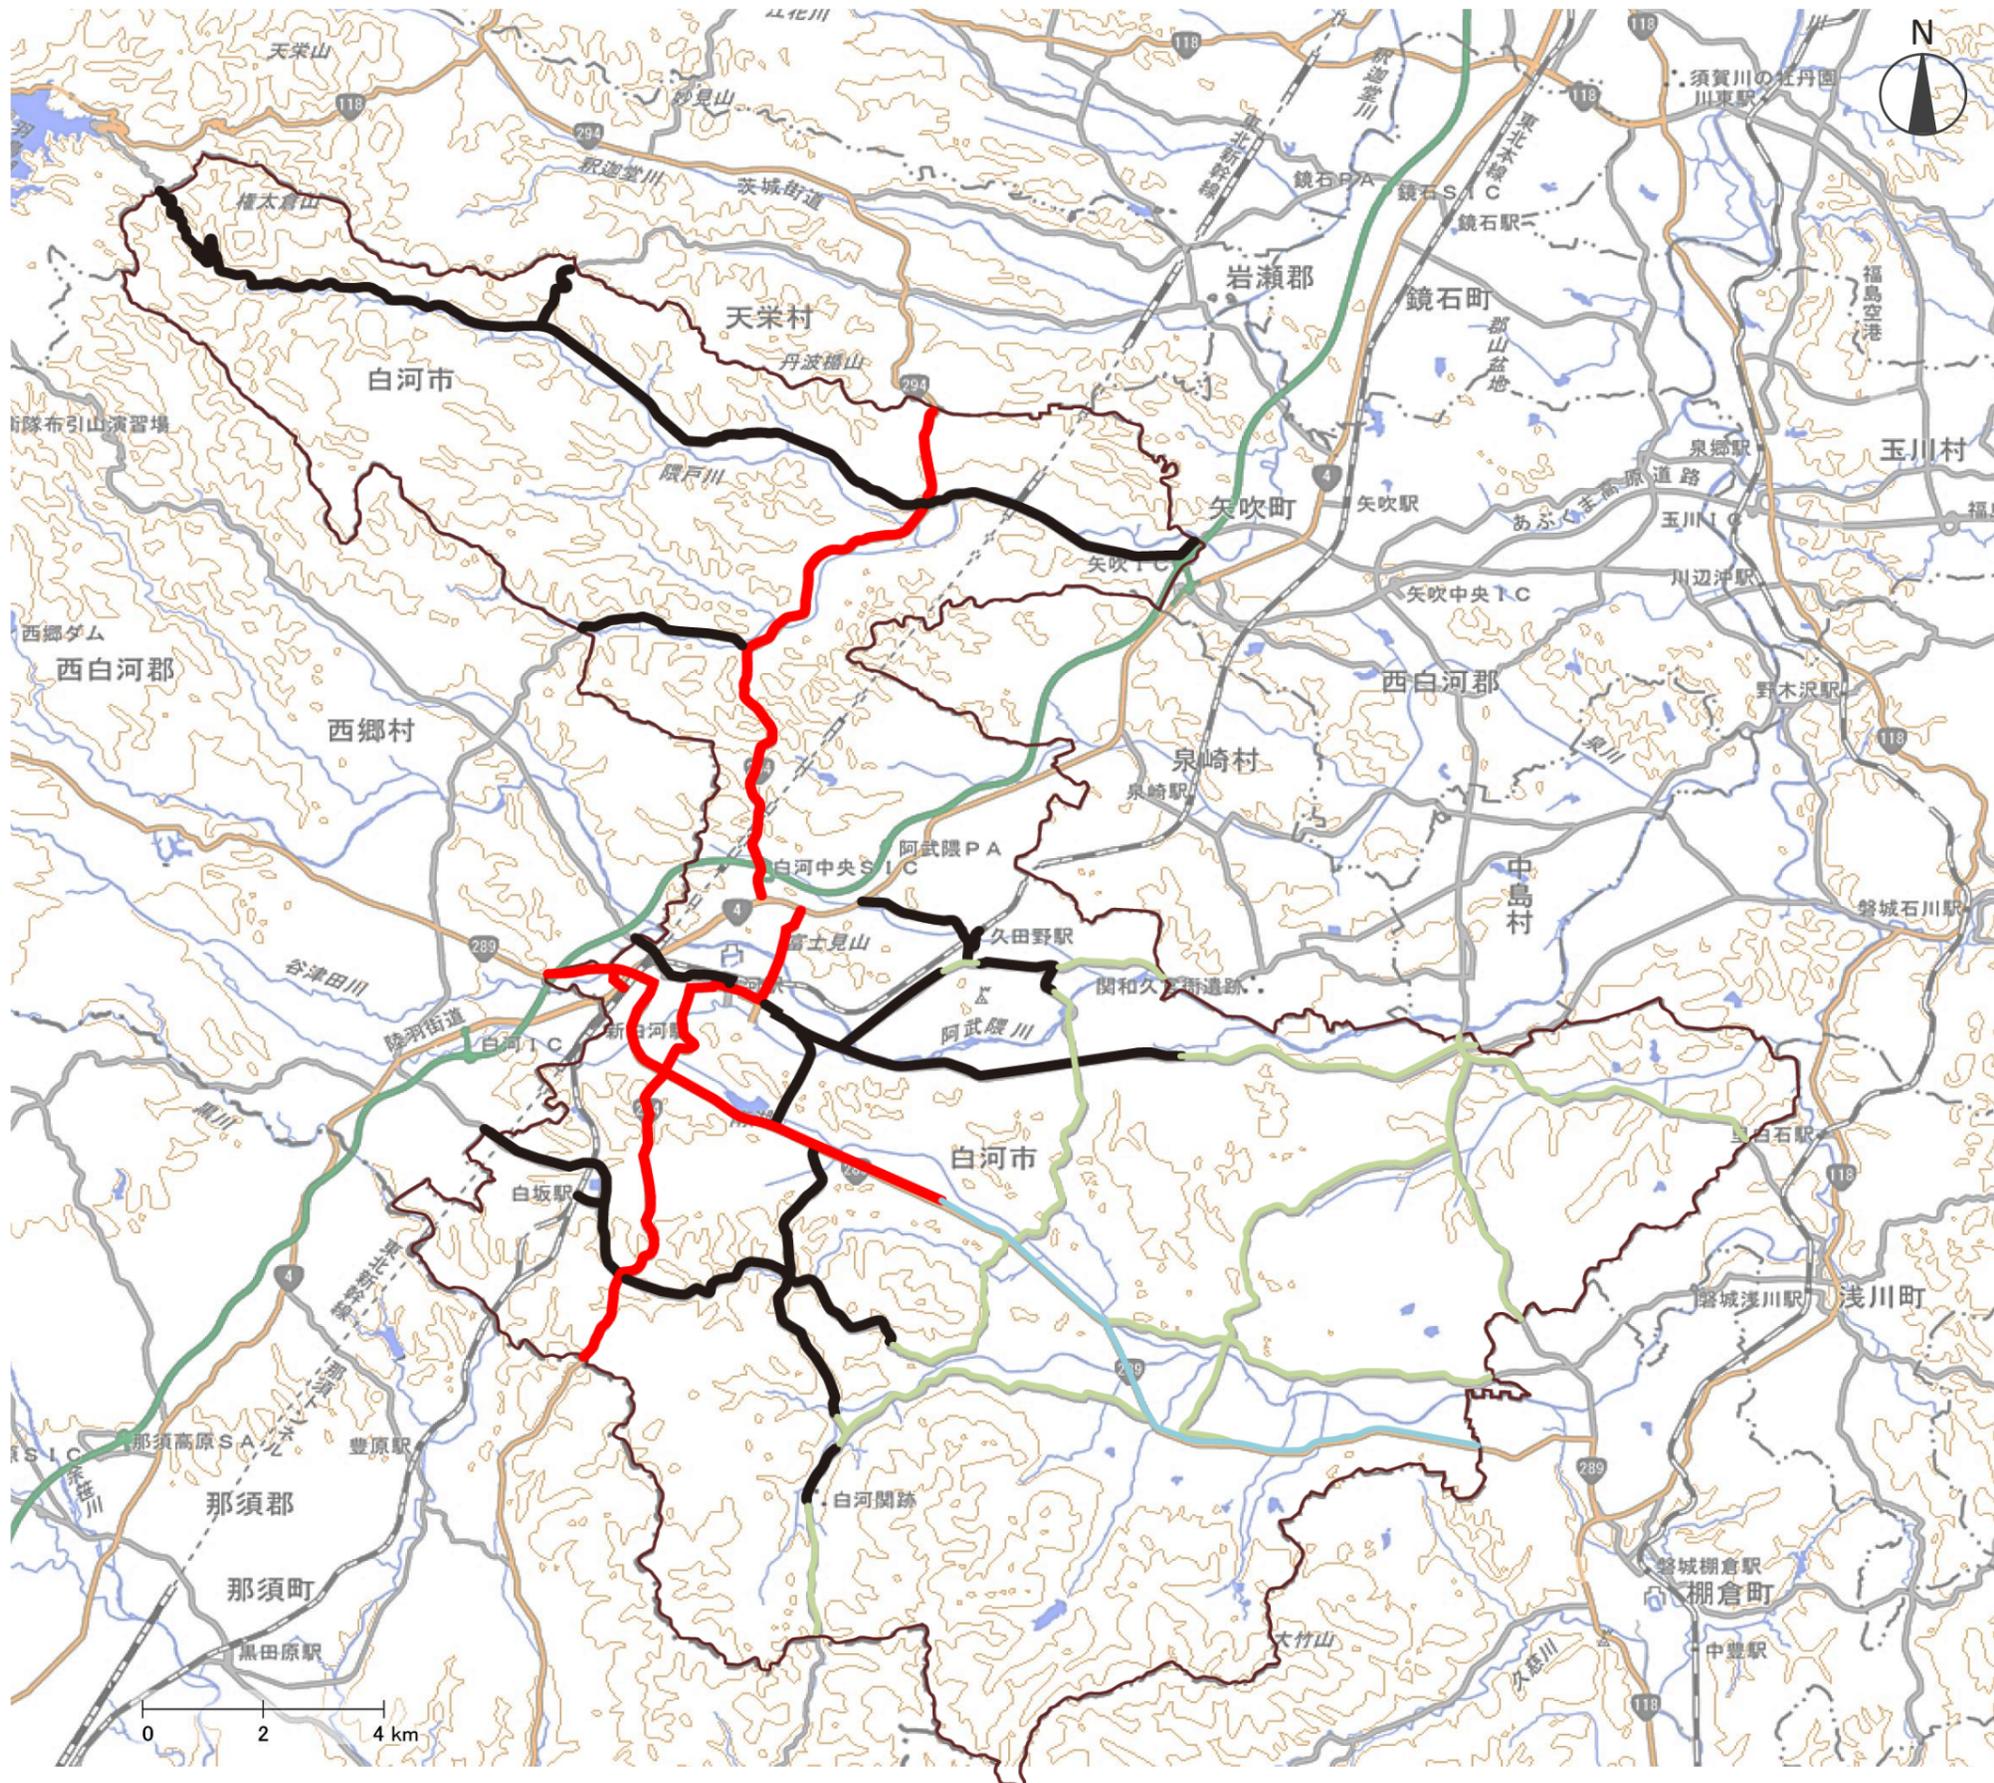

【凡例】		
除染実施	国道	— (Red line)
	県道	— (Black line)
調査にて終了 ( $0.23 \mu\text{SV/h}$ 未満)	国道	— (Blue line)
	県道	— (Green line)
市町村界		— (Brown line)

# 白河市 【河川・県営団地除染】

## (1) 河川除染

No.	路線河川等名	工期(始)	工期(終)
①	いこいの河畔	H27年度	
②	こみね・あぶくま公園	H27年度	
③	かしま・あぶくま公園	H27年度	
④	阿武隈川筋	H28年度	
⑤	堀川筋	H28年度	

■ 他実施河川

⑥ ときなん淵(市が実施)

## (2) 県営団地除染


No.	契約路線河川等名	工期(始)	工期(終)	除染による空間線量の変化( $\mu\text{SV/h}$ )		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	松風の里団地 外	2013/6/24	2014/3/20	0.29	0.18	37.9%
②	真舟団地 外	2013/9/30	2014/3/20	0.44	0.21	52.3%


■ 他実施団地(上表路線河川等名の「外」に含まれるもの)

③ 関川窪団地

④ 金勝寺団地

⑤ 白梅が郷団地

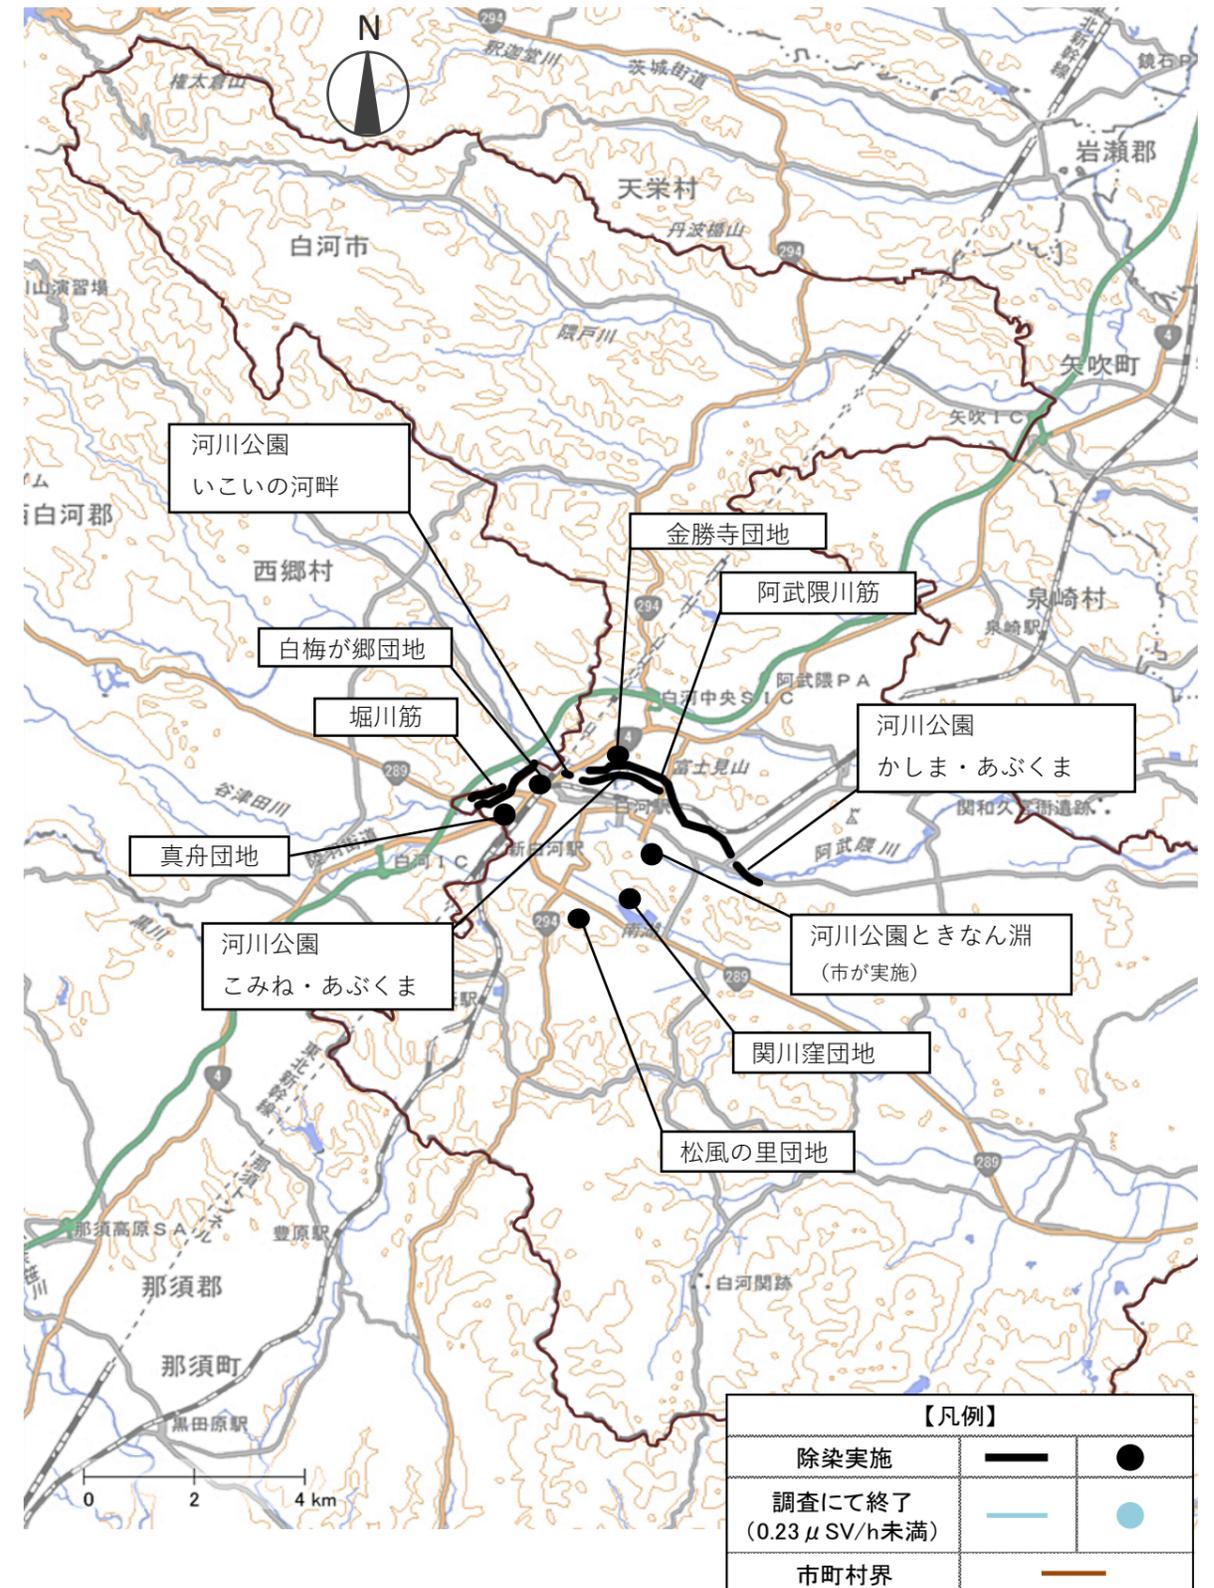

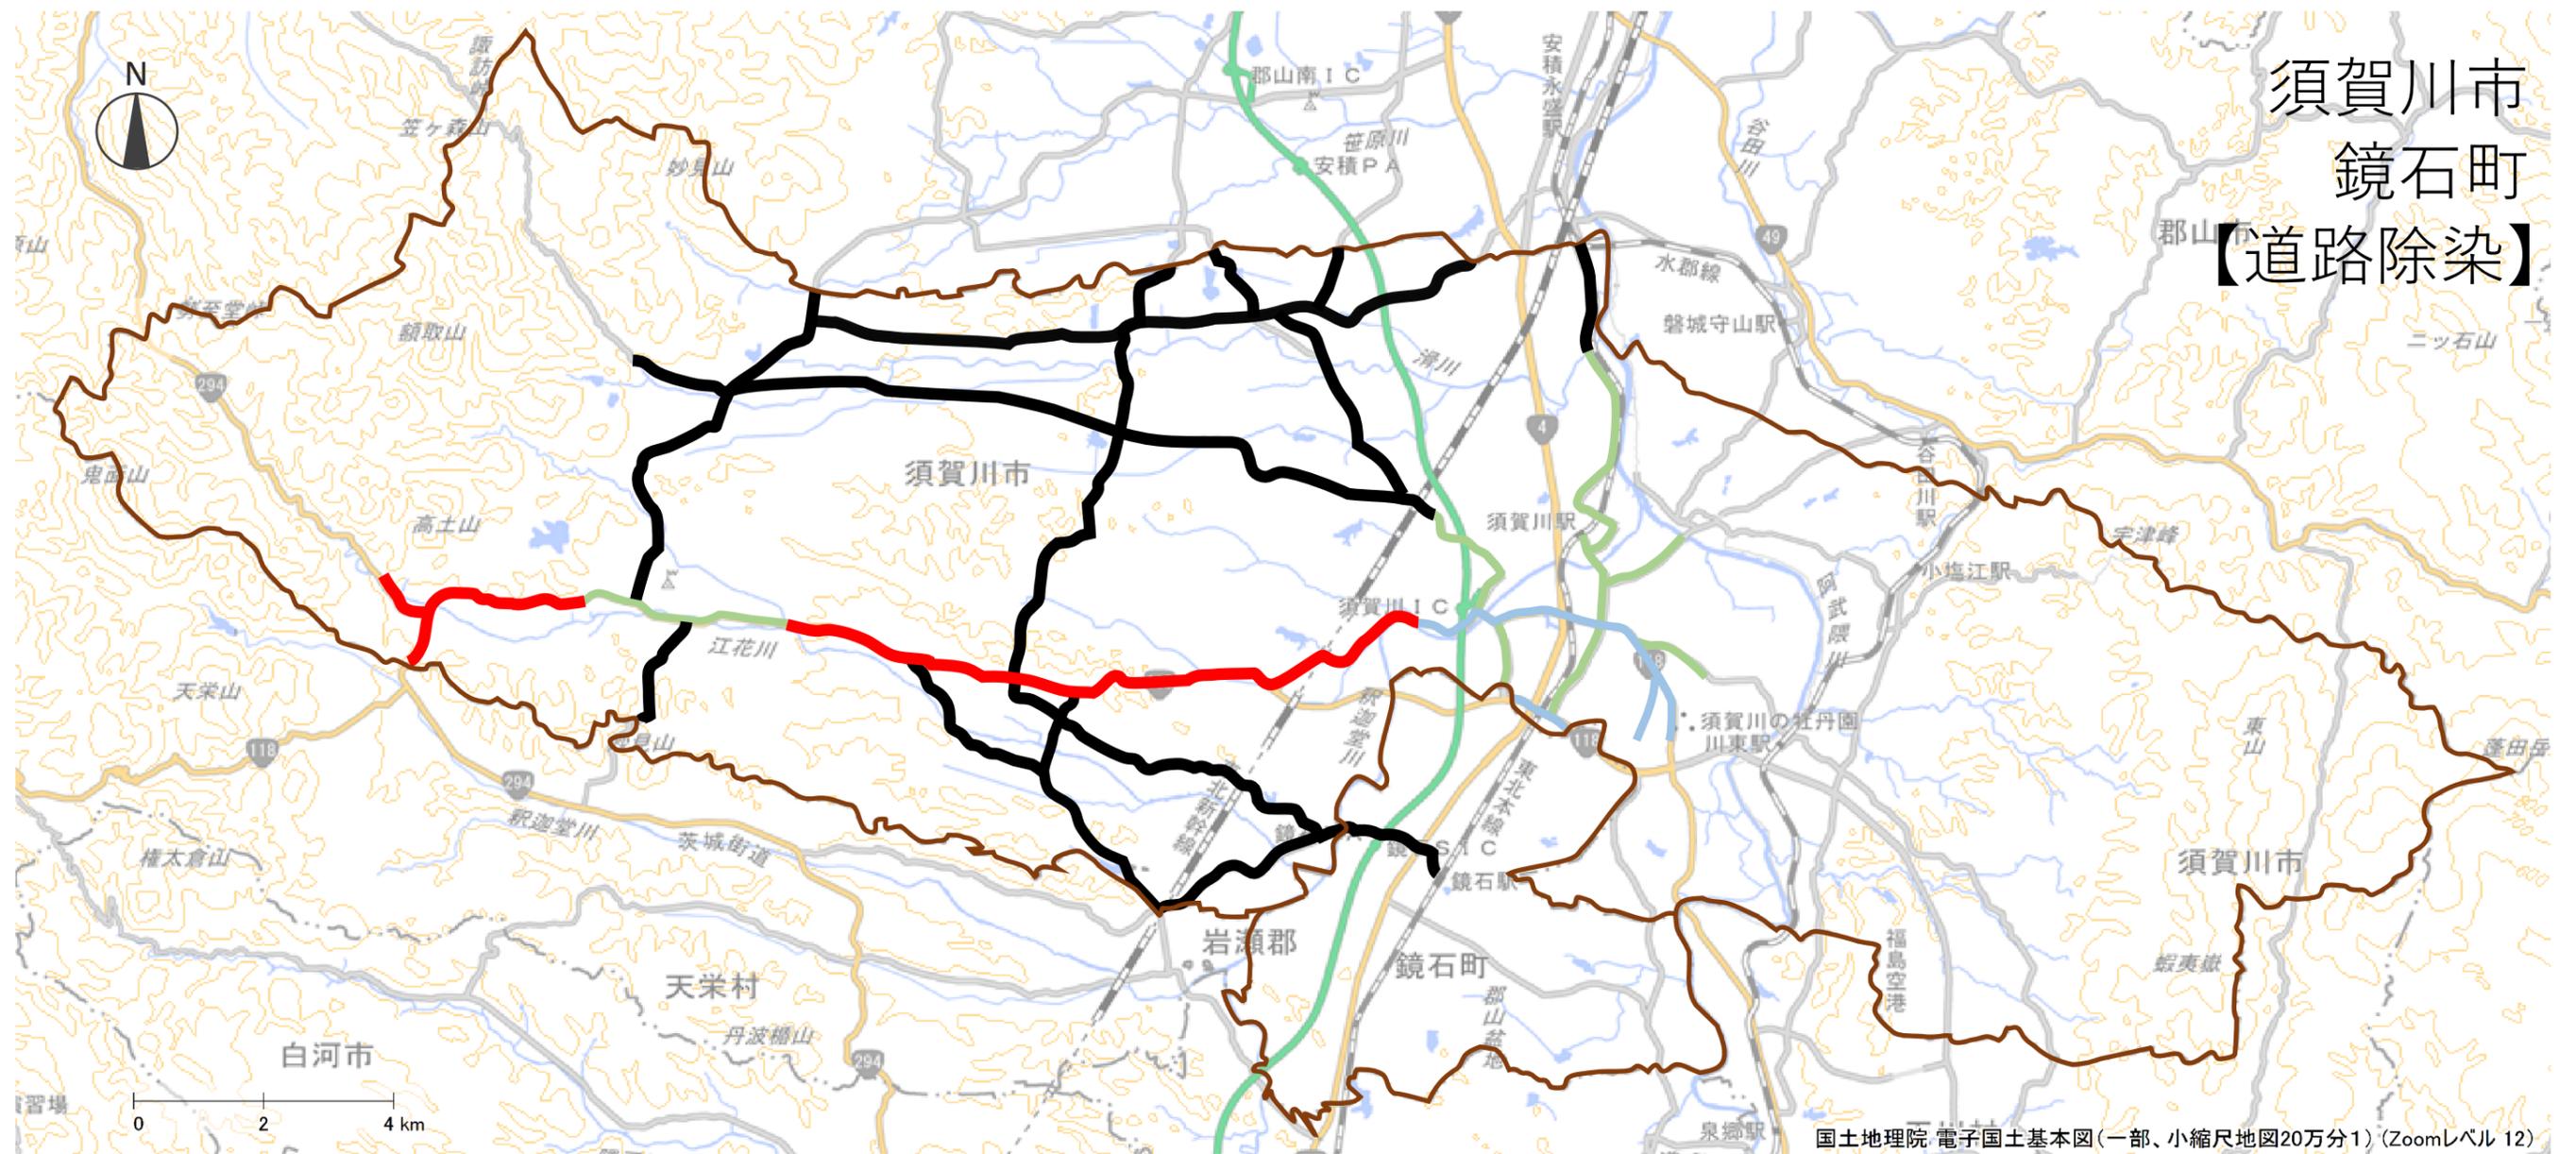

No.	市町村	契約路線河川等名	工期(始)	工期(終)	除染による空間線量の変化( $\mu\text{SV/h}$ )		
					作業前に最高地点だった箇所		
					作業前	作業後	低減率
①	須賀川市	国道118号 外	2013/9/27	2017/1/31	1.37	0.12	91.2%
②	須賀川市	中野須賀川線 外	2016/1/15	2017/3/31	0.63	0.06	90.5%
③	須賀川市	安積長沼線 外	2013/9/27	2014/8/29	0.40	0.27	32.5%
④	須賀川市	木ノ崎岩淵線 外	2016/1/19	2017/3/31	1.02	0.09	91.2%
⑤	鏡石町	下松本鏡石停車場線 外	2015/10/23	2016/3/11	1.24	0.08	93.5%

■ 他実施路線 (左表路線名の「外」に含まれるもの)

- ⑤ 須賀川市：国道294号
- ⑥ 須賀川市：長沼喜久田線
- ⑦ 須賀川市：郡山矢吹線
- ⑧ 須賀川市：矢吹堀込線
- ⑨ 須賀川市：仁井田郡山線
- ⑩ 須賀川市：下松本鏡石停車場線
- ⑪ 須賀川市：牧ノ内長沼線
- ⑫ 須賀川市：三穂田須賀川線
- ⑬ 須賀川市：須賀川二本松線

【凡例】		
除染実施	国道	<span style="color: red;">—</span>
	県道	<span style="color: black;">—</span>
調査にて終了 ( $0.23 \mu\text{SV/h}$ 未満)	国道	<span style="color: lightblue;">—</span>
	県道	<span style="color: lightgreen;">—</span>
市町村界		<span style="color: brown;">—</span>

# 須賀川市

## 【公園・県営団地除染】



### (1) 公園除染

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)
①	福島空港公園	平成26年度	


### (2) 県営団地除染

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化(μSV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	芦田塚団地外	2016/12/7	2017/3/21	0.17	モニタリングで終了	

■ 他実施団地（上表路線河川等名の「外」に含まれるもの）

- ② 緑町団地
- ③ 桜岡団地

【道路・県営団地除染】

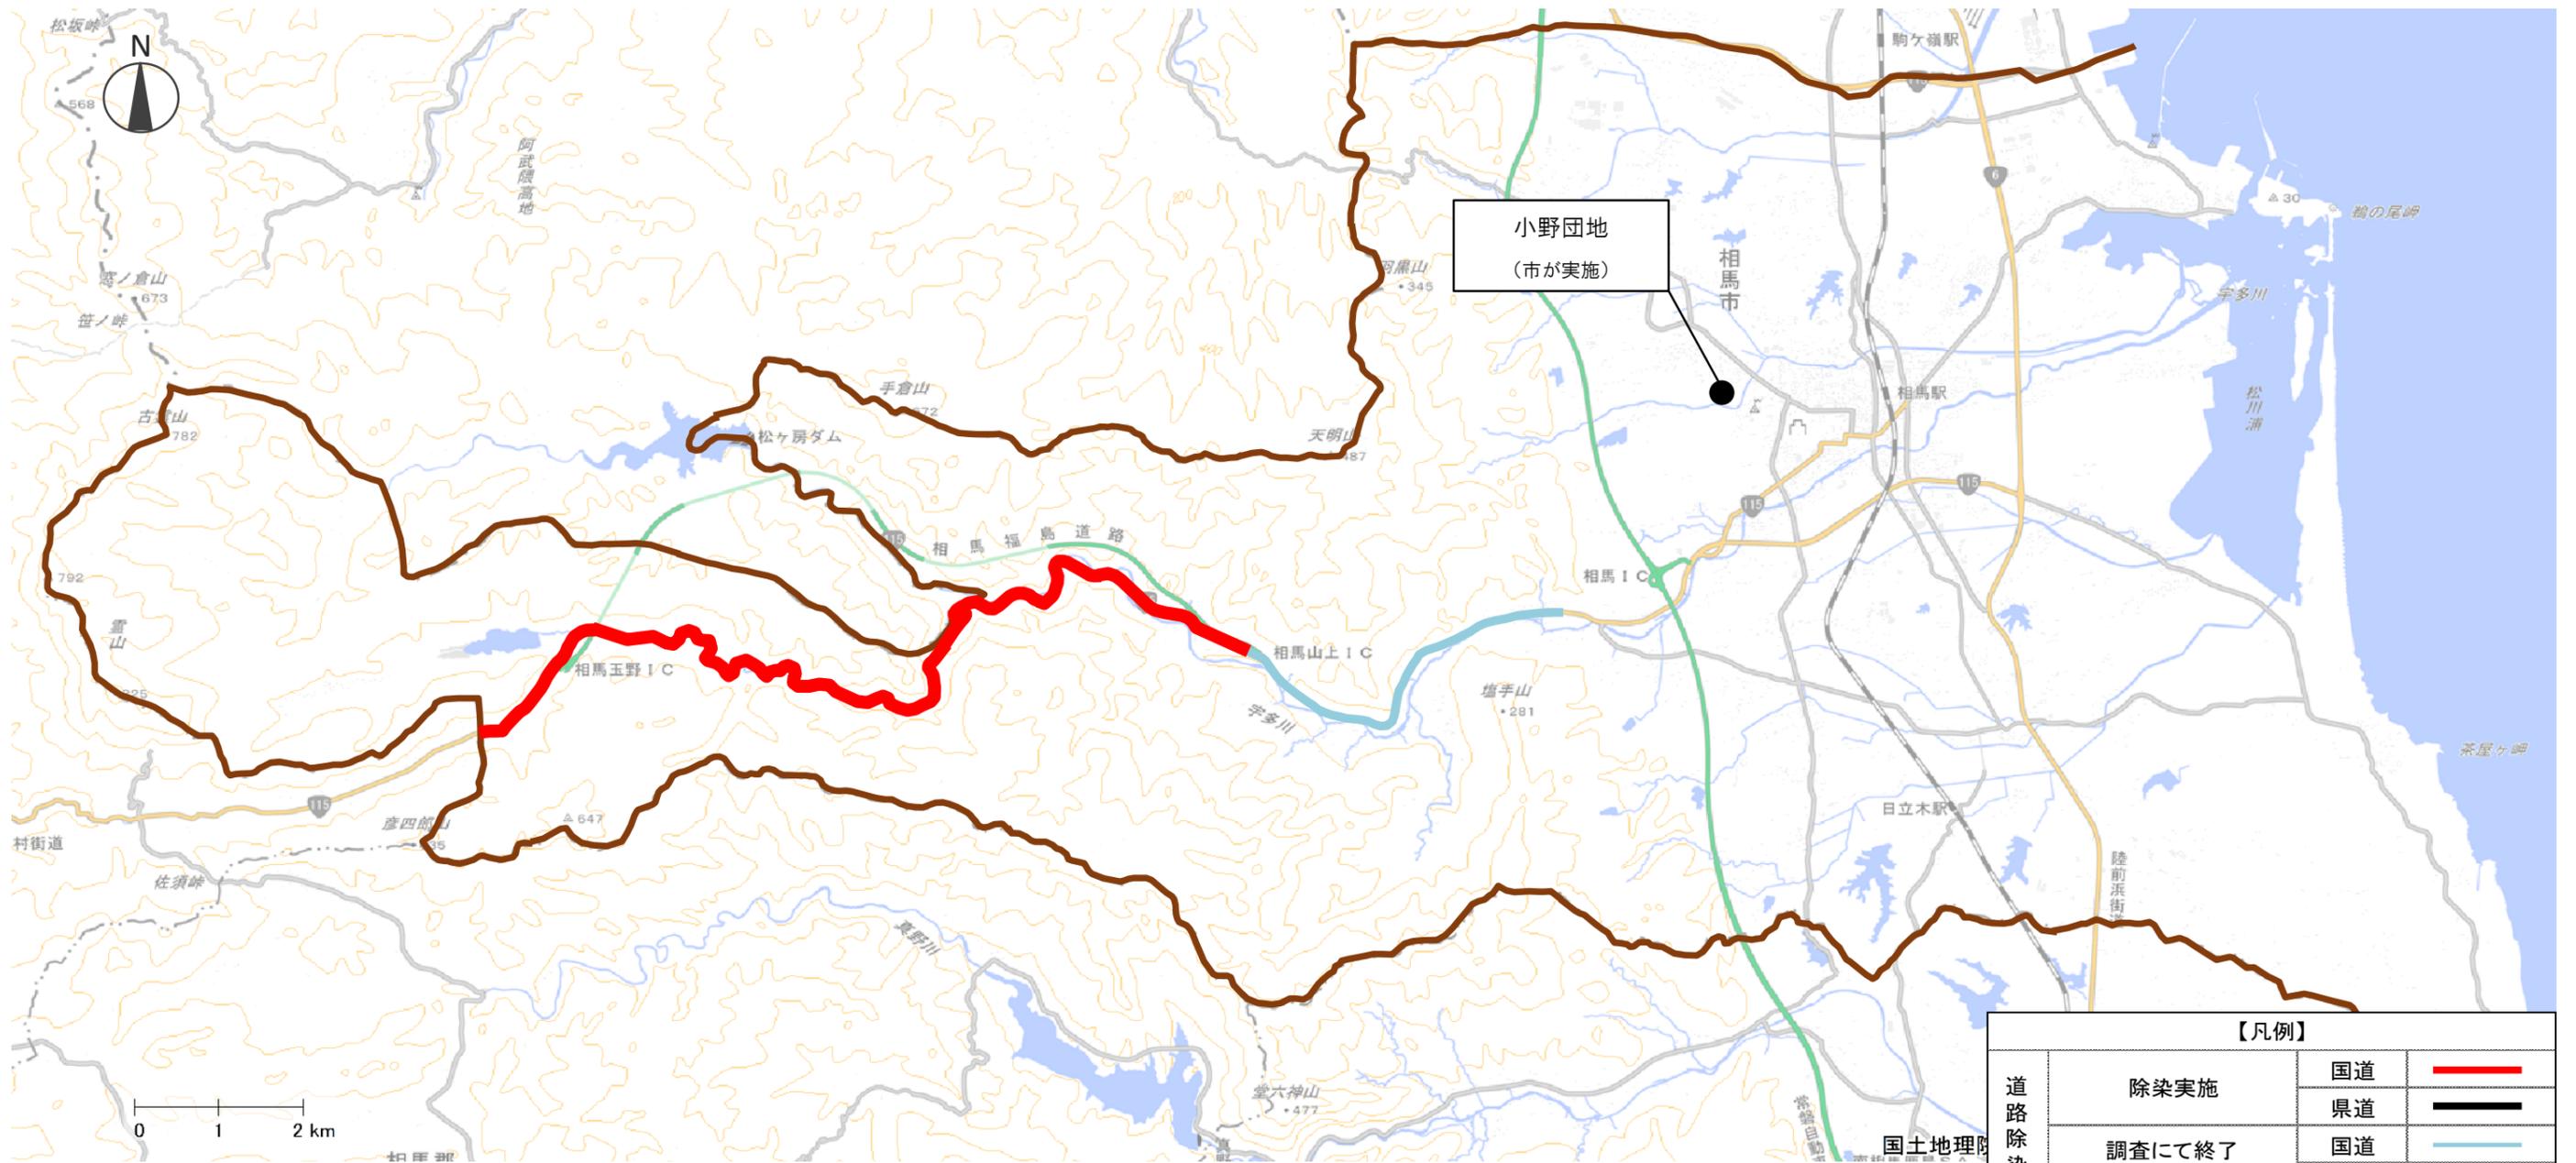

(1) 道路除染

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化(μSV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	国道115号	2013/10/28	2016/10/31	1.75	0.21	88.0%

(2) 県営団地除染

- ① 小野団地 (市が実施)


## 二本松市 道路除染

No.	契約路線河川等名	工期（始）	工期（終）	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	国道349号 外	2012/12/3	2013/9/30	1.09	0.75	30.9%
②	国道459号 外	2012/12/3	2018/1/31	1.31	0.34	74.0%
③	原町二本松線 外	2012/7/4	2012/12/28	1.79	0.73	59.2%
④	二本松安達線 外	2012/12/3	2013/11/29	0.89	0.40	55.1%
⑤	須賀川二本松線	2013/1/7	2013/10/31	1.12	0.87	22.3%
⑥	飯野三春石川線 外	2013/1/17	2014/3/19	1.51	0.60	60.5%
⑦	川俣安達線 外	2013/2/25	2013/11/29	1.63	0.62	62.0%
⑨	安達太良山線 外	2014/7/16	2015/3/6	0.32	0.22	30.2%
⑩	馬場平杉田線	2014/12/8	2016/3/28	0.57	0.23	59.6%

### ■ 他実施路線（上表路線名の「外」に含まれるもの）


- ⑪ 本宮土湯温泉線
- ⑫ 二本松金屋線
- ⑬ 福島安達線
- ⑭ 二本松三春線
- ⑮ 二本松川俣線
- ⑯ 本宮岩代線
- ⑰ 松川渋川線
- ⑱ 二本松停車場線
- ⑲ 安達停車場線
- ⑳ 石沢荻田線
- ㉑ 木幡飯野線
- ㉒ 岳温泉線

# 二本松市 【道路除染】

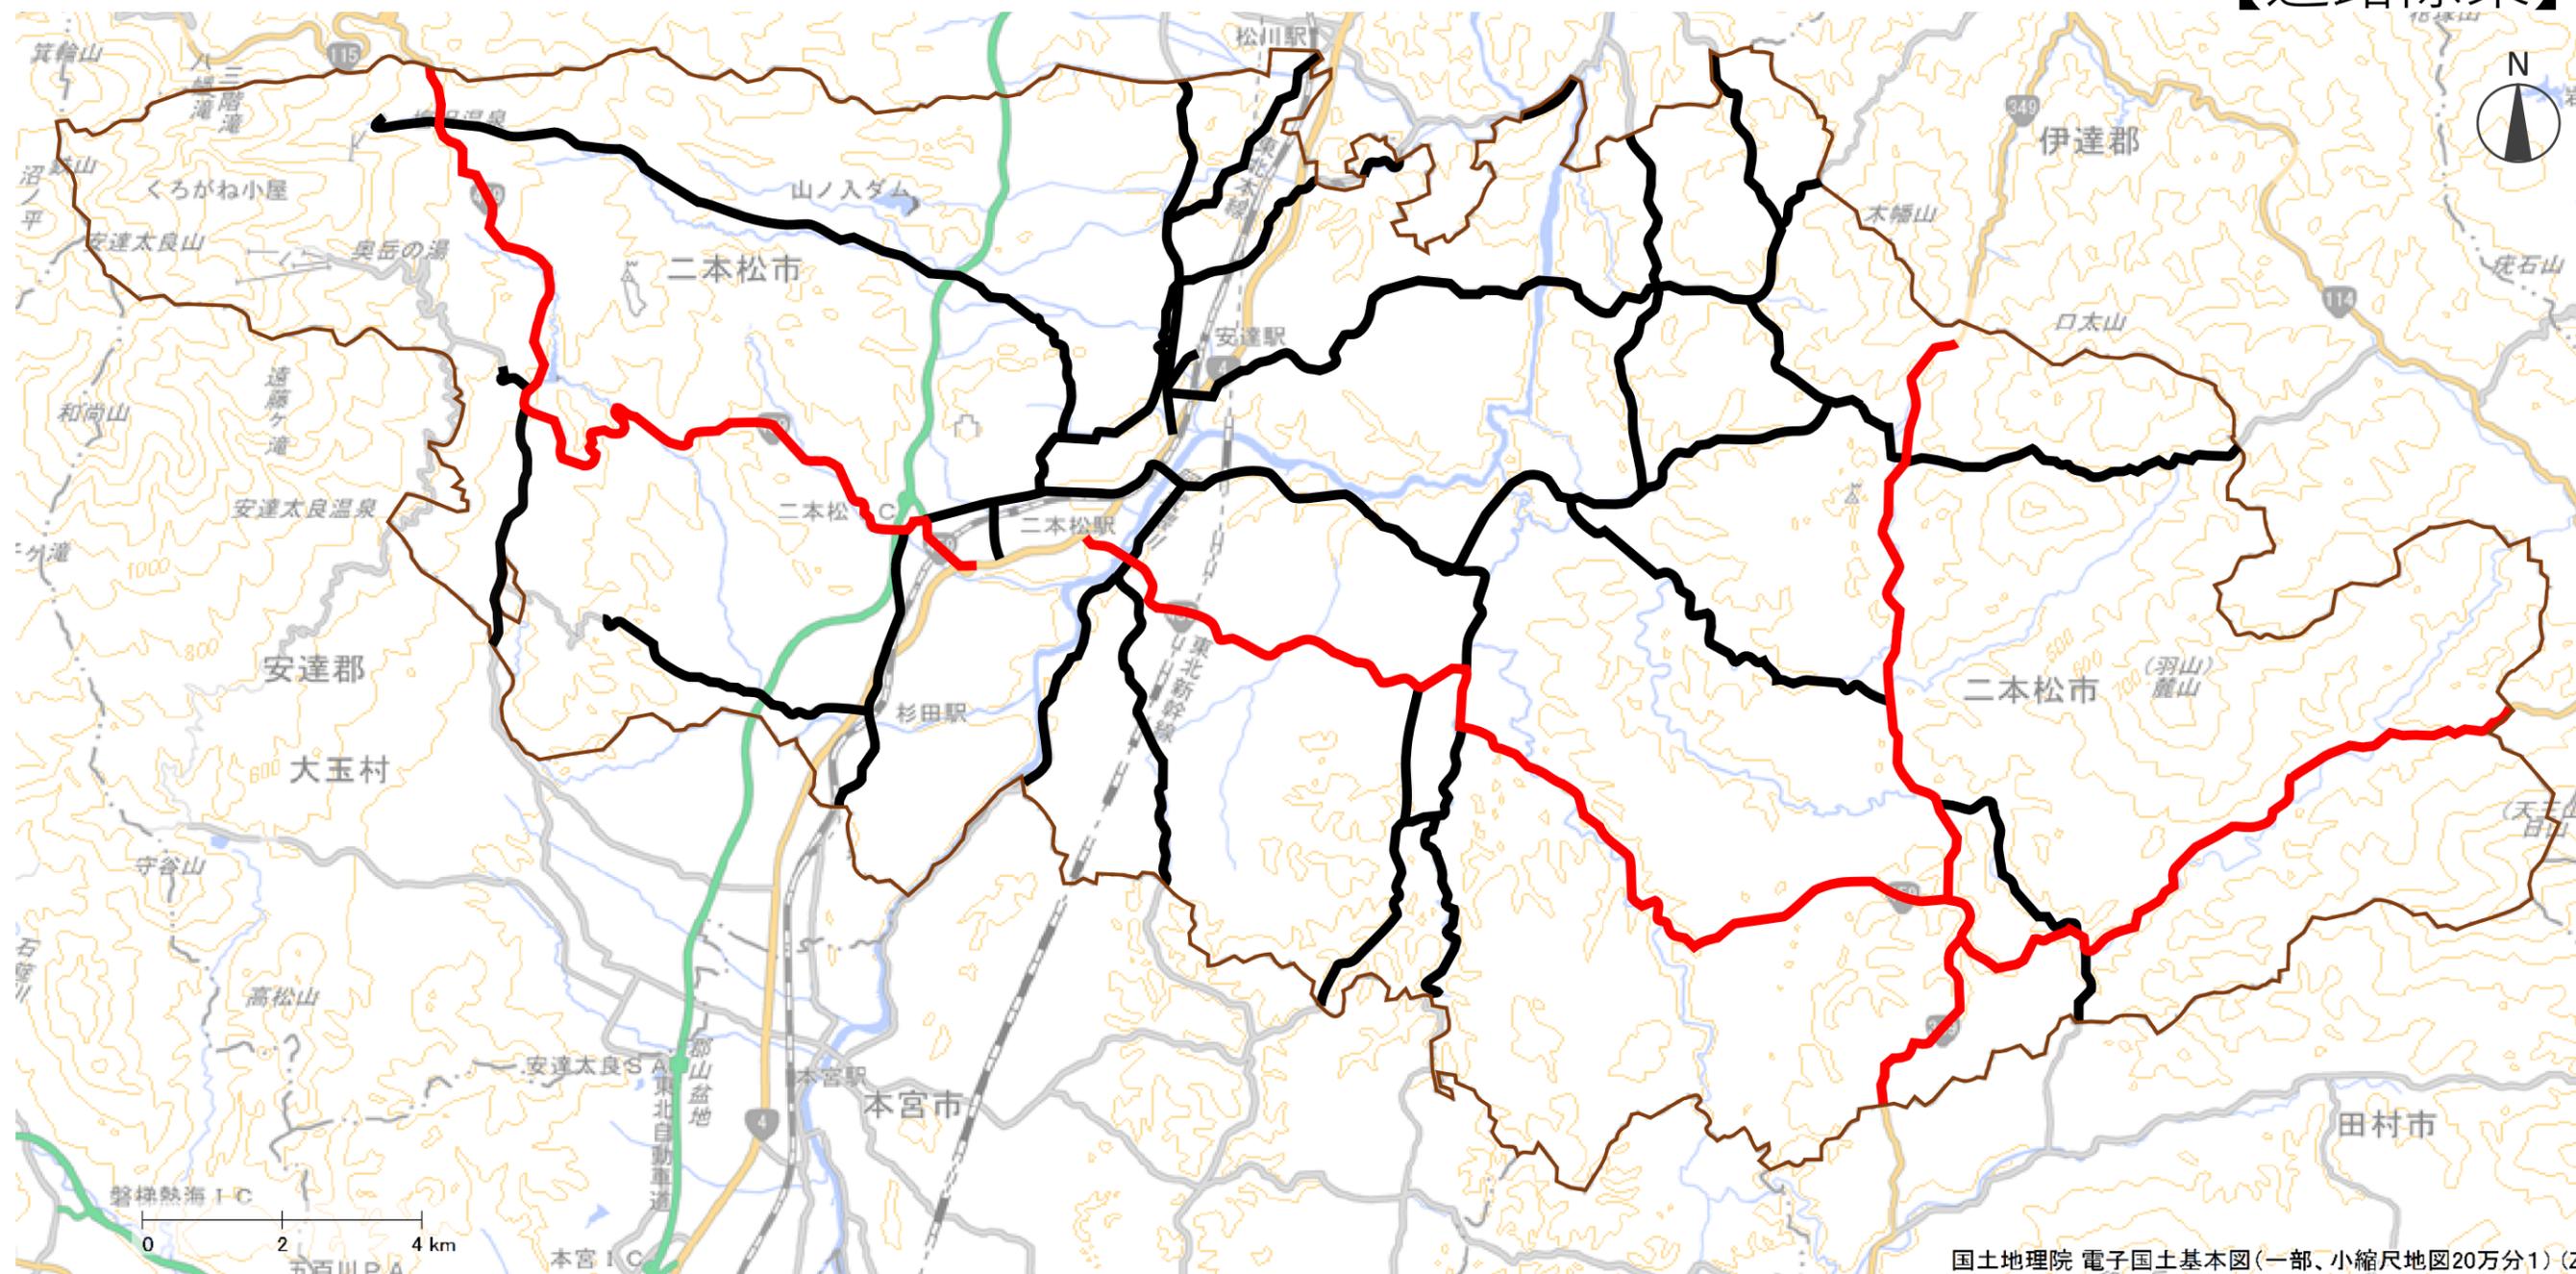

【凡例】		
除染実施	国道	
	県道	
調査にて終了 (0.23 μSV/h未満)	国道	
	県道	
市町村界		

# 二本松市 【河川除染・下水道除染】

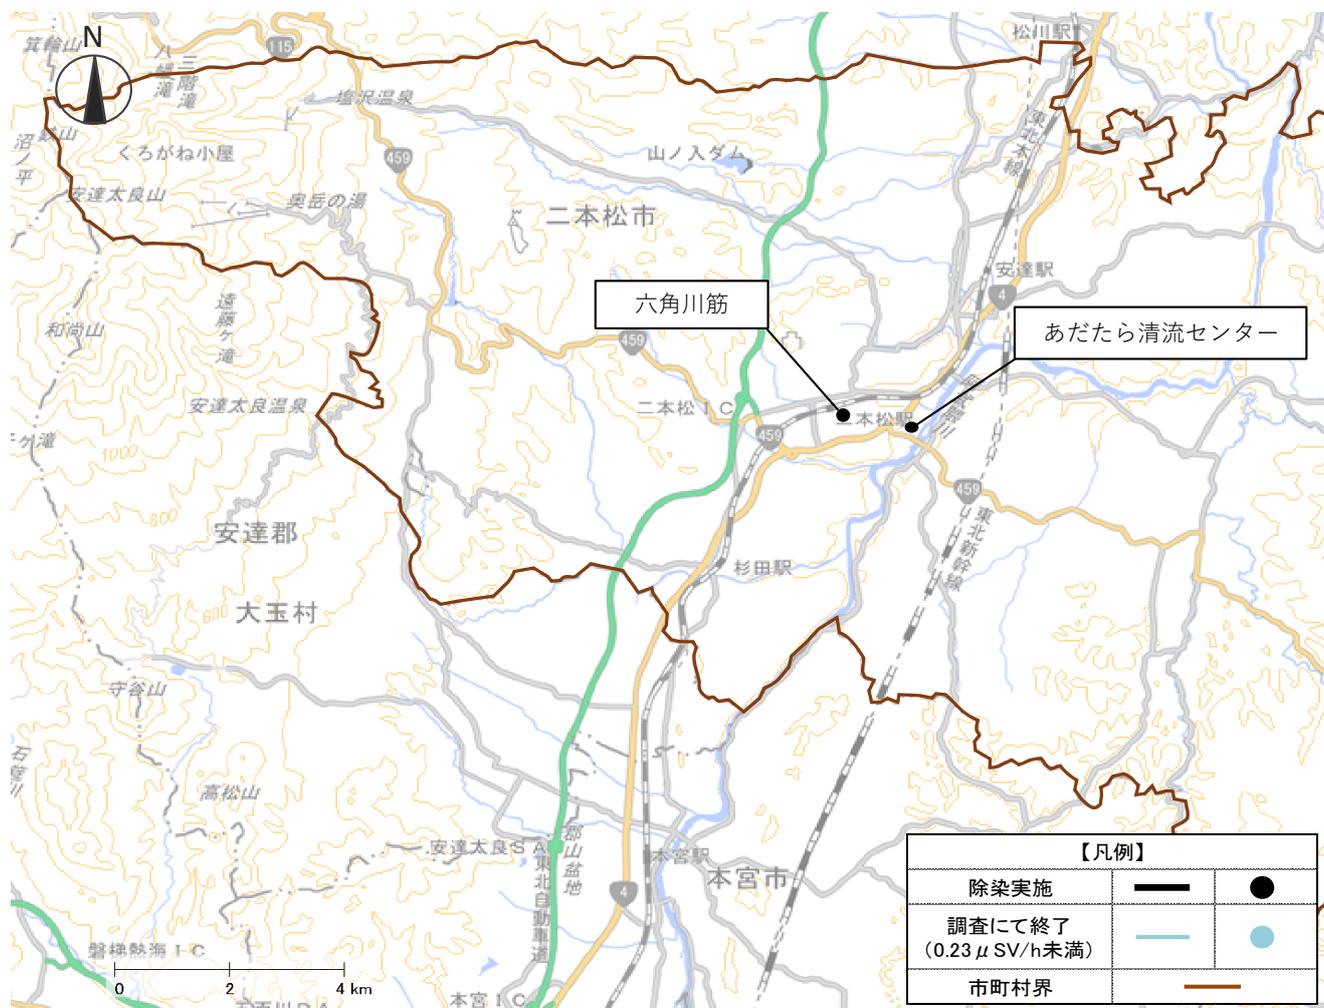


## (1) 河川除染

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化( $\mu\text{SV/h}$ )		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	六角川筋	2017/1/5	2017/10/29	0.78	0.27	65.4%

## (2) 下水道除染

No.	路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化( $\mu\text{SV/h}$ )		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	あだたら清流センター	2014/7/18	2016/1/4	1.93	0.47	75.6%

# 田村市 【道路除染】

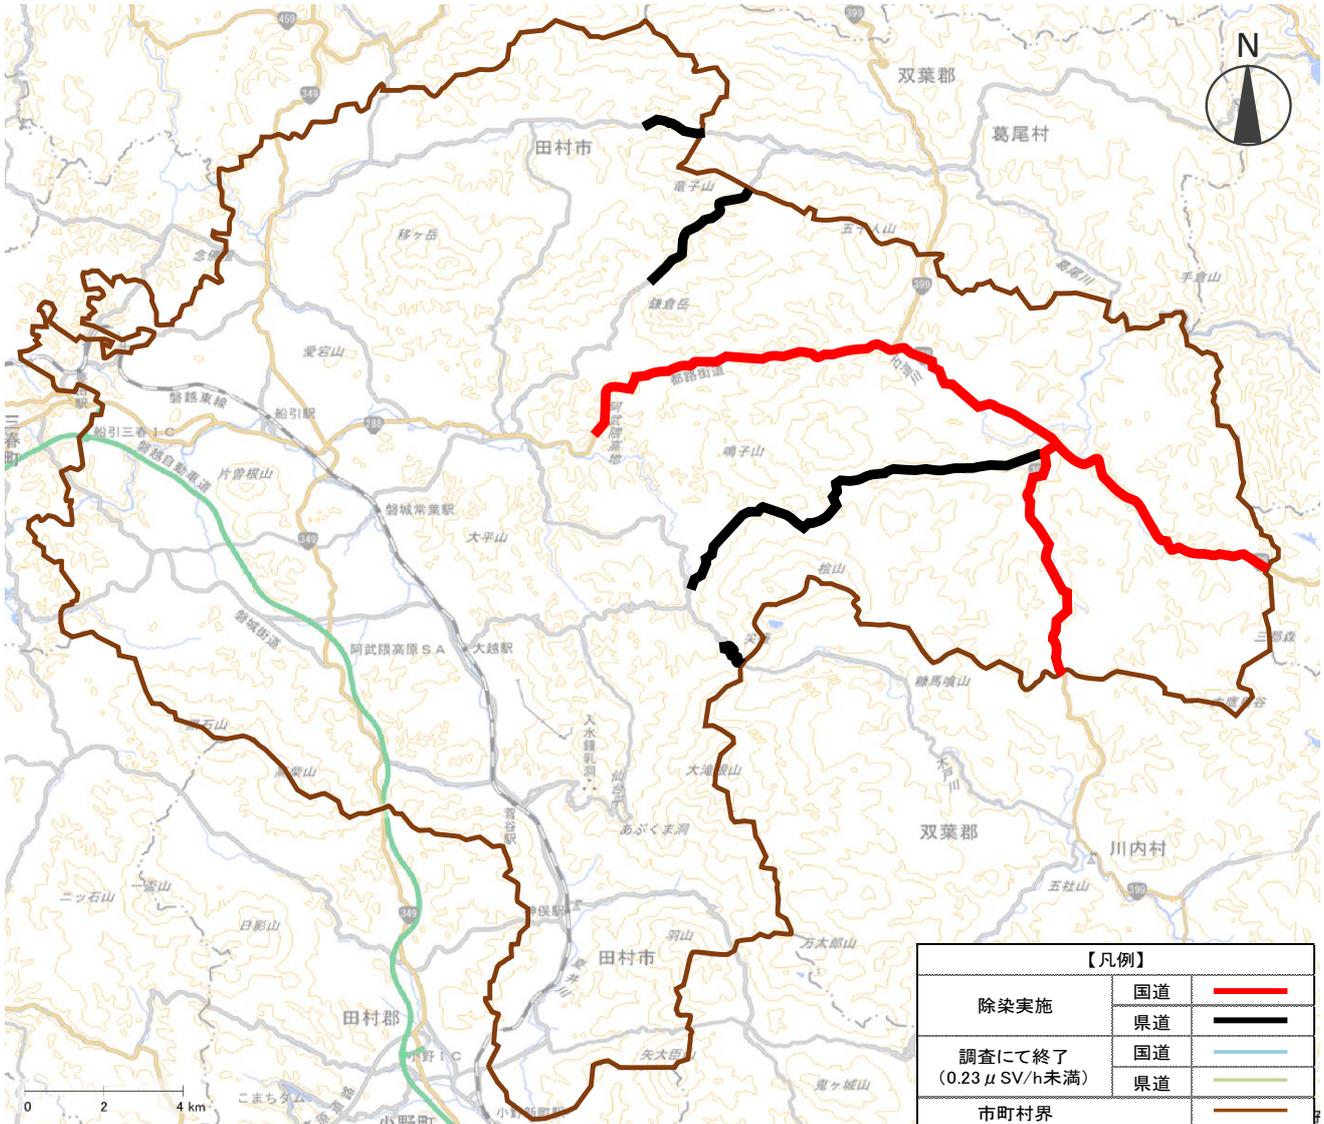

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	国道288号外	2013/11/18	2015/3/31	1.32	1.09	17.4%


■ 他実施路線 (上表路線名の「外」に含まれるもの)

- ② 国道399号
- ③ 浪江三春線
- ④ 富岡大越線
- ⑤ 常葉野川線
- ⑥ あぶくま洞都路線


No.	契約路線河川等名	工期（始）	工期（終）	除染による空間線量の変化( $\mu\text{SV/h}$ )		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	原町二本松線外	2012/12/25	2013/6/28	18.60	3.16	83.0%
②	大芦鹿島線	2013/2/12	2013/8/30	11.30	1.04	90.8%
③	原町川俣線	2013/8/16	2013/12/27	16.00	1.33	91.7%
④	相馬浪江線外	2013/11/20	2017/3/31	11.50	1.96	83.0%
⑤	草野大倉鹿島線	2013/11/20	2014/3/25	5.05	0.37	92.7%
⑥	馬場太田線外	2014/9/29	2015/1/30	2.11	1.27	39.8%
⑦	浪江鹿島線 外	2015/1/26	2015/9/30	0.32	0.11	65.6%
⑨	小浜字町線 外	2015/10/19	2016/3/31	0.34	0.17	50.0%
⑩	原町海老相馬線 外	2016/6/30	2017/3/31	0.95	0.14	85.3%
⑪	北泉小高線 外	2016/6/30	2017/3/31	0.52	0.05	90.4%

■ 他実施路線（上表路線名の「外」に含まれるもの）

- ⑫ 原町浪江線
- ⑬ 鹿島日下石線
- ⑭ 磐城太田停車場線
- ⑮ 鹿島停車場線
- ⑯ 大甕磐城太田停車場線
- ⑰ 下波佐南新田線
- ⑱ 烏崎江垂線
- ⑲ 南海老鹿島線

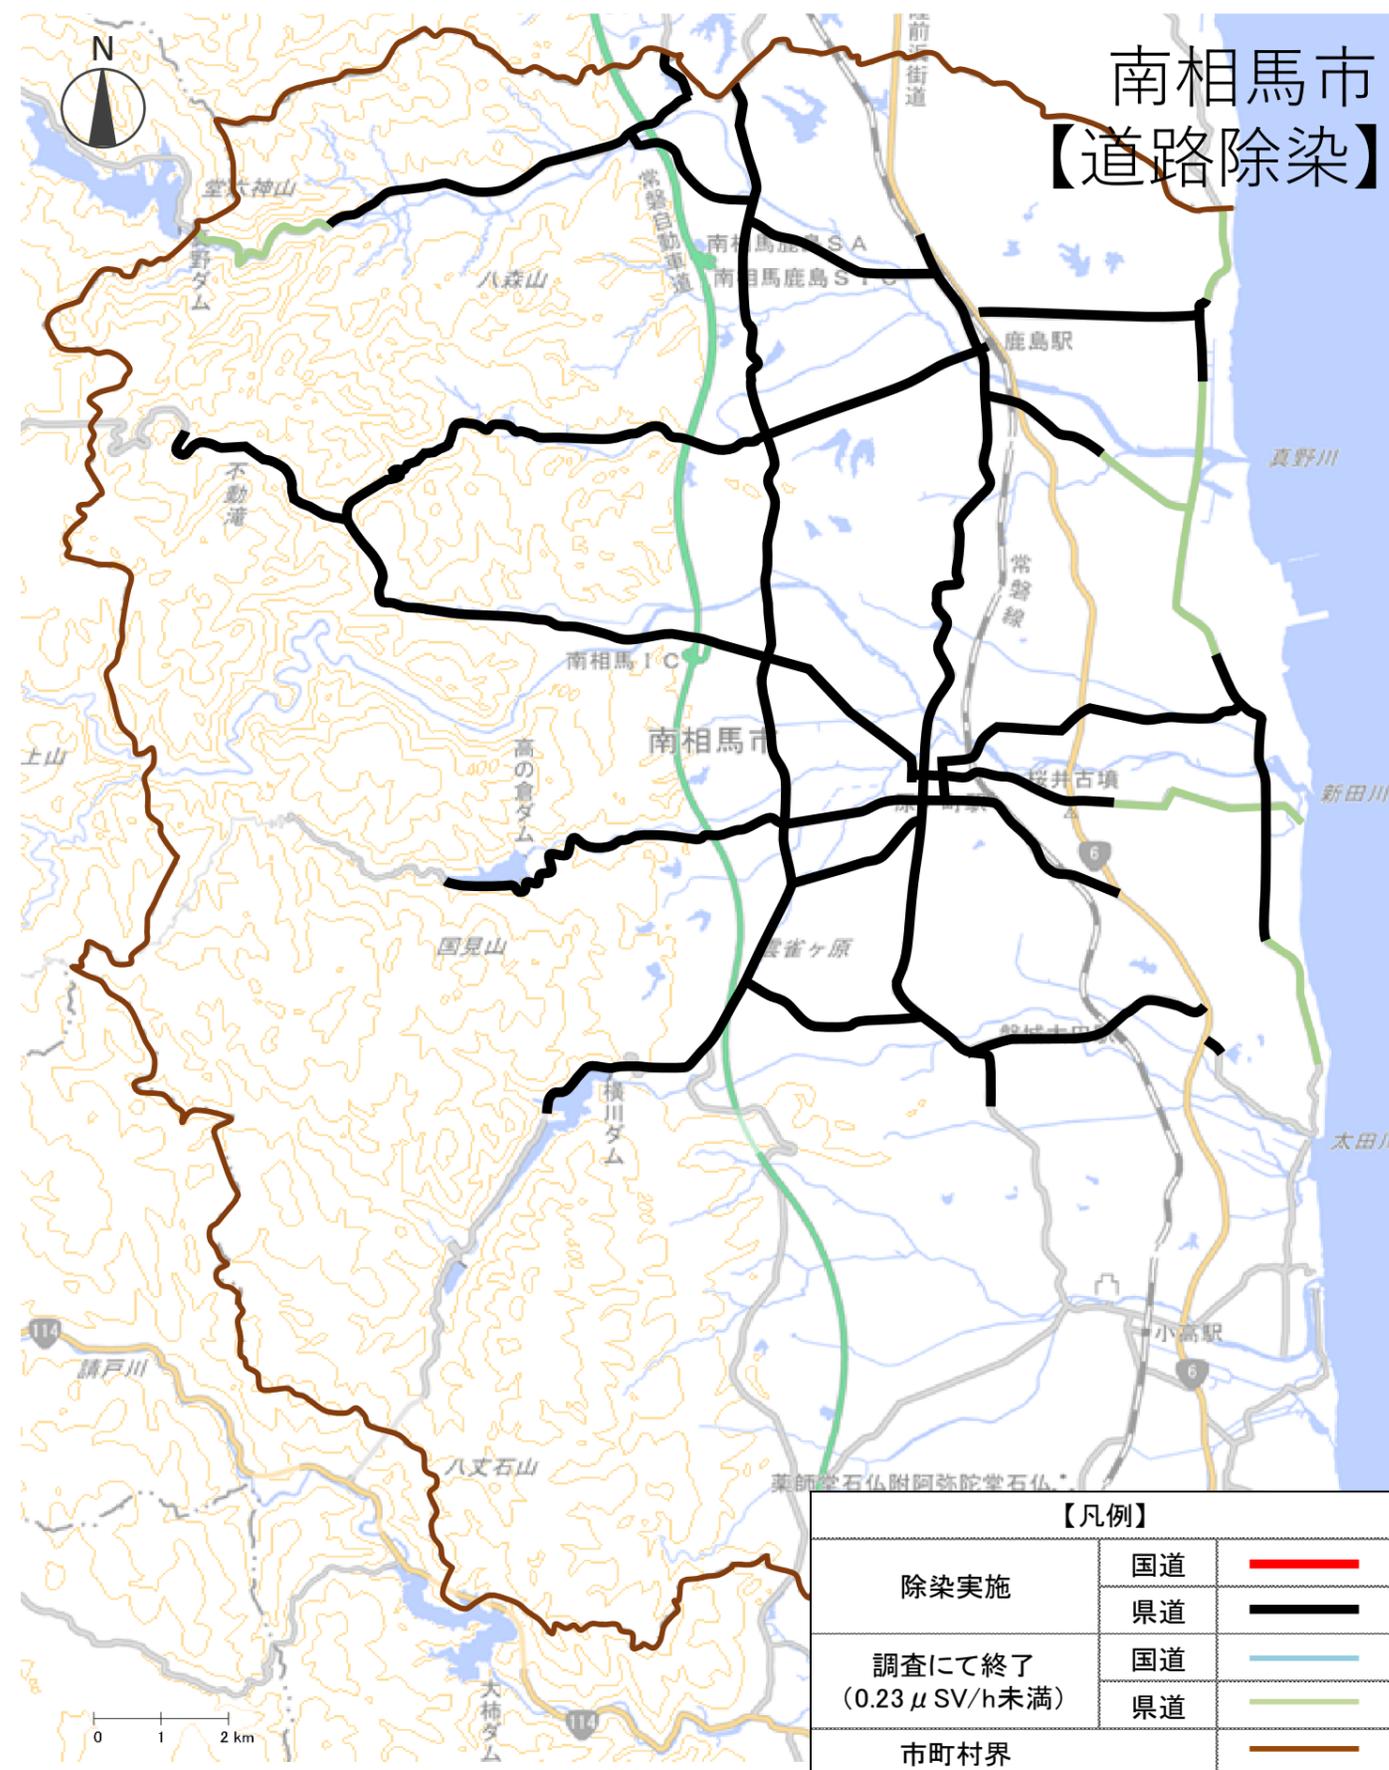

## 【河川・公園・県営団地除染】

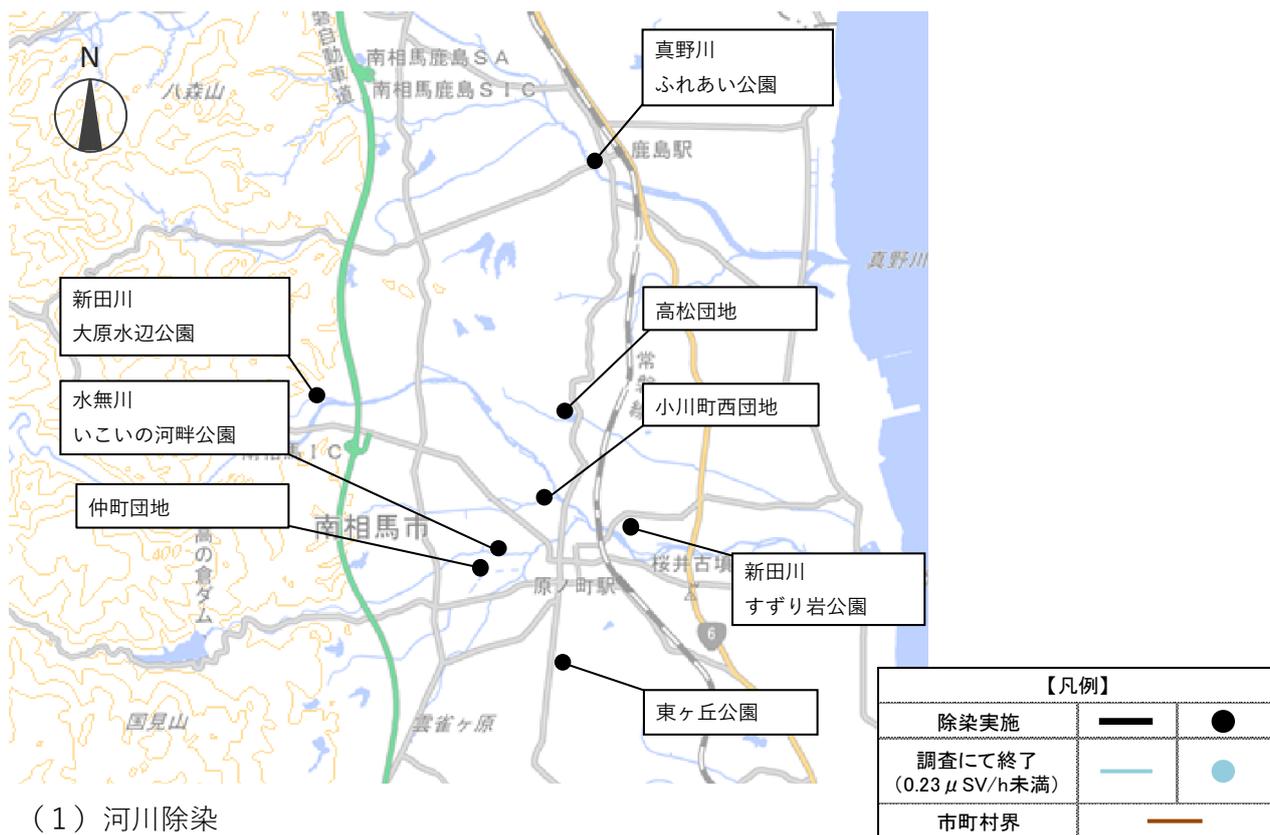

### (1) 河川除染

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化(μSV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	新田川筋 (大原水辺公園)	2015/12/14	2016/3/31	1.04	0.80	23.1%
②	新田川筋外 (すずり岩公園外)	2016/3/31	2016/11/14	0.50	0.28	44.0%

■ 他実施河川 (上表河川名の「外」に含まれるもの)

- ③ 水無川いこいの河畔公園
- ④ 真野川ふれあい広場

### (2) 公園除染

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化(μSV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	東ヶ丘公園	2016/6/15	2017/3/31	0.82	0.35	57.3%

### (2) 県営団地除染

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化(μSV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	高松団地 外	2012/7/23	2013/5/31	0.73	0.36	50.7%

■ 他実施団地 (上表路線河川等名の「外」に含まれるもの)

- ② 仲町団地
- ③ 小川町西団地


# 伊達市

## 【道路除染】

No.	契約路線河川等名	工期（始）	工期（終）	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	国道115号 外	2013/1/21	2014/12/19	4.00	2.17	45.8%
②	国道349号 外	2013/1/21	2017/9/29	6.70	1.85	72.4%
③	国道399号	2013/12/18	2015/8/31	1.08	0.35	67.6%
④	福島保原線	2013/12/18	2014/3/31	1.50	0.49	67.3%
⑤	山口保原線 外	2013/1/21	2014/2/28	5.54	0.99	82.1%
⑥	霊山松川線 外	2013/1/21	2013/7/31	3.30	1.21	63.3%
⑦	丸森霊山線 外	2013/6/17	2015/10/19	1.15	0.42	63.5%
⑨	月館・川俣線	2013/7/8	2013/12/20	1.36	0.73	46.3%
⑩	浪江国見線 外	2015/8/10	2017/2/28	0.50	0.43	14.0%
⑪	広畑・月館線外	2013/8/27	2013/12/16	1.30	0.76	41.5%
⑫	梁川霊山線 外	2013/9/9	2017/8/31	0.88	0.54	38.6%

■ 他実施路線（上表路線名の「外」に含まれるもの）


- ⑬ 丸森梁川線
- ⑭ 平松梁川線
- ⑮ 川前梁川線
- ⑯ 保原伊達崎桑折線
- ⑰ 保原桑折線
- ⑱ 月館霊山線
- ⑲ 伊達霊山線
- ⑳ 白石月館線
- ㉑ 上小国下川原線
- ㉒ 五十沢国見線
- ㉓ 大枝貝田線
- ㉔ 国見福島線
- ㉕ 飯坂保原線

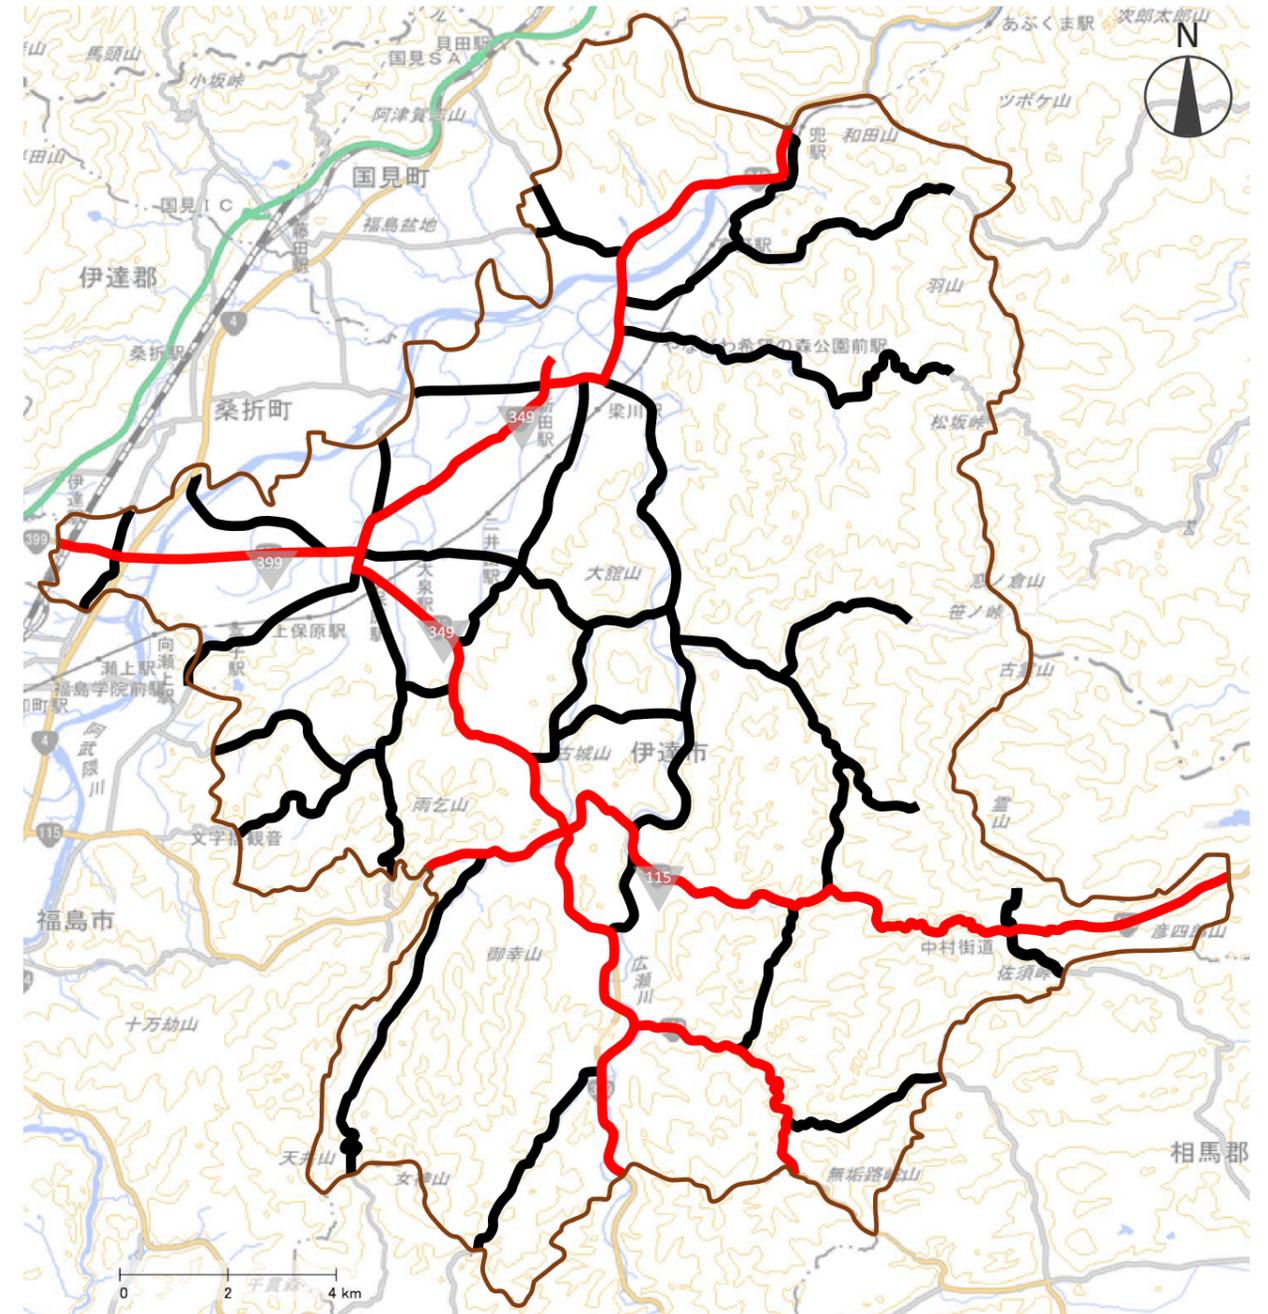

【凡例】		
除染実施	国道	—
	県道	—
調査にて終了 ( $0.23 \mu$ SV/h未満)	国道	—
	県道	—
市町村界		—


# 伊達市

## 【河川除染】

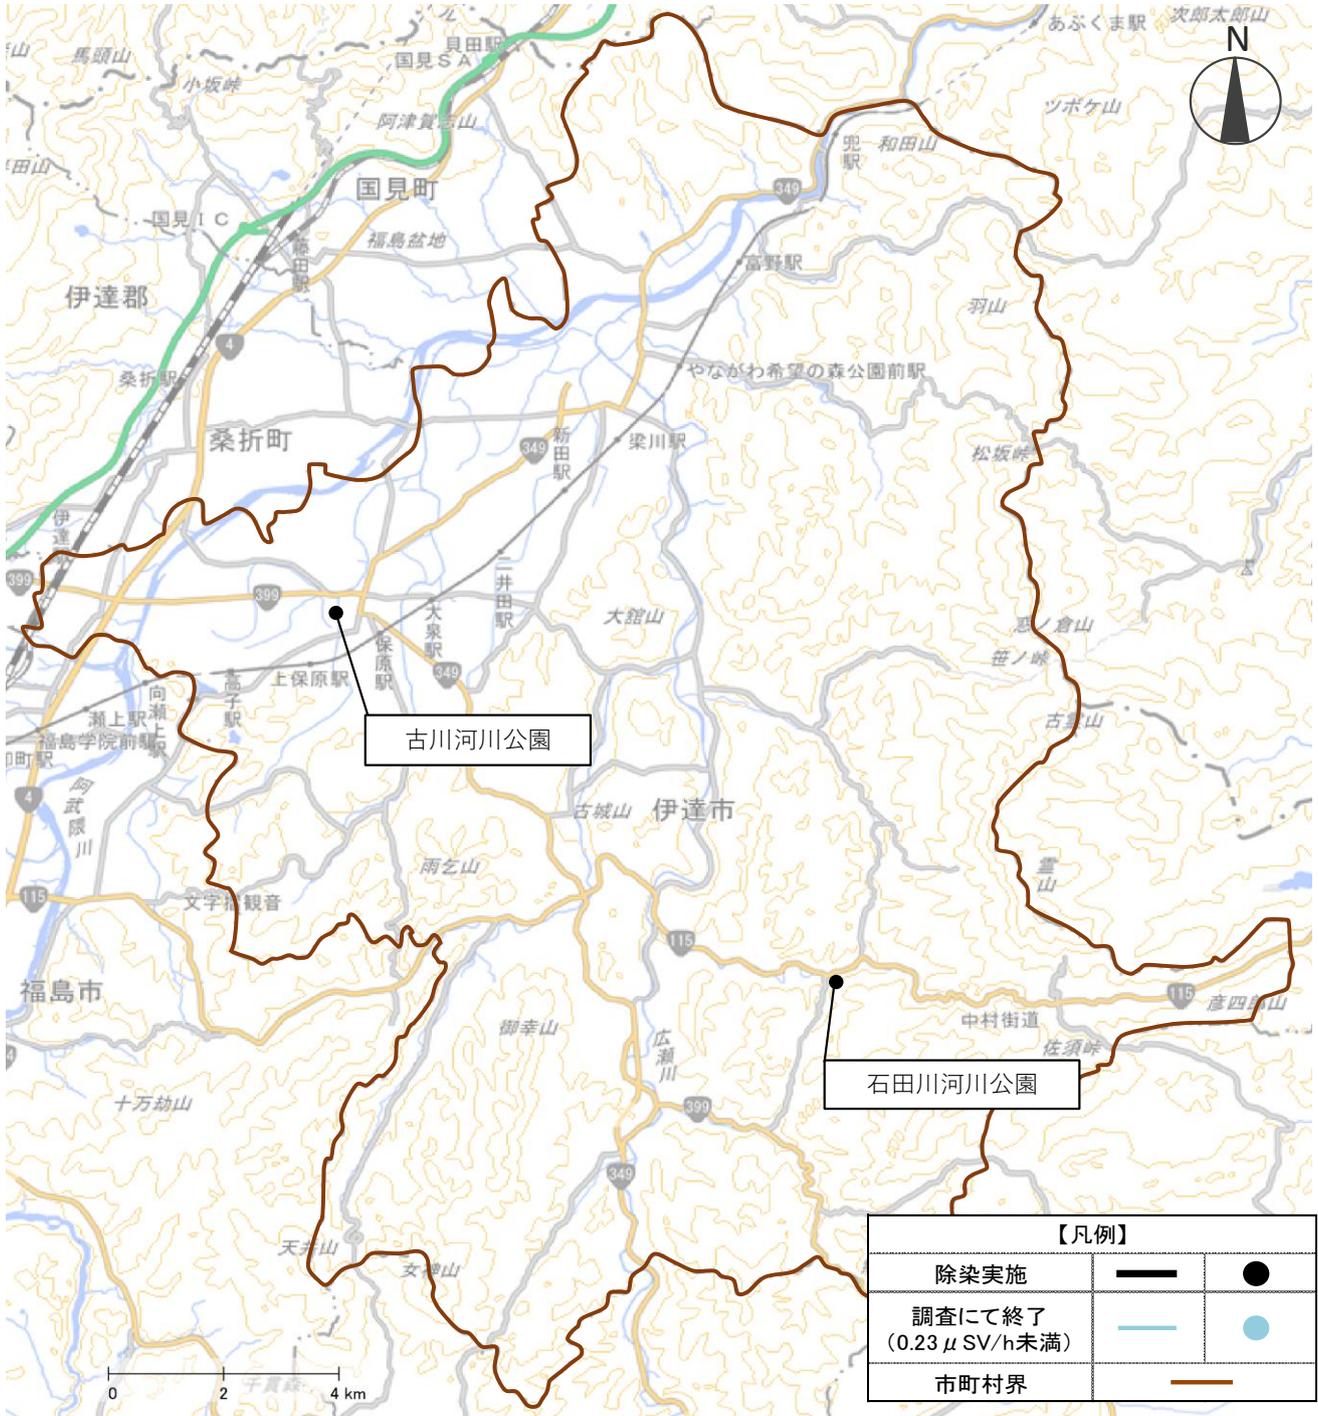

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)
①	古川河川公園		H25年度
②	石田川河川公園		H26年度

# 本宮市 【道路除染】

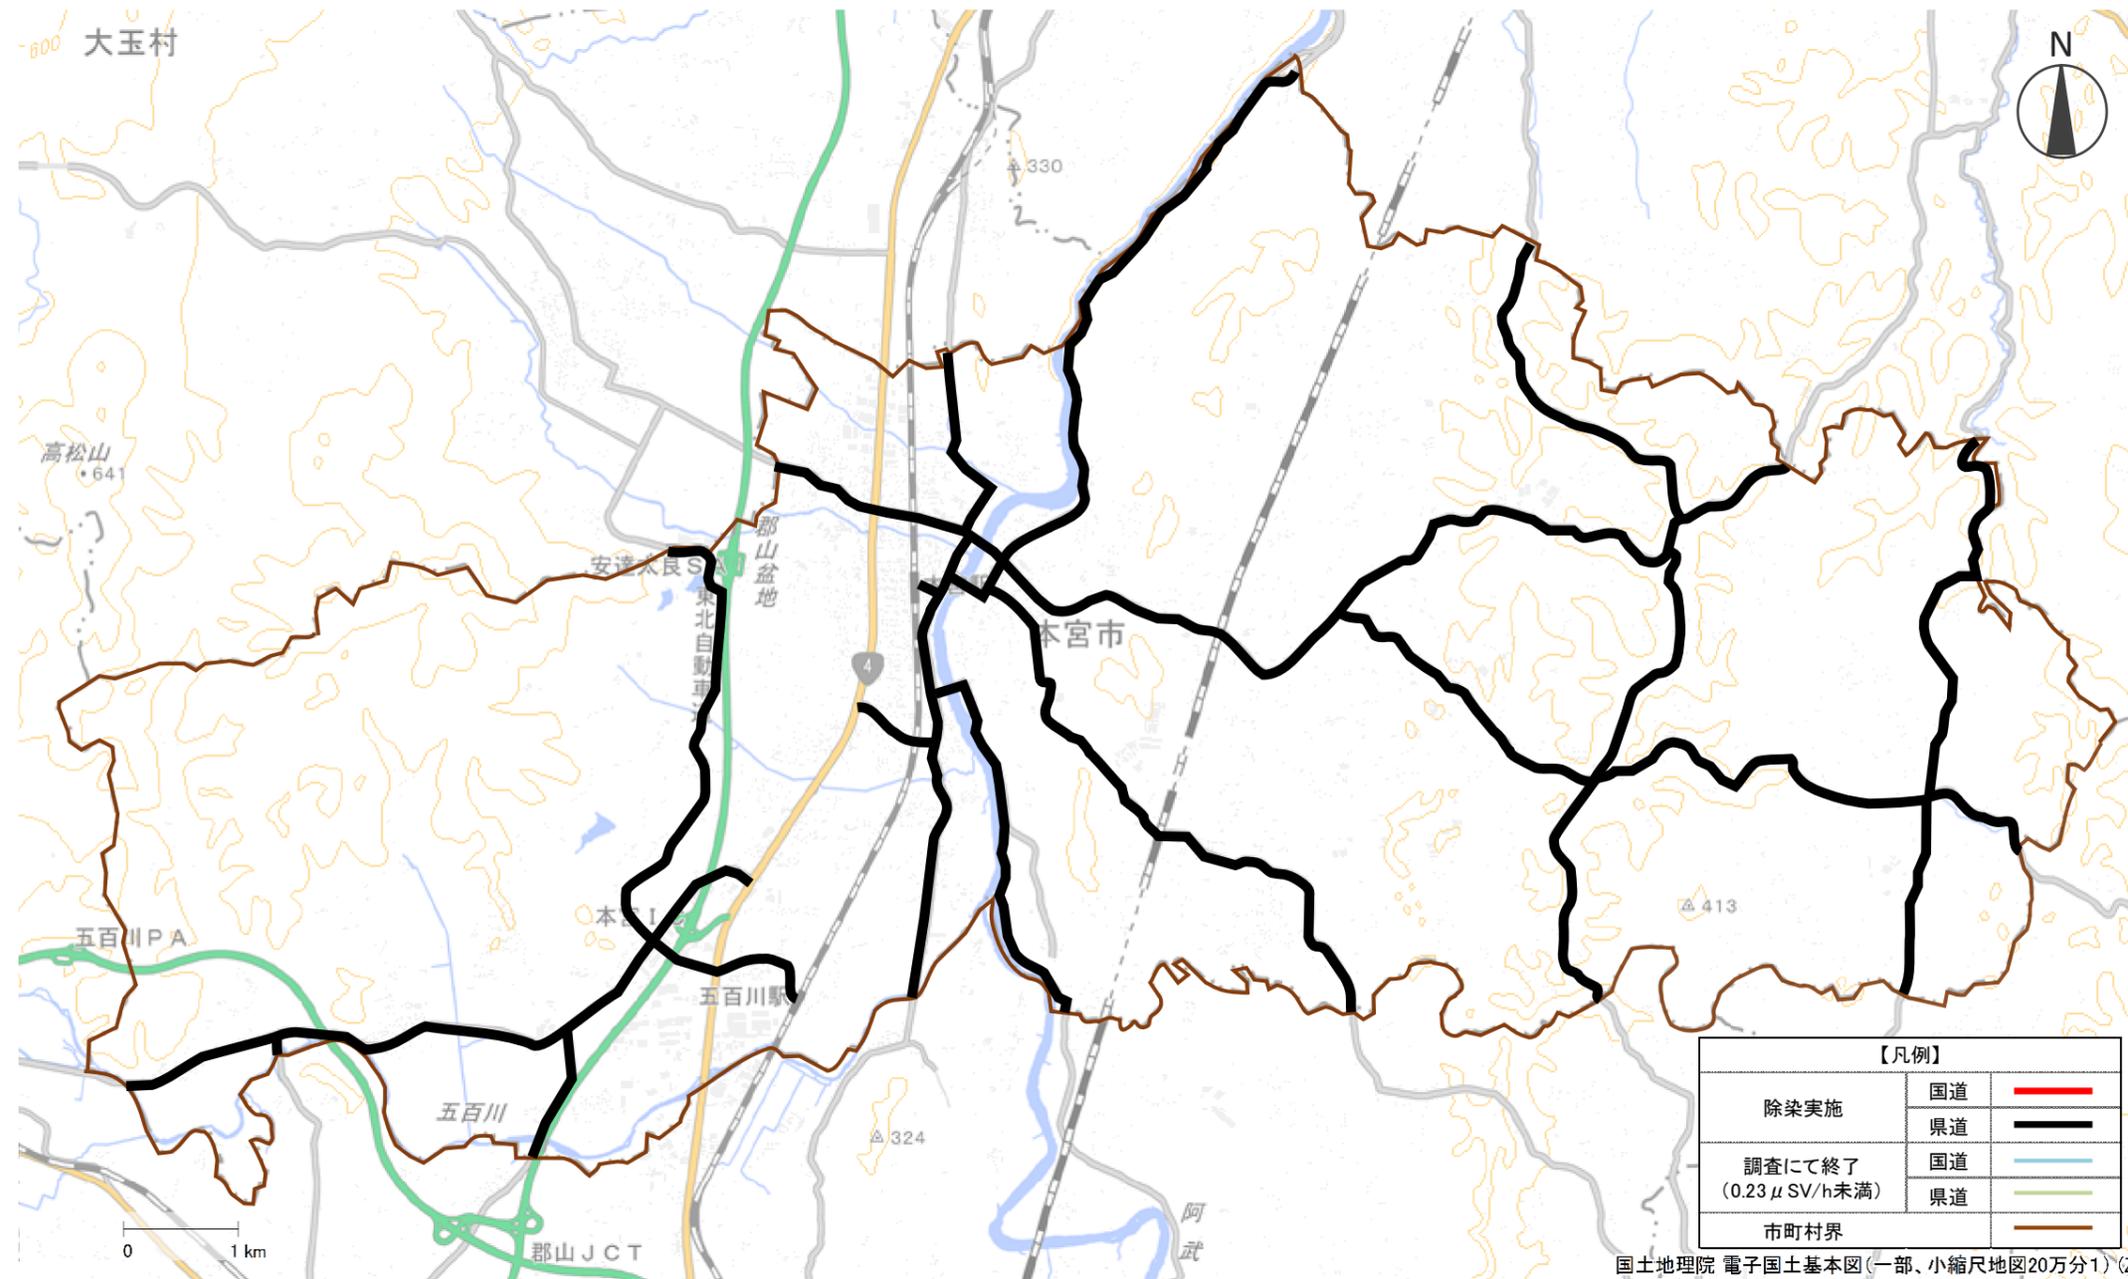


国土地理院 電子国土基本図(一部、小縮尺地図20万分1) (Z)

No.	契約路線河川等名	工期(始)	工期(終)	除染による空間線量の変化( $\mu\text{SV/h}$ )		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	本宮三春線 外	2015/7/27	2016/11/30	1.32	0.76	42.4%
②	本宮熱海線 外	2016/12/14	2018/2/28	1.17	0.90	23.1%

■ 他実施路線 (左表路線名の「外」に含まれるもの)


- ③ 飯野三春石川線
- ④ 二本松金屋線
- ⑤ 二本松三春線
- ⑥ 本宮岩代線
- ⑦ 本宮常葉線
- ⑧ 石筵本宮線
- ⑨ 本宮停車場線
- ⑩ 荒井郡山線
- ⑪ 大橋五百川停車場線
- ⑫ 須賀川二本松線
- ⑬ 岩根日和田線

# 本宮市 【公園・下水道除染】

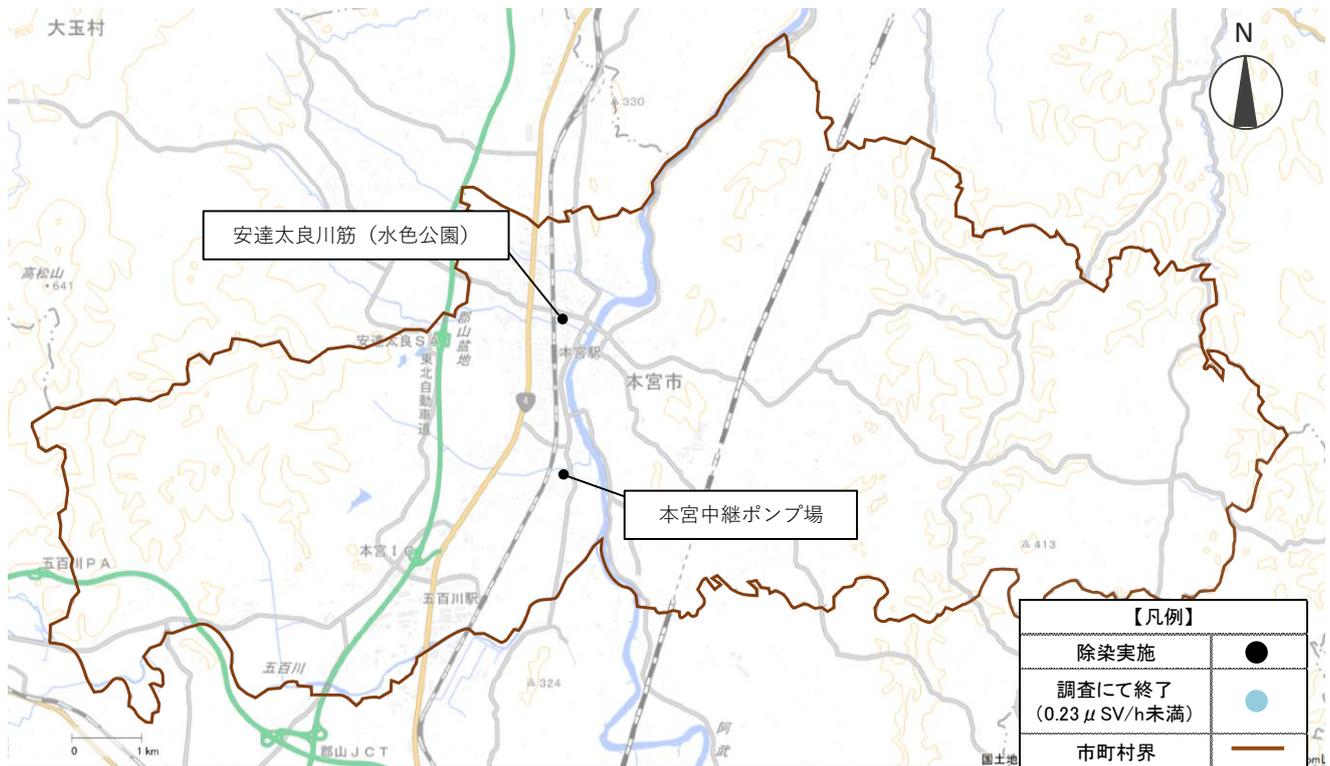

No.	契約路線河川等名	工期（始）	工期（終）	除染による空間線量の変化(μSV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	安達太良川筋（水色公園）	2012/10/31	2013/3/29	1.34	0.20	85.1%
②	本宮中継ポンプ場	2015/5/29	2015/10/2	0.99	0.25	74.7%

# 桑折町 国見町 【道路除染】

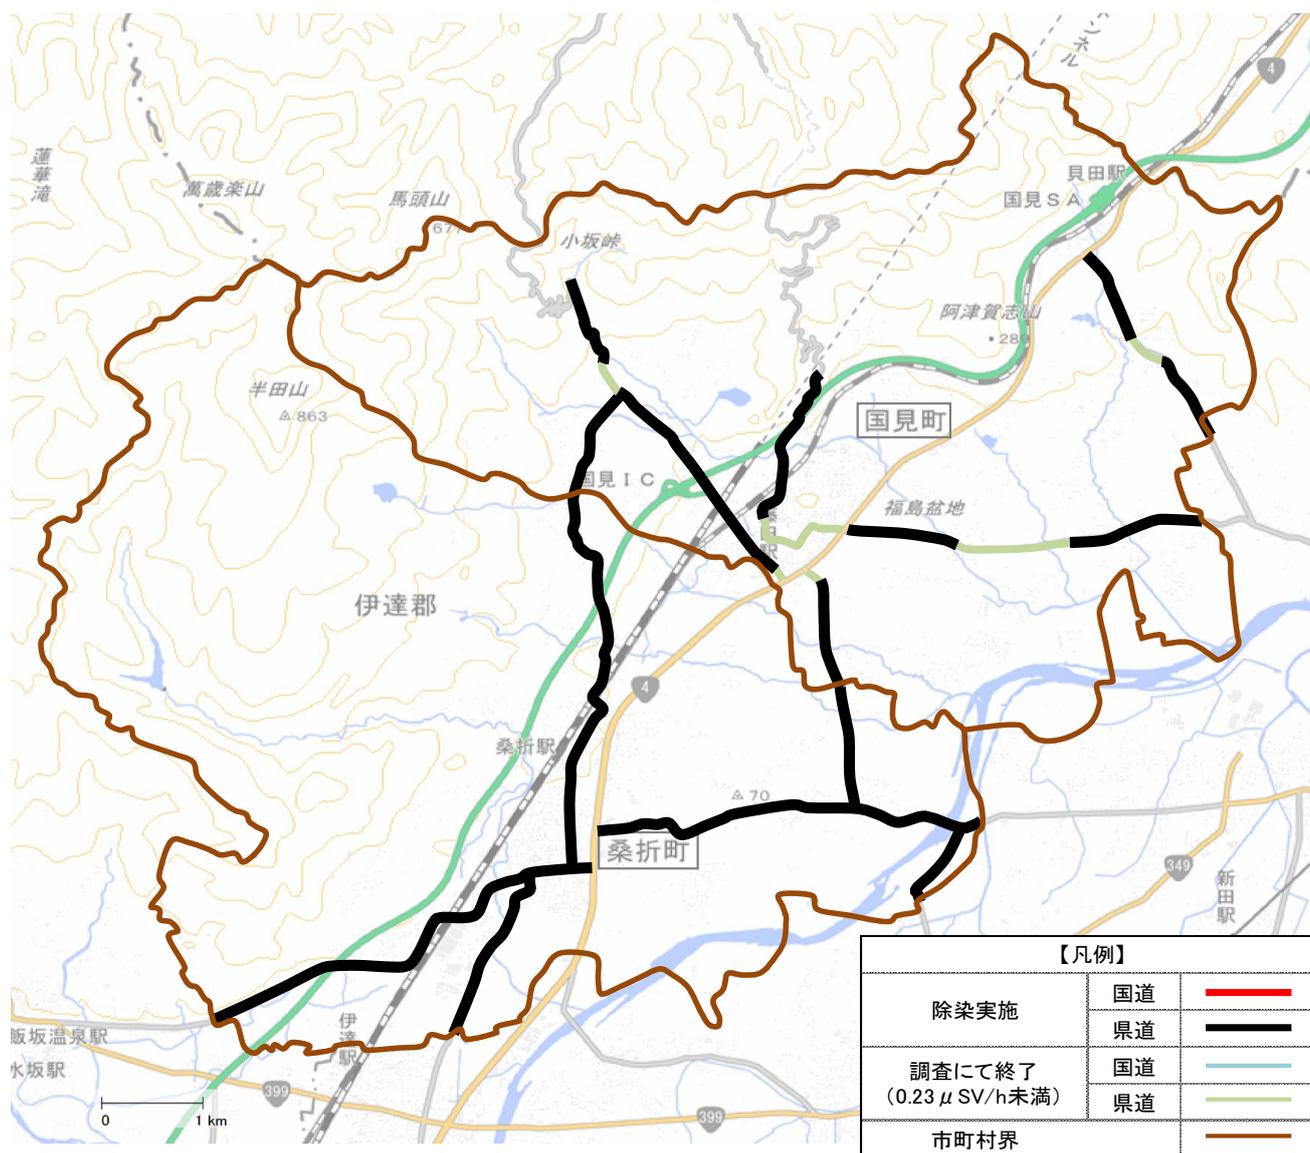

No.	市町村	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化( $\mu\text{SV/h}$ )		
					作業前に最高地点だった箇所		
					作業前	作業後	低減率
①	桑折町	飯坂桑折線	2012/11/8	2013/4/30	0.55	0.48	12.7%
②	桑折町	国見福島線 外	2012/11/8	2014/7/31	0.62	0.35	43.5%
③	桑折町	浪江国見線 外	2013/7/29	2014/3/28	1.06	0.39	63.2%
④	国見町	赤井畑国見線	2014/2/4	2014/9/30	0.74	0.45	39.2%
⑤	国見町	五十沢国見線	2014/9/29	2015/2/20	0.29	0.18	37.9%
⑥	国見町	白石国見線外	2016/10/7	2017/6/30	0.47	0.15	68.1%

■ 他実施路線（上表路線名の「外」に含まれるもの）

④ 桑折町：保原伊達崎桑折線

⑥ 国見町：大枝貝田線

桑折町  
国見町

【河川・砂防・下水道除染】

(1) 河川・砂防除染


No.	市町村	契約路線河川等名	工期(始)	工期(終)	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
					作業前に最高地点だった箇所		
					作業前	作業後	低減率
①	桑折町	佐久間川筋 外	2016/10/28	2017/3/31	0.45	0.36	20.0%
②	桑折町	産ヶ沢川筋	2016/10/24	2017/2/27	0.47	0.34	27.7%
③	国見町	滝川筋 外	2016/11/25	2017/6/30	0.45	0.35	22.2%

■ 他実施河川(上表路線名の「外」に含まれるもの)

- ③ 砂防公園うぶかの郷(桑折町)
- ② 普蔵川(国見町)
- ③ 上泉川(国見町)

(2) 下水道除染

No.	市町村	契約路線河川等名	工期(始)	工期(終)	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
					作業前に最高地点だった箇所		
					作業前	作業後	低減率
①	国見町	県北浄化センター	2012/4/17	2017/1/31	0.85	0.72	15.3%

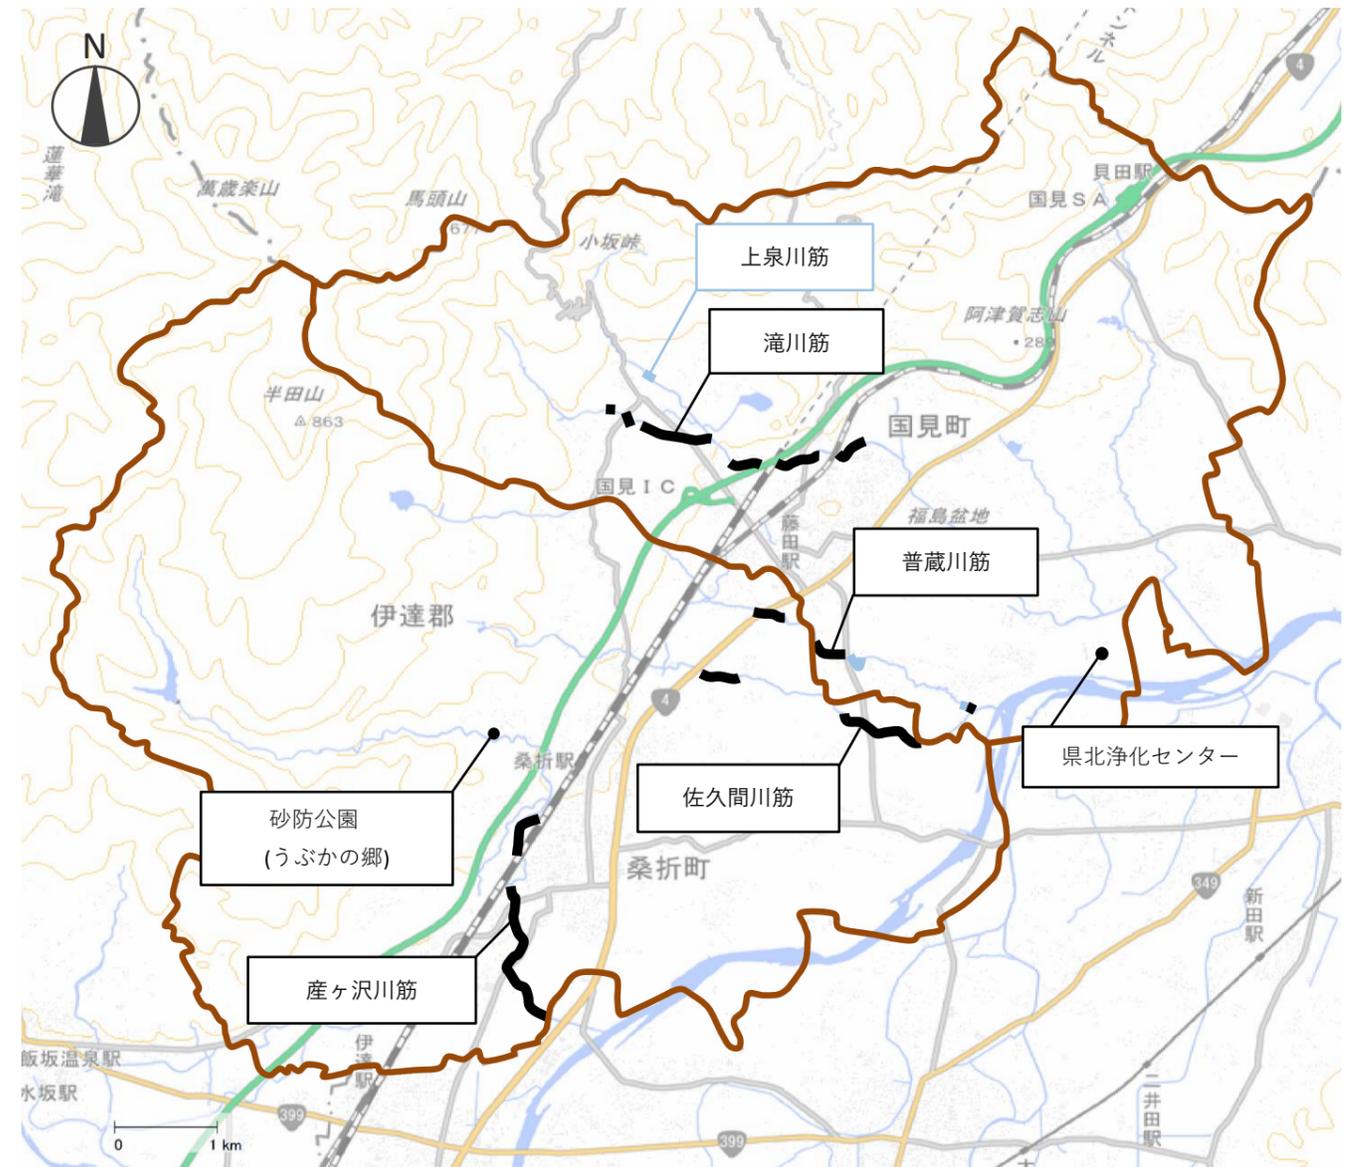

【凡例】		
除染実施	—	●
調査にて終了 ( $0.23 \mu$ SV/h未満)	—	●
市町村界	—	

# 川俣町

## 【道路除染】




### ■ 除染実施路線

- ① 国道114号 (町が実施)
- ② 国道349号 (町が実施)
- ③ 原町川俣線 (町が実施)
- ④ 川俣安達線 (町が実施)
- ⑤ 霊山松川線 (町が実施)
- ⑥ 二本松川俣線 (町が実施)
- ⑦ 月舘川俣線 (町が実施)

【凡例】		
除染実施	国道	
	県道	
調査にて終了 (0.23 μSV/h未満)	国道	
	県道	
市町村界		

# 大玉村 【道路除染】

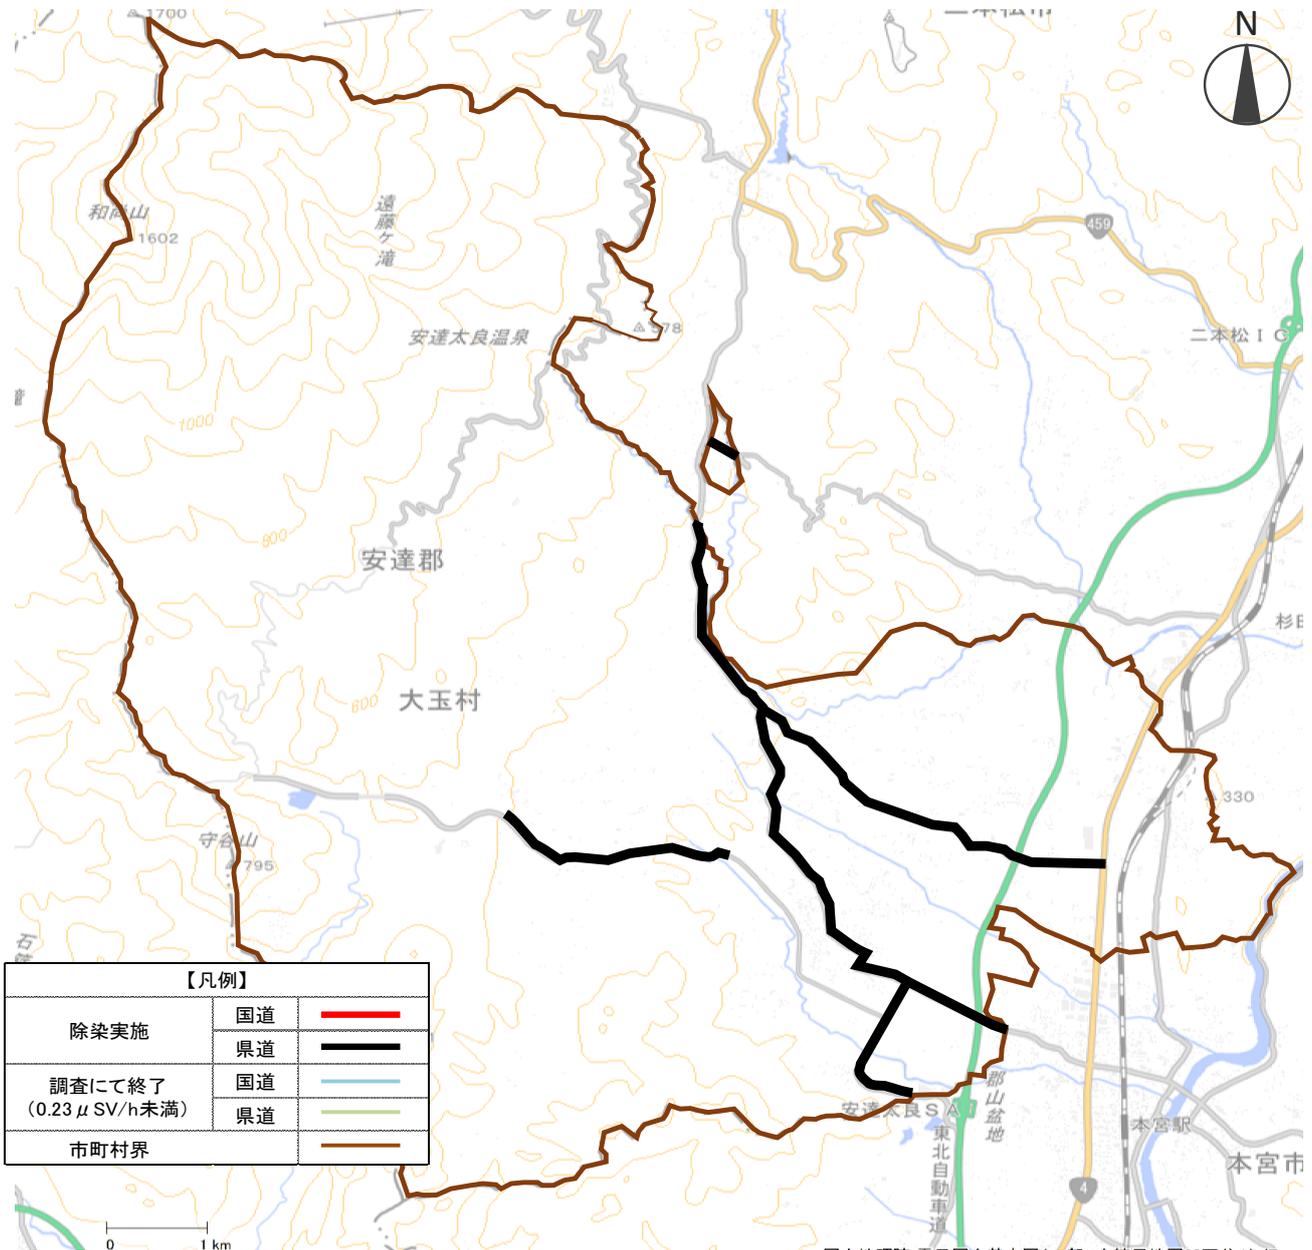


No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	本宮土湯温泉線 外	2012/7/23	2014/3/28	1.94	0.97	50.0%

■ 他実施路線（上表路線名の「外」に含まれるもの）

- ② 石筵本宮線
- ③ 大橋五百川停車場線
- ④ 須賀川二本松線
- ⑤ 馬場平杉田線

# 天栄村 【道路除染】

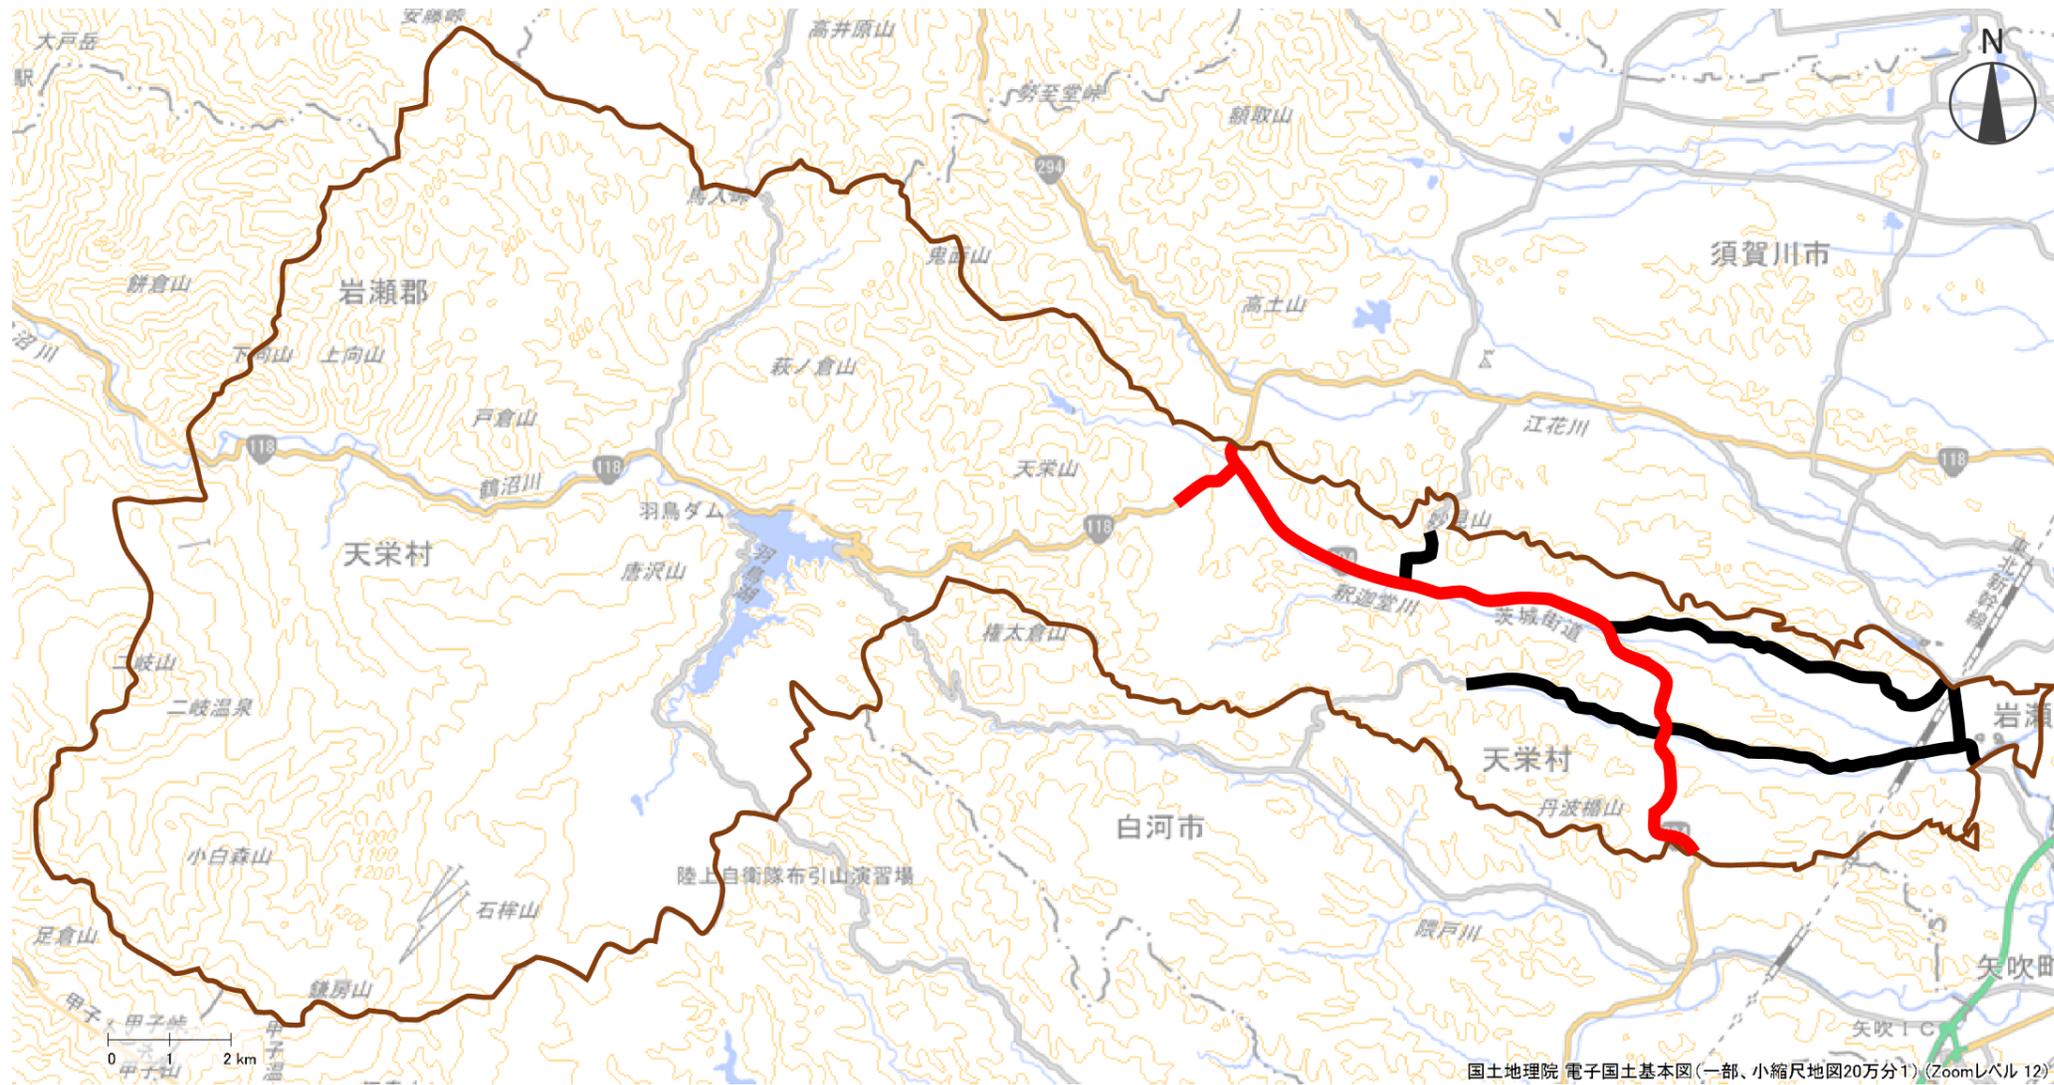


No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化( $\mu\text{SV/h}$ )		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	国道294号 外	2013/7/25	2017/3/31	3.48	0.07	98.0%
②	十日市矢吹線 外	2015/12/25	2017/1/31	0.59	0.09	84.7%

- 他実施路線 (上表路線名の「外」に含まれるもの)
- ③ 国道118号
- ④ 郡山矢吹線
- ⑤ 下松本鏡石停車場線
- ⑥ 牧ノ内長沼線

【凡例】		
除染実施	国道	<span style="color: red;">—</span>
	県道	<span style="color: black;">—</span>
調査にて終了 ( $0.23 \mu\text{SV/h}$ 未満)	国道	<span style="color: blue;">—</span>
	県道	<span style="color: green;">—</span>
市町村界		<span style="color: brown;">—</span>

# 湯川村 【道路除染】

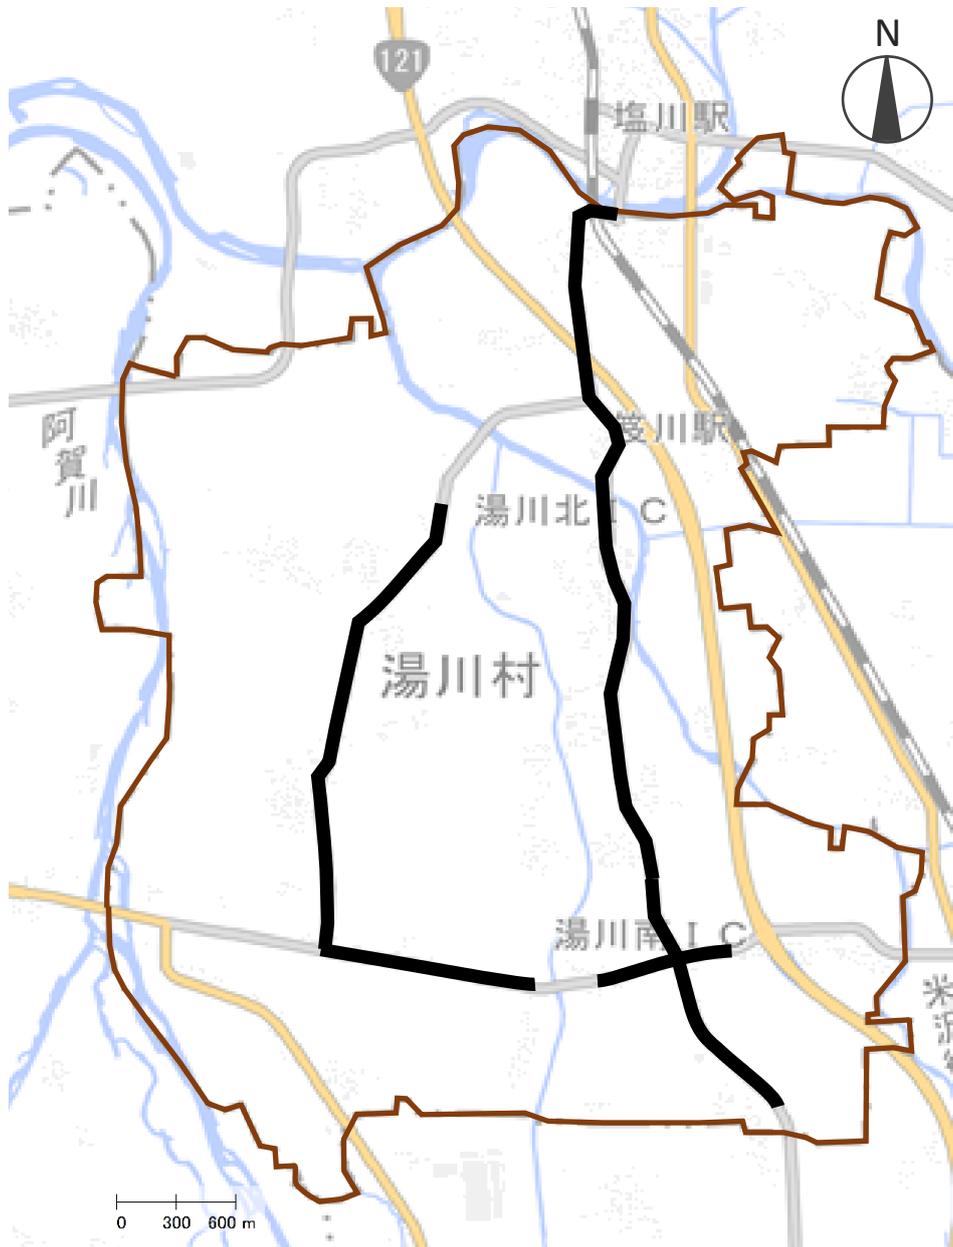


## ■ 除染実施路線

- ① 会津坂下河東線（村が実施）
- ② 浜崎高野会津若松線（村が実施）
- ③ 熊の目浜崎線（村が実施）

【凡例】		
除染実施	国道	
	県道	
調査にて終了 ( $0.23 \mu\text{SV/h}$ 未満)	国道	
	県道	
市町村界		

# 西郷村 【道路除染】

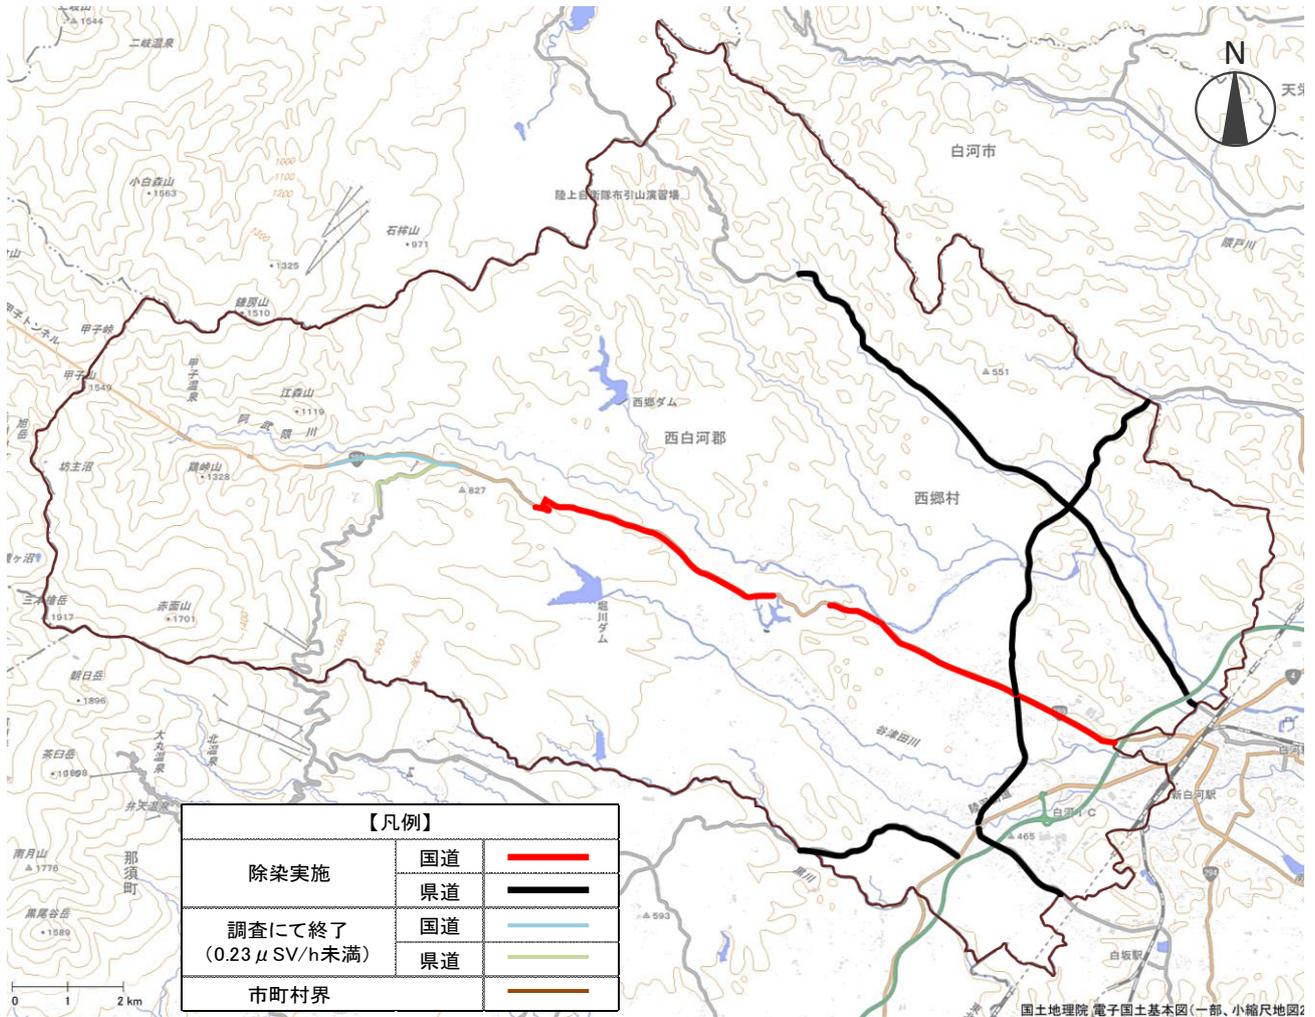

No.	路線河川等名	工期 (自)	工期 (至)	除染による空間線量の変化(μSV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	国道289号	2016/3/23	2016/11/30	0.39	0.18	53.8%
②	那須西郷線 外	2015/10/27	2016/11/30	0.88	0.14	84.1%
③	増見小田倉線	2016/1/26	2016/10/28	1.10	0.18	83.6%
④	白河羽鳥線 外	2016/3/23	2016/12/28	0.66	0.19	71.2%

■ 他実施路線 (上表路線名の「外」に含まれるもの)

⑤ 白坂停車場小田倉線

# 西郷村


## 【河川・県営団地除染】

### (1) 河川除染

No.	契約路線河川等名	工期(始)	工期(終)
①	阿武隈川筋	H28年度	
②	真名子川筋	H28年度	
③	谷津田川筋	H28年度	
④	堀川筋	H28年度	

#### ■ 他実施河川

- ⑤ 堀川ダム(公園)(村が実施)
- ⑥ 堀川河川公園(村が実施)

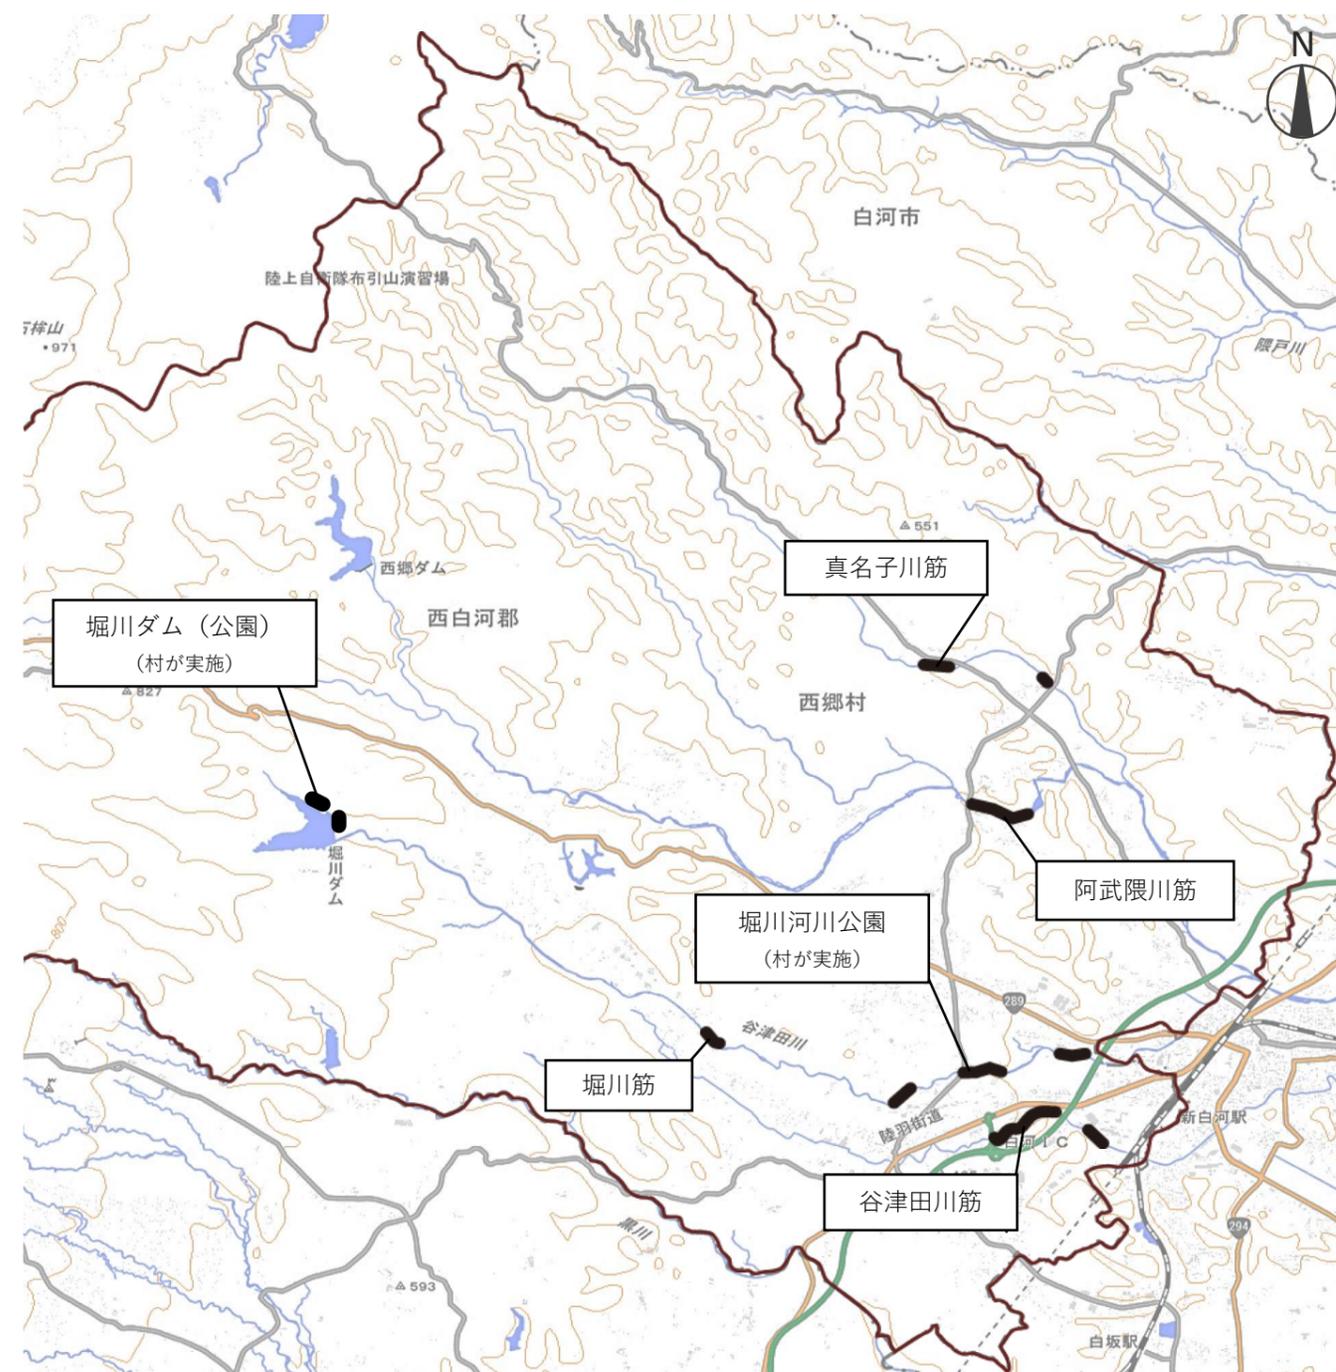

【凡例】	
除染実施	— ●
調査にて終了 (0.23 μSV/h未満)	— ●
市町村界	—

## 泉崎村・中島村・矢吹町 道路除染


No.	市町村	契約路線河川等名	工期（始）	工期（終）	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
					作業前に最高地点だった箇所		
					作業前	作業後	低減率
①	泉崎村	埴泉崎線 外	2013/12/27	2016/3/18	0.58	0.13	77.6%
❶	中島村	棚倉矢吹線 外	2015/10/1	2016/3/25	0.35	0.21	40.0%
(1)	矢吹町	郡山矢吹線	2013/11/21	2014/5/30	0.31	0.20	35.5%
(2)	矢吹町	須賀川矢吹線 外	2015/2/10	2015/7/14	0.27	0.09	66.7%
(3)	矢吹町	棚倉矢吹線 外	2015/10/14	2016/3/18	0.35	0.16	54.3%
(4)	矢吹町	泉崎石川線 外	2015/10/14	2016/3/18	0.38	0.16	57.9%

### ■ 他実施路線（上表路線名の「外」に含まれるもの）

- ② 泉崎村：泉崎石川線
- ③ 泉崎村：母畑白河線
- ❷ 中島村：埴泉崎線須
- ❸ 中島村：泉崎石川線
- (5) 矢吹町：矢吹天栄線
- (6) 矢吹町：石川矢吹線
- (7) 矢吹町：母畑白河線
- (8) 矢吹町：矢吹停車場線

泉崎村  
中島村  
矢吹町


【道路除染】

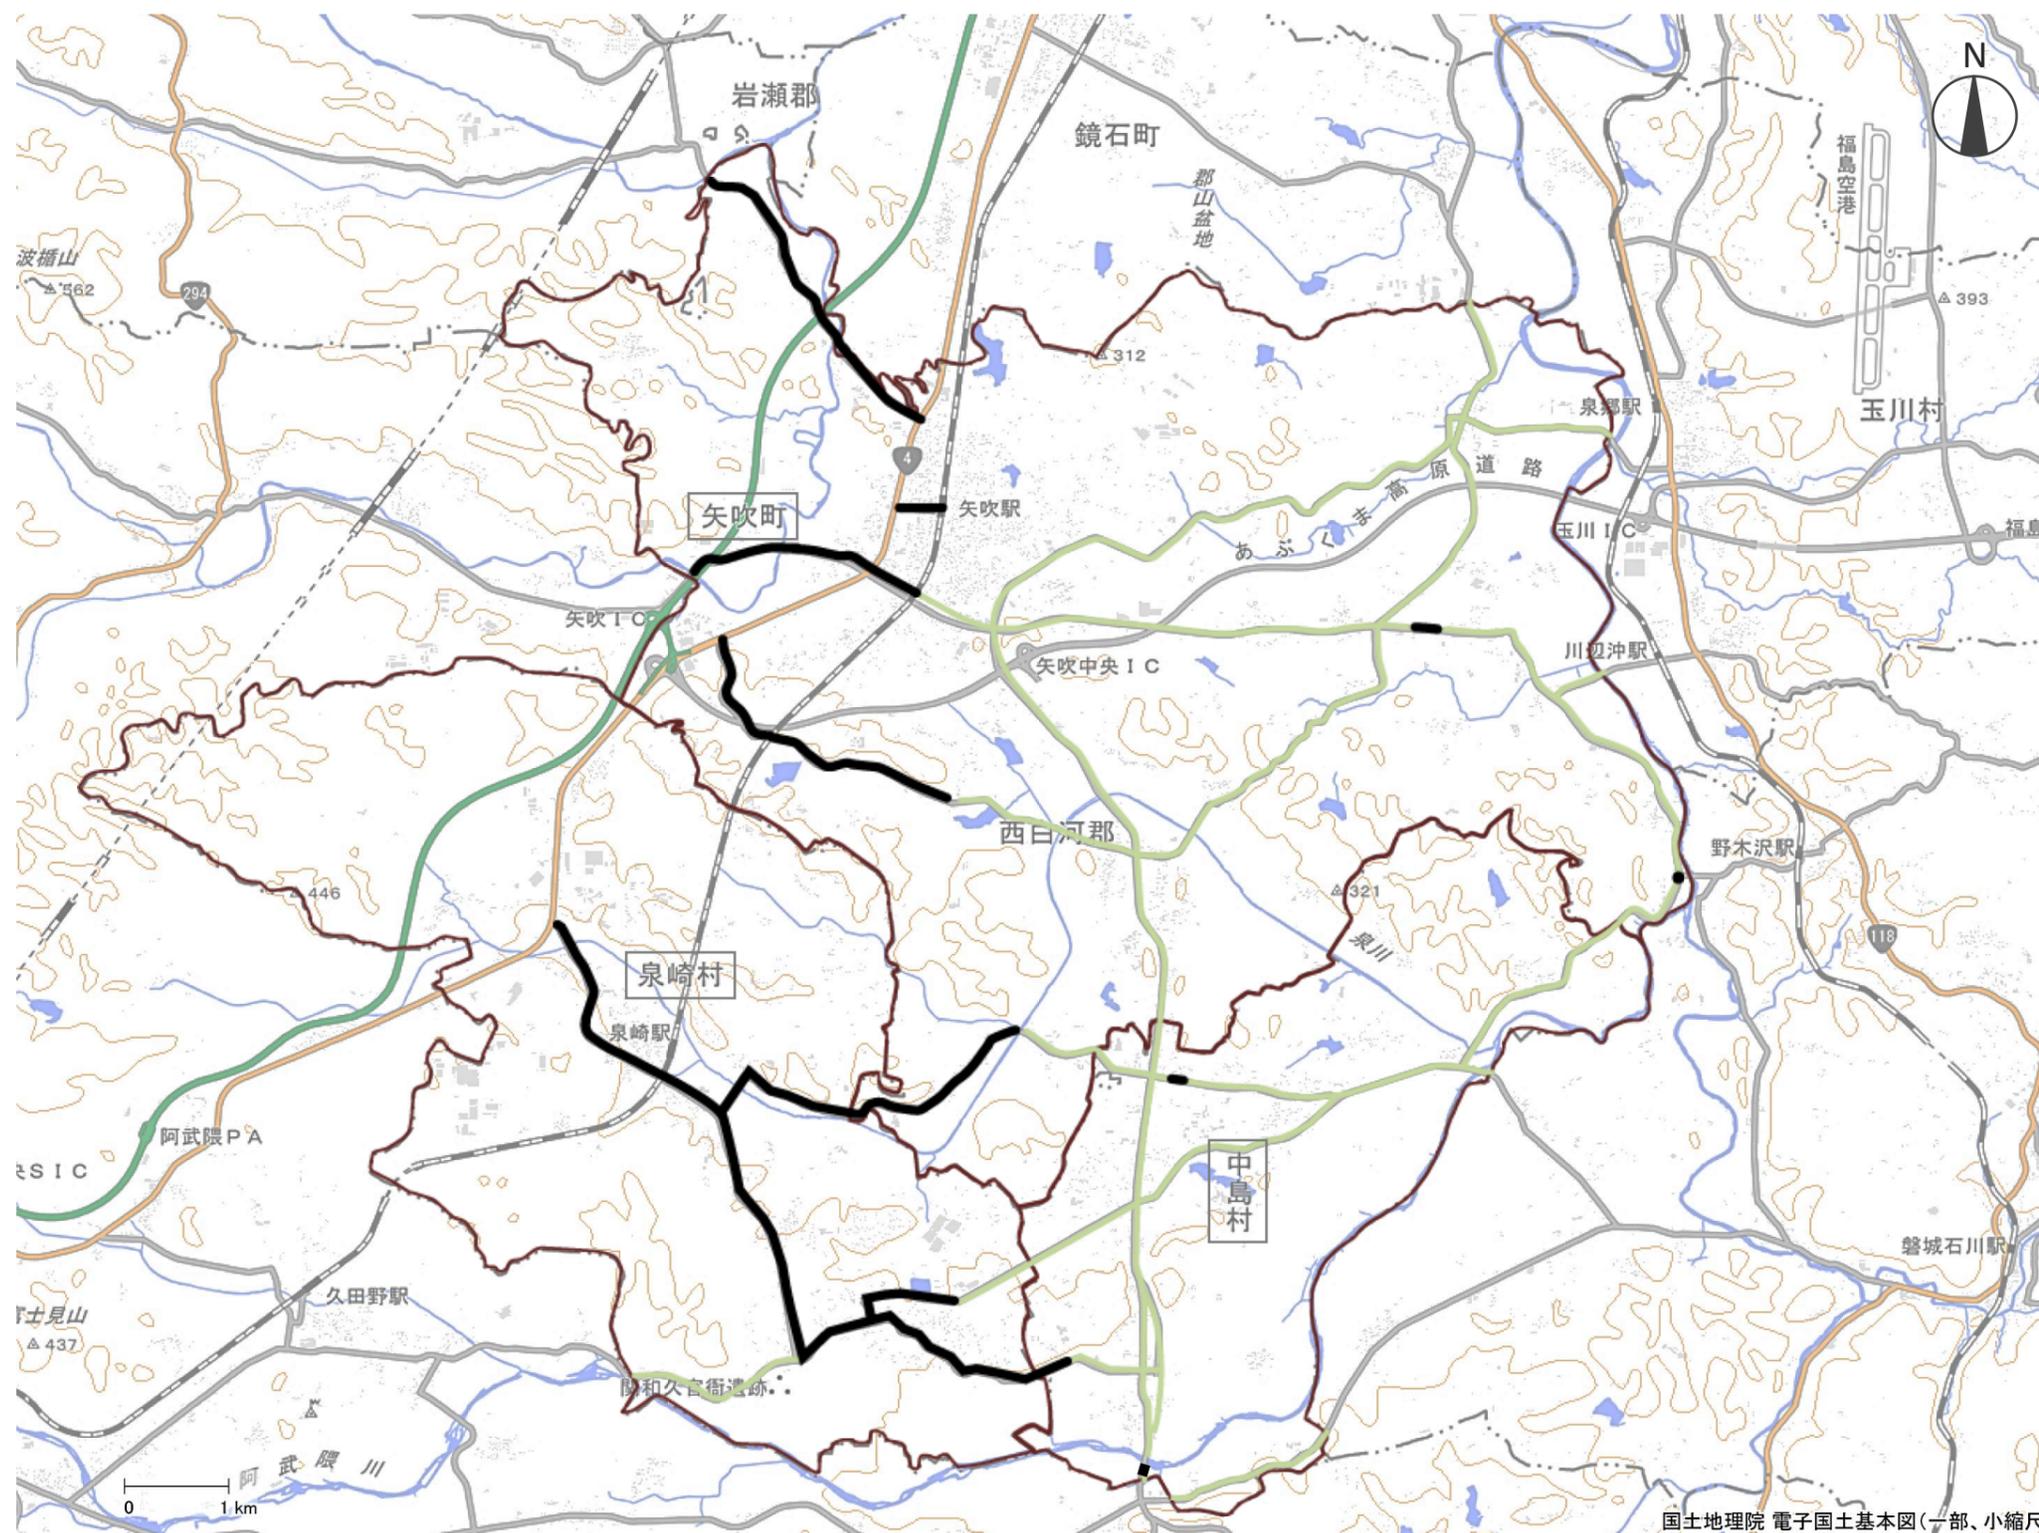


【凡例】		
除染実施	国道	—
	県道	—
調査にて終了 (0.23 μSv/h未満)	国道	—
	県道	—
市町村界		—

# 棚倉町

## 【道路除染】

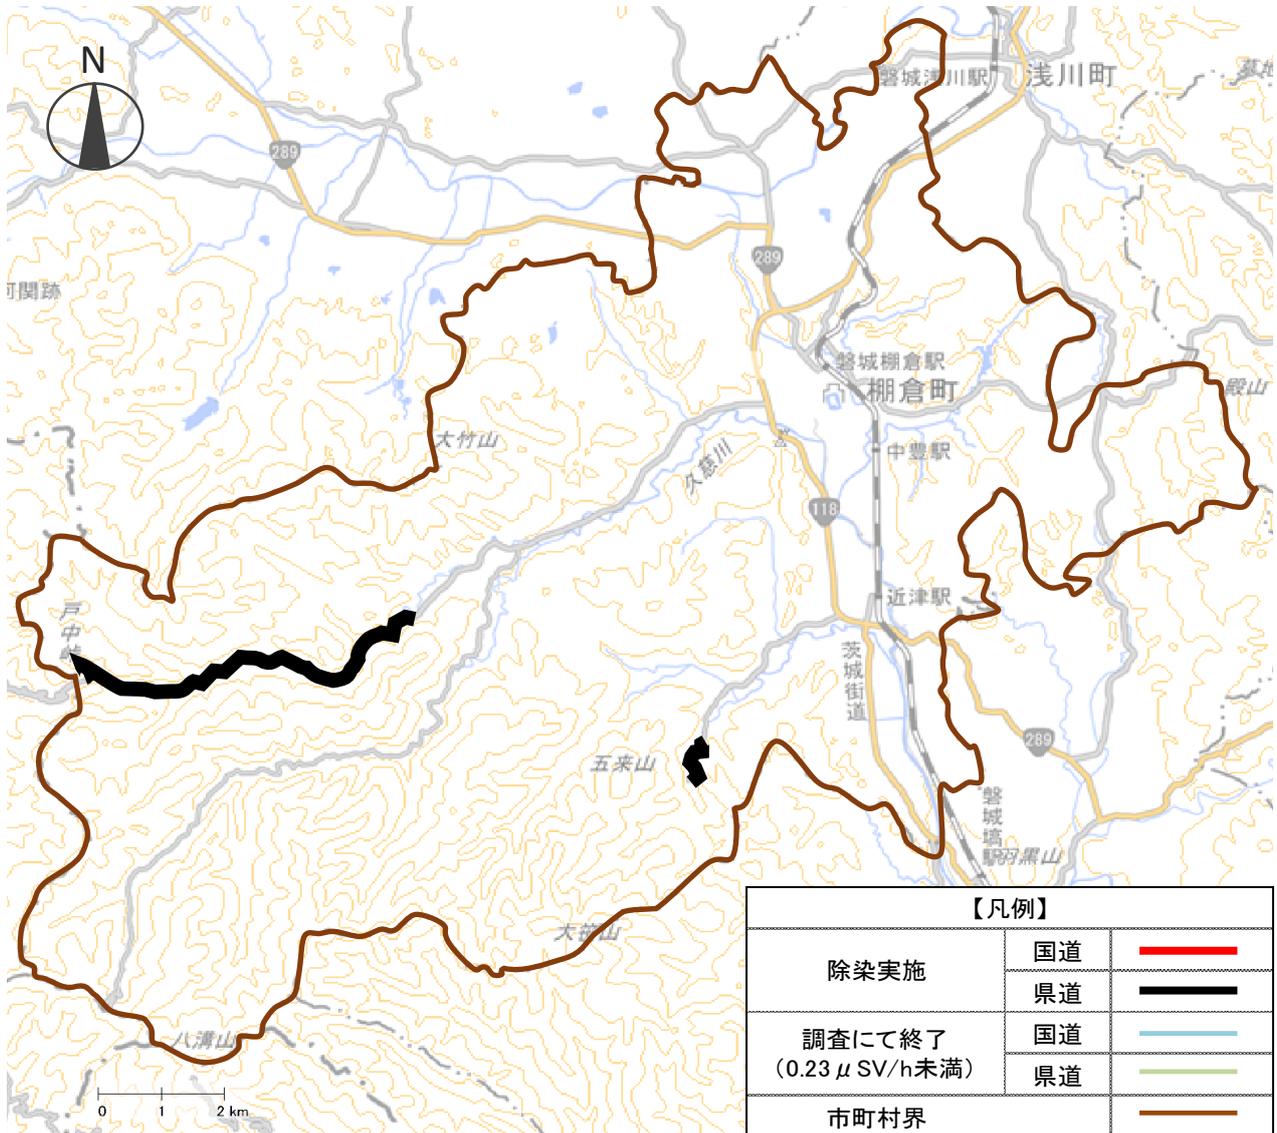

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化(μSV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	黒磯棚倉線	2013/9/11	2013/12/27	1.30	0.34	73.8%
②	山本不動線	2013/11/6	2014/2/5	0.43	0.24	44.2%

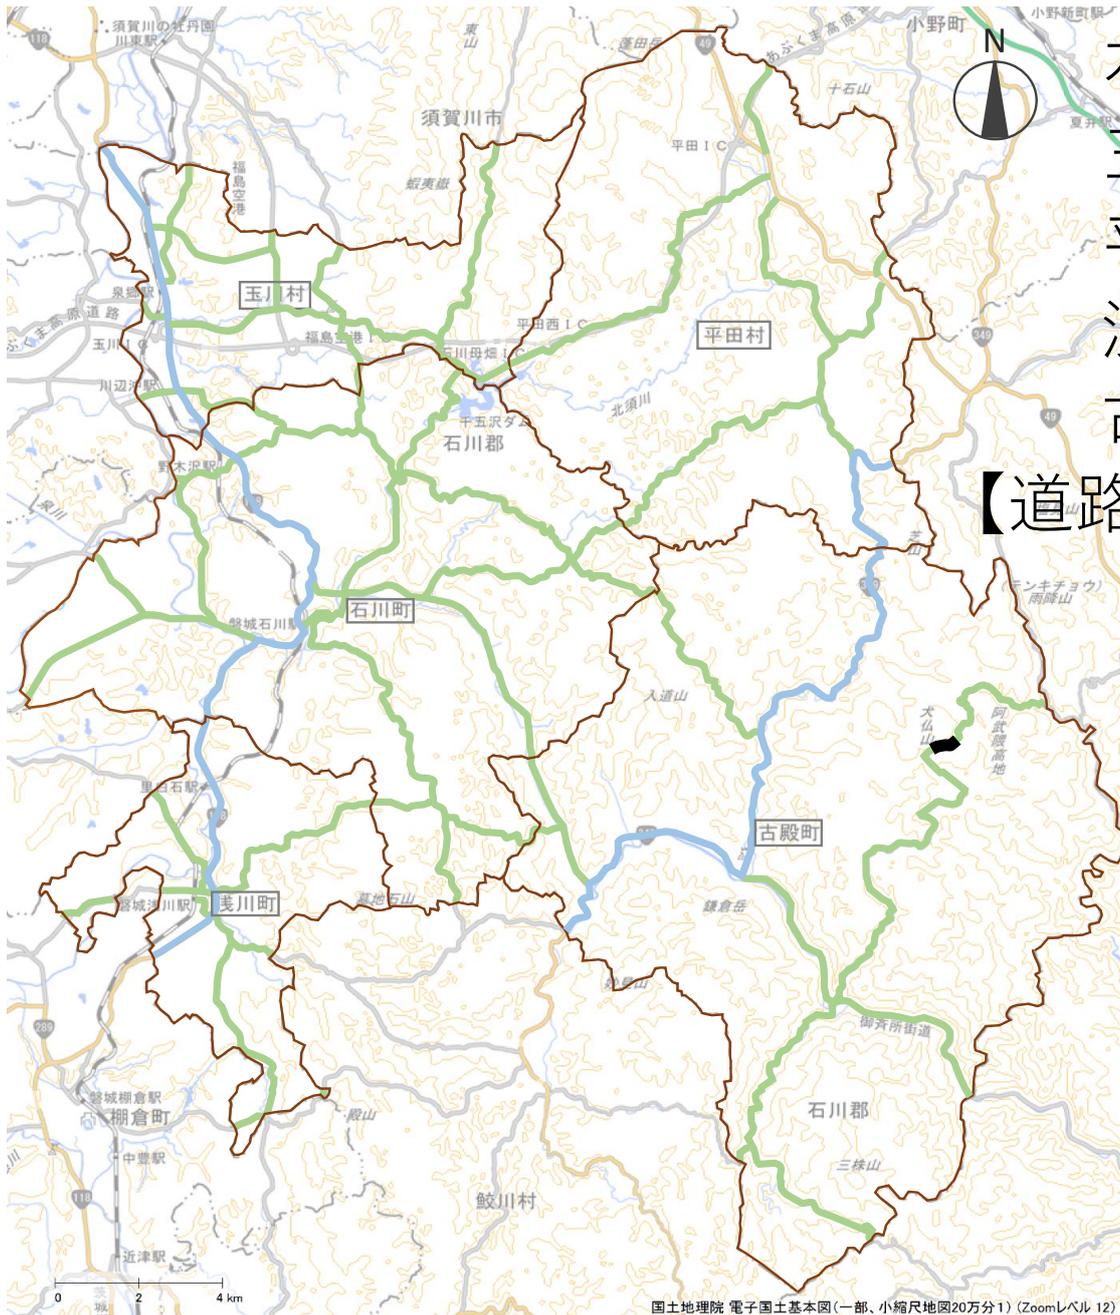

石川町  
 玉川村  
 平田村  
 浅川町  
 古殿町  
**【道路除染】**

国土地理院 電子国土基本図(一部、小縮尺地図20万分1) (Zoomレベル 12)

【凡例】		
除染実施	国道	
	県道	
調査にて終了 (0.23 μSV/h未満)	国道	
	県道	
市町村界		


No.	市町村	路線河川等名	工期 (自)	工期 (至)	除染による空間線量の変化(μSV/h)		
					作業前に最高地点だった箇所		
		作業前	作業後	低減率			
①	古殿町	三株下市萱小川線	2014/9/9	2015/2/17	0.54	0.19	64.8%

# 三春町 【道路除染】

No.	契約路線河川等名	工期（始）	工期（終）	除染による空間線量の変化(μSV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	国道288号外	2013/11/18	2017/3/24	1.32	1.09	17.4%
②	本宮三春線 外	2015/6/9	2017/3/24	0.39	0.22	43.6%
③	本宮常葉線 外	2012/11/28	2015/5/18	0.99	0.82	17.2%
④	郡山大越線 外	2015/6/8	2016/6/30	0.25	0.14	44.0%
⑤	須賀川三春線 外	2015/3/30	2016/3/11	0.78	0.36	53.8%
⑥	谷田川三春線	2015/7/9	2016/7/29	0.66	0.07	89.4%
⑦	飯野三春石川線	2015/7/9	2016/6/30	0.67	0.10	85.1%

■ 他実施路線（上表路線名の「外」に含まれるもの）

- ⑧ 浪江三春線
- ⑨ 三春日和田線
- ⑩ 二本松三春線
- ⑪ 斎藤下行合線
- ⑫ 阿久津舞木停車場線
- ⑬ 実沢要田線
- ⑭ 門沢三春線

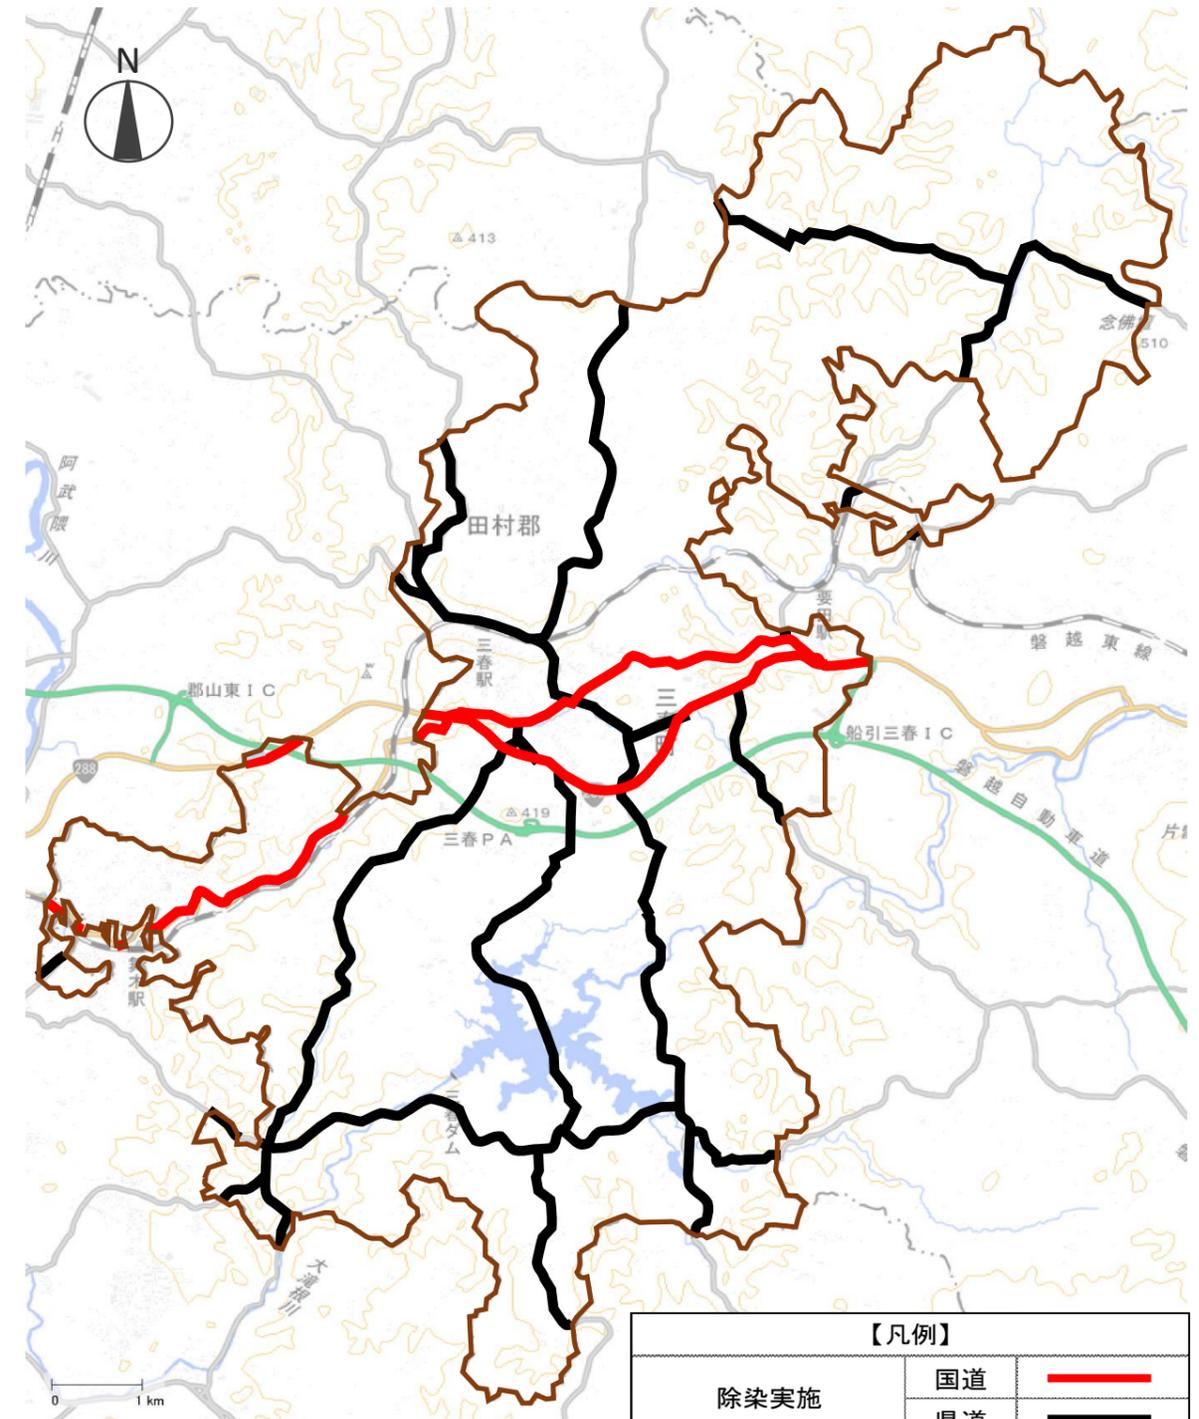

【凡例】		
除染実施	国道	— (Red line)
	県道	— (Black line)
調査にて終了 (0.23 μSV/h未満)	国道	— (Blue line)
	県道	— (Green line)
市町村界		— (Brown line)

# 広野町 【道路除染】




No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化(μSV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	いわき浪江線外	2013/9/26	2015/3/31	0.41	0.22	46.3%
②	広野停車場線外	2012/5/30	2012/9/21	1.39	1.26	9.4%
③	広野小高線外	2013/6/19	2014/3/31	0.55	0.27	50.9%

■ 他実施路線（上表路線名の「外」に含まれるもの）

- ④ 折木筒木原久ノ浜線
- ⑤ 上戸渡広野線
- ⑥ 上北迫下北迫線

# 川内村 【道路除染】

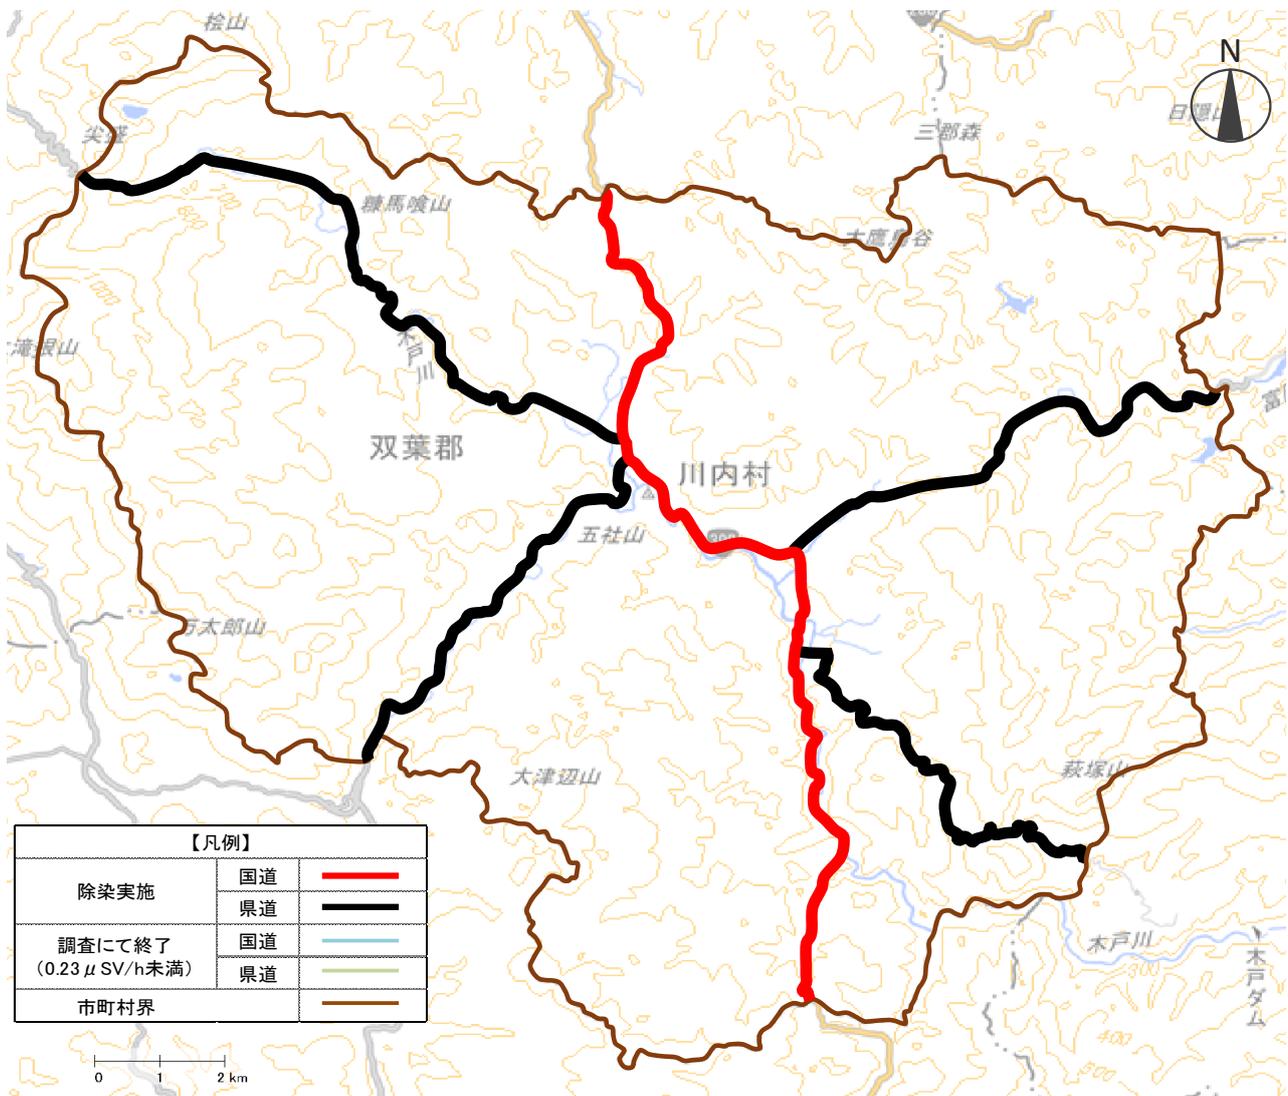

No.	契約路線河川等名	工期 (始)	工期 (終)	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
				作業前に最高地点だった箇所		
				作業前	作業後	低減率
①	国道399号外	2012/4/27	2014/3/31	0.57	0.51	10.5%
②	富岡大越線外	2014/8/18	2015/3/31	0.35	0.32	8.6%

■ 他実施路線 (上表路線名の「外」に含まれるもの)

- ③ 小野富岡線
- ④ 下川内竜田停車場線

## 資料2 除染業務契約一覧

(平成30年2月28日時点)



## 資料2 除染業務契約一覧

No.	種類	事務所	契約番号	工事名称	路線河川等名	工事箇所名	工期(始)	工期(終)	契約額	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
										作業前に最高地点だった箇所		
										作業前	作業後	低減率
1	除染作業	県北建設	12413100338	除染作業業務委託	あづま総合運動公園	福島市佐原	2012/12/28	2013/12/27	469,863,450	0.43	0.17	60.5%
2	除染作業	県北建設	12413100414	除染作業業務委託	蓬萊団地	福島市蓬萊町 地内	2013/1/18	2013/12/20	224,456,200	1.50	0.99	34.0%
3	除染作業	県北建設	12413100443	除染作業業務委託(山下町団地)	山下町団地	福島市山下町地内	2013/2/6	2013/12/20	26,769,800	1.20	0.22	81.7%
4	除染作業	県北建設	12413100444	除染作業業務委託(泉白川団地児童遊園)	泉白川団地	福島市泉字白川 地内	2013/1/22	2013/6/21	6,441,750	1.05	0.09	91.4%
5	除染作業	県北建設	12413100445	道路除染作業業務委託(除染)	金谷川停車場線	福島市松川町浅川地内	2013/1/30	2013/3/29	2,590,350	0.64	0.58	9.4%
6	除染作業	県北建設	12413100451	除染作業業務委託(笹谷団地外児童遊園)	笹谷団地 外	福島市笹谷字南田地内 外	2013/2/13	2013/6/28	11,146,800	1.16	0.20	82.8%
7	除染作業	県北建設	12413100458	除染作業業務委託(桜木町団地)	桜木町団地	福島市桜木町地内	2013/2/15	2013/12/20	36,075,550	0.94	0.36	61.7%
8	除染作業	県北建設	12413100459	除染作業業務委託(霞町団地外)	霞町団地外	福島市霞町地内外	2013/2/14	2013/12/20	28,239,950	0.90	0.19	78.9%
9	除染作業	県北建設	12413100465	除染作業業務委託(野田町団地児童遊園)	野田町団地	福島市野田町4丁目 地内	2013/2/13	2013/4/19	682,500	0.60	0.22	63.3%
10	除染作業	県北建設	13413100028	道路除染作業業務委託(除染)	国道114号	福島市豊田町 地内	2013/4/30	2013/8/16	3,873,450	1.29	0.53	58.9%
11	除染作業	県北建設	13413100029	道路除染作業業務委託(除染)	福島飯坂線	福島市曾根田町地内	2013/4/30	2013/6/13	1,062,600	2.16	1.45	32.9%
12	除染作業	県北建設	13413100030	道路除染作業業務委託(除染)	福島停車場線 外	福島市栄町地内外	2013/4/30	2013/8/16	4,024,650	0.90	0.46	48.9%
13	除染作業	県北建設	13413100061	除染作業業務委託(あづま総合運動公園)	あづま総合運動公園	福島市佐原 地内	2013/7/2	2015/2/27	642,349,440	0.76	0.25	67.1%
14	除染作業	県北建設	13413100109	道路除染作業業務委託(除染)	上名倉飯坂伊達線	福島市さくら二丁目地内	2013/7/29	2013/10/28	2,549,400	0.24	0.18	25.0%
15	除染作業	県北建設	13413100231	除染作業業務委託	あづま総合運動公園	福島市佐原 地内	2013/10/21	2015/2/27	278,938,080	1.68	0.22	86.9%
16	除染作業	県北建設	13413100243	道路除染作業業務委託(除染)	水原福島線	福島市荒町地内	2013/11/1	2014/3/28	5,066,250	2.72	0.12	95.6%
17	除染作業	県北建設	13413100321	道路除染作業業務委託(除染)	福島安達線 外	福島市松川町浅川地内 外	2014/1/30	2015/1/30	219,715,200	1.00	0.34	66.0%
18	除染作業	県北建設	13413100361	除染作業業務委託(蓬萊西地区)	蓬萊団地	福島市蓬萊町地内	2014/1/16	2014/7/31	111,102,420	0.80	0.33	58.8%
19	除染作業	県北建設	14413100068	道路除染作業業務委託(除染)	国道115号 外	福島市山口地内 外	2014/7/17	2015/3/27	420,424,560	2.48	0.51	79.4%
20	除染作業	県北建設	14413100154	道路除染作業業務委託(除染)	国道114号	福島市豊田町地内	2014/7/10	2015/3/27	91,382,040	0.59	0.17	71.2%
21	除染作業	県北建設	14413100155	道路除染作業業務委託(除染)	国道115号	福島市高野河原下地内	2014/7/10	2015/3/27	60,861,240	0.81	0.15	81.5%
22	除染作業	県北建設	14413100203	道路除染作業業務委託(除染)	折戸笹谷線 外	福島市笹谷地内 外	2014/9/18	2015/6/30	92,945,880	0.57	0.26	54.4%
23	除染作業	県北建設	14413100204	道路除染作業業務委託(除染)	上名倉飯坂伊達線 外	福島市大笹生地内 外	2014/9/18	2015/3/27	330,251,040	0.68	0.33	51.5%
24	除染作業	県北建設	14413100213	道路除染作業業務委託(除染)	庭坂福島線	福島市野田町地内	2014/8/22	2014/10/20	900,720	0.38	0.03	92.1%
25	除染作業	県北建設	14413100214	道路除染作業業務委託(除染)	福島微温湯線 外	福島市太田町地内 外	2014/8/22	2014/11/14	1,924,560	0.26	0.21	19.2%
26	除染作業	県北建設	14413100343	道路除染作業業務委託(除染)	国道114号 外	福島市渡利地内 外	2014/11/21	2016/3/30	316,942,200	0.67	0.36	46.3%
27	除染作業	県北建設	14413100367	道路除染作業業務委託(除染)	国道399号 外	福島市飯坂町 東湯野地内 外	2014/11/21	2015/9/30	44,548,920	0.39	0.16	59.0%
28	除染作業	県北建設	14413100375	道路除染作業業務委託(除染)	国道114号	福島市渡利地内	2014/12/5	2016/3/30	174,313,080	0.99	0.36	63.6%
29	除染作業	県北建設	14413100381	道路除染作業業務委託(除染)	福島飯坂線 外	福島市栄町地内 外	2015/1/6	2015/11/24	289,389,240	0.65	0.23	64.6%
30	除染作業	県北建設	14413100418	除染業務委託(森合台ノ前団地)	森合台ノ前団地	福島市森合字台ノ前地内	2015/1/29	2015/8/31	20,279,160	0.44	0.28	36.4%
31	除染作業	県北建設	14413100419	除染業務委託(北信団地)	北信団地	福島市宮代字乳児池地内	2015/2/5	2015/7/14	67,339,080	2.45	0.65	73.5%
32	除染作業	県北建設	14413100420	除染業務委託(笹谷団地)	笹谷団地	福島市笹谷字南田地内	2015/2/5	2015/8/31	50,501,880	1.26	0.09	92.9%
33	除染作業	県北建設	14413100421	除染業務委託(泉白川団地)	泉白川団地	福島市泉白川地内	2015/1/23	2015/3/31	11,953,440	0.48	0.18	62.5%
34	除染作業	県北建設	14413100430	道路除染作業業務委託(除染)	福島安達線 外	福島市松川町浅川地内 外	2015/1/22	2016/3/28	420,968,880	0.90	0.55	38.9%
35	除染作業	県北建設	14413100433	道路除染作業業務委託(除染)	霊山松川線 外	福島市松川町沼袋地内 外	2015/1/19	2015/12/16	358,875,360	1.48	0.21	85.8%
36	除染作業	県北建設	14413100435	道路除染作業業務委託(除染)	大沢広表線 外	福島市立子山地内	2015/2/10	2016/3/28	286,147,080	1.34	0.30	77.6%
37	除染作業	県北建設	14413100436	道路除染作業業務委託(除染)	川俣安達線 外	福島市飯野町地内	2015/2/13	2015/12/18	201,747,240	0.80	0.55	31.3%
38	除染作業	県北建設	15413100051	道路除染作業業務委託(除染)	福島保原線 外	福島市岡部地内 外	2015/5/18	2016/3/28	387,277,200	1.19	1.18	0.8%
39	除染作業	県北建設	15413100230	道路除染作業業務委託(除染)	土湯温泉線 外	福島市松川町水原地内 外	2015/10/5	2016/9/30	190,227,960	0.84	0.12	85.7%
40	除染作業	県北建設	15413100263	除染作業業務委託(荒井団地)	荒井団地	福島市荒井地内	2015/10/15	2016/4/20	133,238,520	0.31	0.13	58.1%
41	除染作業	県北建設	15413100332	道路除染作業業務委託(除染)	福島吾妻裏磐梯線 外	福島市太田町地内 外	2015/11/30	2016/12/20	247,122,360	0.55	0.26	52.7%
42	除染作業	県北建設	15413100340	道路除染作業業務委託(除染)	国道114号 外	福島市飯野町地内	2015/11/30	2017/3/28	817,049,160	0.68	0.26	61.8%
43	除染作業	県北建設	15413100388	道路除染作業業務委託(除染)	福島飯坂線	福島市曾根田町地内 外	2016/1/28	2017/2/28	229,334,760	0.58	0.21	63.8%

## 資料2 除染業務契約一覧

No.	種類	事務所	契約番号	工事名称	路線河川等名	工事箇所名	工期(始)	工期(終)	契約額	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
										作業前に最高地点だった箇所		
										作業前	作業後	低減率
44	除染作業	県北建設	15413100481	道路除染作業業務委託(除染)	国道114号 外	福島市渡利地内	2016/3/28	2017/1/30	305,878,680	0.87	0.65	25.3%
45	除染作業	県北建設	16413100141	道路除染作業業務委託(除染)	飯坂瀬ノ上線 外	福島市瀬ノ上町地内 外	2016/8/8	2017/3/31	105,095,880	0.35	0.15	57.1%
46	除染作業	県北建設	16413100149	道路除染作業業務委託(除染)	国道114号 外	福島市立子山地内 外	2016/8/8	2017/3/31	205,130,880	0.53	0.16	69.8%
47	除染作業	県北建設	16413100232	道路除染作業業務委託(除染)	国道399号 外	福島市飯坂町湯野地内	2016/8/8	2017/1/20	11,471,760	2.08	0.09	95.7%
48	除染作業	県北建設	16413100375	道路除染作業業務委託(除染)	国道115号 外	福島市方木田地内 外	2016/12/9	2018/3/30	145,004,040	0.46	0.17	63.0%
49	除染作業	県北建設	16413100376	道路除染作業業務委託(除染)	国道115号 外	福島市鳥谷野地内 外	2017/1/13	2018/3/30	69,018,480	0.67	0.11	83.6%
50	除染作業	県北建設	16413100377	道路除染作業業務委託(除染)	国道399号外	福島市飯坂町地内外	2016/12/9	2018/3/30	93,570,120	0.30	0.11	63.3%
51	除染作業	県北建設	16413100382	道路除染作業業務委託(除染)	福島飯坂線 外	福島市飯坂町地内外	2016/12/9	2018/3/30	59,712,120	0.35	0.13	62.9%
52	除染作業	県北建設	16413100383	道路除染作業業務委託(除染)	福島飯坂線 外	福島市飯坂町平野地内	2016/12/16	2018/3/30	51,253,560	0.40	0.17	57.5%
53	除染作業	県北建設	16413100384	道路除染作業業務委託(除染)	上名倉飯坂伊達線	福島市飯坂町平野地内	2016/12/16	2018/3/30	75,077,280	0.57	0.21	63.2%
54	除染作業	県北建設	16413100385	道路除染作業業務委託(除染)	国道399号外	福島市飯坂町湯野地内外	2016/12/16	2018/3/30	68,020,560	0.92	0.11	88.0%
55	除染作業	県北建設	16413100387	道路除染作業業務委託(除染)	飯坂瀬ノ上線 外	福島市宮代地内 外	2017/1/13	2018/3/30	204,603,840	0.55	0.18	67.3%
56	除染作業	県北建設	16413100411	道路除染作業業務委託(除染)	南福島停車場線	福島市下鳥渡地内外	2017/1/6	2018/3/30	86,427,000	0.51	0.10	80.4%
57	除染作業	県北建設	16413100417	道路除染作業業務委託(除染)	国道115号外	福島市成川地内 外	2017/1/6	2018/3/30	32,889,240	0.48	0.14	70.8%
58	除染作業	県北建設	16413100422	道路除染作業業務委託(除染)	南福島停車場線	福島市伏拝地内	2017/1/6	2018/3/30	24,980,400	0.29	0.08	72.4%
59	除染作業	県北建設	16413100428	道路除染作業業務委託(除染)	水原福島線 外	福島市大森地内 外	2017/1/13	2018/3/30	47,766,240	0.32	0.18	43.8%
60	除染作業	県北建設	16413100429	道路除染作業業務委託(除染)	水原福島線	福島市平石地内	2017/1/6	2018/3/30	40,669,560	0.55	0.15	72.7%
61	除染作業	県北建設	16413100430	道路除染作業業務委託(除染)	水原福島線	福島市小田地内	2017/1/20	2018/3/30	46,852,560	0.41	0.19	53.7%
62	除染作業	県北建設	16413100432	道路除染作業業務委託(除染)	国道115号 外	福島市荒井地内 外	2017/1/20	2018/3/30	6,813,720	0.28	調査にて終了	
63	除染作業	県北建設	16413100436	道路除染作業業務委託(除染)	飯坂保原線	福島市鎌田地内	2017/1/13	2018/3/30	142,380,720	0.68	0.09	86.8%
64	除染作業	県北建設	16413100440	道路除染作業業務委託(除染)	上名倉飯坂伊達線 外	福島市町庭坂地内 外	2017/2/3	2018/3/30	7,391,520	0.29	0.13	55.2%
65	除染作業	県北建設	16413100441	道路除染作業業務委託(除染)	上名倉飯坂伊達線 外	福島市在庭坂地内 外	2017/2/3	2018/3/30	110,160,000	0.95	0.23	75.8%
66	除染作業	県北建設	16413100442	道路除染作業業務委託(除染)	上名倉飯坂伊達線 外	福島市二子塚地内 外	2017/2/3	2018/3/30	132,283,800	0.44	0.21	52.3%
67	除染作業	県北建設	16413100443	道路除染作業業務委託(除染)	上名倉飯坂伊達線 外	福島市庄野地内 外	2017/2/24	2018/3/30	26,799,120	0.85	調査にて終了	
68	除染作業	県北建設	16413100455	河川除染作業業務委託(除染)	松川筋	福島市南矢野目地内 外	2017/2/3	2018/3/30	105,952,320	0.68	0.20	70.6%
71	除染作業	保原土木	12413110039	道路除染作業業務委託(除染)	飯坂桑折線	伊達郡桑折町大字松原地内	2012/11/8	2013/4/30	25,621,050	0.55	0.48	12.7%
72	除染作業	保原土木	12413110056	道路除染作業業務委託(除染)	国見福島線	伊達郡桑折町大字北半田地内 外	2012/11/8	2013/4/30	18,834,900	0.62	0.35	43.5%
73	除染作業	保原土木	12413110070	道路除染作業業務委託(除染)	国道349号 外	伊達市保原町柱田地内 外	2013/1/21	2014/1/31	268,249,800	6.70	1.85	72.4%
74	除染作業	保原土木	12413110071	道路除染作業業務委託(除染)	山口保原線 外	伊達市保原町富沢地内 外	2013/1/21	2014/2/28	162,068,550	5.54	0.99	82.1%
75	除染作業	保原土木	12413110073	道路除染作業業務委託(除染)	霊山松川線 外	伊達市霊山町上小国地内 外	2013/1/21	2013/7/31	186,988,200	3.30	1.21	63.3%
76	除染作業	保原土木	12413110074	道路除染作業業務委託(除染)	国道115号 外	伊達市霊山町石田地内 外	2013/1/21	2013/12/6	239,397,900	4.00	2.17	45.8%
77	除染作業	保原土木	13413110019	道路除染作業業務委託(除染)	丸森霊山線 外	伊達市霊山町中川地内	2013/6/17	2013/12/20	45,806,250	1.15	0.42	63.5%
78	除染作業	保原土木	13413110026	道路除染作業業務委託(除染)	月館・川俣線	伊達市月館町糠田字宮前地内	2013/7/8	2013/11/29	14,775,600	1.36	0.73	46.3%
79	除染作業	保原土木	13413110027	道路除染作業業務委託(除染)	月館・川俣線	伊達市月館町糠田字美内地内	2013/7/8	2013/12/20	34,095,600	1.00	0.33	67.0%
80	除染作業	保原土木	13413110031	道路除染作業業務委託(除染)	月館・川俣線	伊達市月館町上手渡地内	2013/7/18	2013/10/31	8,040,900	0.66	0.35	47.0%
81	除染作業	保原土木	13413110033	道路除染作業業務委託(除染)	浪江国見線 外	伊達郡桑折町大字伊達崎地内 外	2013/7/29	2014/3/28	72,194,850	1.06	0.39	63.2%
82	除染作業	保原土木	13413110035	道路除染作業業務委託(除染)	国道349号	伊達市月館町月館地内	2013/8/8	2013/12/25	14,075,250	1.06	0.82	22.6%
83	除染作業	保原土木	13413110038	道路除染作業業務委託(除染)	国道349号	伊達市月館町下手渡地内	2013/8/8	2013/12/13	35,584,500	1.41	0.45	68.1%
84	除染作業	保原土木	13413110042	道路除染作業業務委託(除染)	広畑・月館線外	伊達市月館町布川地内	2013/8/27	2013/12/16	38,764,950	1.30	0.76	41.5%
85	除染作業	保原土木	13413110045	道路除染作業業務委託(除染)	国道349号	伊達市月館町御代田(1工区)地内	2013/8/27	2014/3/31	8,225,700	1.32	0.34	74.2%
86	除染作業	保原土木	13413110046	道路除染作業業務委託(除染)	国道349号外	伊達市月館町御代田(2工区)地内	2013/8/30	2014/2/14	24,913,350	1.38	0.93	32.6%
87	除染作業	保原土木	13413110047	道路除染作業業務委託(除染)	国道349号外	伊達市月館町御代田(4工区)地内	2013/8/30	2014/5/16	25,310,250	1.60	0.61	61.9%
88	除染作業	保原土木	13413110050	道路除染作業業務委託(除染)	国道115号 外	伊達市霊山町山戸田地内	2013/9/9	2014/3/28	43,115,100	1.52	0.34	77.6%

## 資料2 除染業務契約一覧

No.	種類	事務所	契約番号	工事名称	路線河川等名	工事箇所名	工期(始)	工期(終)	契約額	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
										作業前に最高地点だった箇所		
										作業前	作業後	低減率
89	除染作業	保原土木	13413110051	道路除染作業業務委託(除染)	梁川霊山線 外	伊達市霊山町山野川地内	2013/9/9	2014/1/31	66,835,650	0.88	0.54	38.6%
90	除染作業	保原土木	13413110052	道路除染作業業務委託(除染)	国道349号	伊達市保原町村岡八幡台地内	2013/9/9	2013/12/27	17,595,900	0.78	0.30	61.5%
91	除染作業	保原土木	13413110072	道路除染作業業務委託(除染)	福島保原線	伊達市保原町上保原(2工区)地内	2013/12/18	2014/3/31	43,684,200	1.50	0.49	67.3%
92	除染作業	保原土木	13413110073	道路除染作業業務委託(除染)	国道399号外	伊達市保原町上保原(3工区)地内	2013/12/18	2014/3/31	67,476,150	1.08	0.35	67.6%
93	除染作業	保原土木	13413110079	道路除染作業業務委託(除染)	赤井畑国見線	伊達郡国見町大字藤田地内 外	2014/2/4	2014/9/30	16,372,800	0.74	0.45	39.2%
94	除染作業	保原土木	13413110082	道路除染作業業務委託(除染)	国見福島線 外	伊達郡桑折町大字万正寺地内 外	2014/2/6	2014/7/31	31,024,080	0.48	0.16	66.7%
95	除染作業	保原土木	14413110014	道路除染作業業務委託(除染)	国道115号 外	伊達市霊山町石田(1工区)地内	2014/6/5	2014/11/28	24,764,400	0.45	0.20	55.6%
96	除染作業	保原土木	14413110015	道路除染作業業務委託(除染)	国道115号 外	伊達市霊山町石田(2工区)地内	2014/6/5	2014/11/28	41,550,840	0.90	0.33	63.3%
97	除染作業	保原土木	14413110016	道路除染作業業務委託(除染)	国道115号 外	伊達市霊山町石田(3工区)地内	2014/6/5	2014/12/19	92,463,120	1.18	0.67	43.2%
98	除染作業	保原土木	14413110045	道路除染作業業務委託(除染)	五十沢国見線	伊達郡国見町大字西大枝地内	2014/9/29	2015/2/20	13,655,520	0.29	0.18	37.9%
99	除染作業	保原土木	14413110049	道路除染作業業務委託(除染)	丸森霊山線 外	伊達市霊山町大石地内外	2014/10/27	2015/10/19	84,896,640	0.24	0.12	50.0%
100	除染作業	保原土木	14413110054	道路除染作業業務委託(除染)	国道349号 外	伊達市保原町字赤橋地内 外	2014/10/27	2015/8/31	118,233,000	0.28	0.11	60.7%
101	除染作業	保原土木	14413110055	道路除染作業業務委託(除染)	国道399号外	伊達市伏黒地内外	2014/10/27	2015/8/31	72,281,160	0.74	0.21	71.6%
102	除染作業	保原土木	15413110004	道路除染作業業務委託(除染)	浪江国見線 外	伊達市梁川町栄町 外	2015/8/10	2017/2/28	78,392,880	0.50	0.43	14.0%
103	除染作業	保原土木	16413110055	道路除染作業業務委託(除染)	白石国見線外	伊達郡国見町大字小坂地内外	2016/10/7	2017/7/31	206,653,680	0.47	0.15	68.1%
104	除染作業	保原土木	16413110059	道路除染作業業務委託(除染)	国道349号 外	伊達市梁川町五十沢地内 外	2016/10/21	2017/9/29	161,078,760	0.33	0.26	21.2%
105	除染作業	保原土木	16413110062	除染作業業務委託(除染)	佐久間川筋 外	伊達郡桑折町大字伊達崎地内 外	2016/10/28	2017/3/31	26,004,240	0.45	0.36	20.0%
106	除染作業	保原土木	16413110063	除染作業業務委託(除染)	産ヶ沢川筋	伊達郡桑折町大字南半田地内	2016/10/24	2017/2/27	10,085,040	0.47	0.34	27.7%
107	除染作業	保原土木	16413110066	除染作業業務委託(除染)	滝川筋 外	伊達郡国見町大字山崎地内 外	2016/11/25	2017/7/21	15,291,720	0.45	0.35	22.2%
108	除染作業	保原土木	16413110071	道路除染作業業務委託(除染)	梁川霊山線外	伊達市梁川町細谷地内外	2017/1/10	2017/10/20	42,169,680	0.63	0.22	65.1%
110	除染作業	二本松土木	12413120042	道路除染作業業務委託(除染)	原町二本松線 外	二本松市安達ヶ原地内 外	2012/7/4	2012/12/28	16,156,350	1.79	0.73	59.2%
111	除染作業	二本松土木	12413120046	道路除染作業業務委託(除染)	本宮土湯温泉線 外	安達郡大玉村大山地内 外	2012/7/23	2013/3/29	19,916,400	1.01	0.64	36.6%
112	除染作業	二本松土木	12413120066	公園除染作業業務委託(除染)	安達太良川筋	本宮市本宮	2012/10/31	2013/3/29	14,365,050	1.34	0.20	85.1%
113	除染作業	二本松土木	12413120068	道路除染作業業務委託(除染)	国道349号 外	二本松市針道地内	2012/12/3	2013/9/30	30,225,300	1.09	0.75	30.9%
114	除染作業	二本松土木	12413120072	道路除染作業業務委託(除染)	国道459号 外	二本松市小浜地内 外	2012/12/3	2014/3/28	139,659,450	1.15	0.71	38.3%
115	除染作業	二本松土木	12413120081	道路除染作業業務委託(除染)	二本松安達線 外	二本松市金色地内 外	2012/12/3	2013/11/29	21,191,100	0.89	0.40	55.1%
116	除染作業	二本松土木	12413120083	道路除染作業業務委託(除染)	須賀川二本松線	二本松市杉田地内	2013/1/7	2013/10/31	4,017,300	1.12	0.87	22.3%
117	除染作業	二本松土木	12413120084	道路除染作業業務委託(除染)	飯野三春石川線 外	二本松市木幡 地内	2013/1/17	2013/11/29	53,712,750	1.51	0.60	60.5%
118	除染作業	二本松土木	12413120096	道路除染作業業務委託(除染)	川俣安達線 外	二本松市下川崎 地内外	2013/2/25	2013/11/29	81,023,250	1.63	0.62	62.0%
119	除染作業	二本松土木	12413120097	道路除染作業業務委託(除染)	本宮土湯温泉線 外	安達郡大玉村大山地内 外	2013/3/11	2014/3/28	33,732,300	1.94	0.97	50.0%
120	除染作業	二本松土木	13413120006	道路除染作業業務委託(除染)	飯野三春石川線 外	二本松市太田	2013/5/22	2014/3/19	100,387,350	1.02	0.48	52.9%
121	除染作業	二本松土木	14413120028	道路除染作業業務委託(除染)	安達太良山線 外	二本松市塩沢町 地内 外	2014/7/16	2015/3/6	56,450,520	0.32	0.22	30.2%
122	除染作業	二本松土木	14413120029	道路除染作業業務委託(除染)	国道459号 外	二本松市百目木地内 外	2014/10/14	2015/8/28	43,909,560	0.67	0.28	58.2%
123	除染作業	二本松土木	14413120042	道路除染作業業務委託(除染)	馬場平杉田線	二本松市館野原地内 外	2014/12/8	2015/7/10	10,036,440	0.57	0.23	59.6%
124	除染作業	二本松土木	15413120045	道路除染作業業務委託(除染)	国道459号 外	二本松市成田日向 地内 外	2015/7/27	2016/2/29	22,998,600	0.60	0.21	65.0%
125	除染作業	二本松土木	15413120046	道路除染作業業務委託(除染)	本宮三春線 外	本宮市本宮 地内 外	2015/7/27	2016/11/30	195,740,280	1.32	0.76	42.4%
126	除染作業	二本松土木	15413120056	道路除染作業業務委託(除染)	馬場平杉田線	二本松市箕輪 地内	2015/10/13	2016/3/28	12,384,360	0.32	0.29	9.4%
127	除染作業	二本松土木	16413120010	道路除染作業業務委託(除染)	国道459号 外	二本松市永田地内 外	2016/6/7	2017/1/9	40,512,960	0.46	0.11	75.6%
128	除染作業	二本松土木	16413120049	道路除染作業業務委託(除染)	国道459号 外	二本松市永田 地内 外	2016/11/24	2018/1/31	178,325,280	1.31	0.34	74.0%
129	除染作業	二本松土木	16413120052	道路除染作業業務委託(除染)	本宮熱海線 外	本宮市荒井 地内 外	2016/12/14	2018/2/28	729,203,040	1.17	0.90	23.1%
130	除染作業	二本松土木	16413120060	公園除染作業業務委託(除染)	六角川 筋	二本松市本町2丁目地内 外	2017/1/5	2017/10/29	65,090,520	0.78	0.27	65.4%
131	除染作業	県中建設	12413200277	除染作業業務委託(除染)	県営住宅柴宮団地 外	郡山市安積町荒井字柴宮山 地内外	2012/10/10	2013/3/22	88,375,350	1.05	0.22	79.0%
132	除染作業	県中建設	12413200440	五百淵団地除染作業業務委託(除染)	県営住宅五百淵団地	郡山市五百淵山 地内	2012/12/21	2013/6/14	23,882,250	0.75	0.31	58.7%

## 資料2 除染業務契約一覧

No.	種類	事務所	契約番号	工事名称	路線河川等名	工事箇所名	工期(始)	工期(終)	契約額	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
										作業前に最高地点だった箇所		
										作業前	作業後	低減率
133	除染作業	県中建設	12413200486	高倉団地外除染作業業務委託(除染)	県営住宅高倉団地 外	郡山市日和田町高倉字町裏 地内外	2013/2/4	2013/7/12	47,827,500	1.00	0.42	58.0%
134	除染作業	県中建設	13413200229	除染作業業務委託(除染)	県営住宅柴宮団地 外	郡山市安積町荒井字柴宮山 地内外	2013/9/19	2014/3/28	263,445,000	0.85	0.38	55.3%
135	除染作業	県中建設	13413200337	除染作業業務委託(除染)	郡山湖南線 外	郡山市開成三丁目地内 外	2013/10/11	2014/9/30	67,667,400	1.44	0.47	67.4%
136	除染作業	県中建設	13413200338	除染作業業務委託(除染)	須賀川二本松線 外	郡山市日和田町高倉地内 外	2013/10/11	2014/8/30	64,554,840	1.11	0.77	30.6%
137	除染作業	県中建設	13413200431	除染作業業務委託(除染)	逢瀬公園	郡山市逢瀬町河内地内	2013/12/18	2014/12/25	32,598,720	0.53	0.31	41.5%
138	除染作業	県中建設	14413200204	除染作業業務委託(除染)	郡山湖南線 外	郡山市堂前町地内 外	2014/8/5	2015/3/31	76,447,800	1.15	0.31	73.0%
139	除染作業	県中建設	14413200284	除染作業業務委託(除染)	郡山湖南線 外	郡山市台新1丁目地内 外	2014/9/29	2015/9/30	103,634,640	0.54	0.38	29.6%
140	除染作業	県中建設	14413200399	除染作業業務委託(除染)	仁池向団地	郡山市大槻町字仁池向 地内	2014/12/24	2015/4/30	12,076,560	0.35	0.18	48.6%
141	除染作業	県中建設	15413200084	除染作業業務委託(除染)	荒井郡山線	郡山市喜久田町 堀之内地内外	2015/6/30	2016/3/31	58,836,240	0.77	0.27	64.9%
142	除染作業	県中建設	15413200115	除染作業業務委託(除染)	仁井田郡山線 外	郡山市大槻町字原田東地内外	2015/7/1	2015/12/24	21,594,600	0.51	0.16	68.6%
143	除染作業	県中建設	15413200147	除染作業業務委託(除染)	荒井郡山線外	郡山市喜久田町堀之内字森子段地内外	2015/8/19	2016/6/17	56,108,160	0.91	0.72	20.9%
144	除染作業	県中建設	15413200152	除染作業業務委託(除染)	長沼喜久田線	郡山市熱海町上伊豆島地内外	2015/8/17	2016/5/31	74,644,200	1.02	0.15	85.3%
145	除染作業	県中建設	15413200200	除染作業業務委託(除染)	荒井郡山線	郡山市喜久田町字遠北原地内外	2015/9/11	2016/7/15	96,965,640	0.66	0.51	22.7%
146	除染作業	県中建設	15413200201	除染作業業務委託(島団地外)	島団地 外	郡山市島二丁目地内 外	2015/9/16	2016/1/29	13,457,880	0.41	0.21	48.8%
147	除染作業	県中建設	15413200211	除染作業業務委託(除染)	岩根日和田線外	郡山市日和田町字泥夫地内外	2015/9/11	2017/3/24	94,535,640	0.66	0.14	78.8%
148	除染作業	県中建設	15413200223	除染作業業務委託(除染)	須賀川二本松線 外	郡山市富久山町八山田字牛ヶ池地内外	2015/10/9	2016/11/18	69,097,320	0.73	0.49	32.9%
149	除染作業	県中建設	15413200267	除染作業業務委託(除染)	郡山大越線外	郡山市大町2丁目地内外	2015/12/10	2017/1/31	181,867,680	0.72	0.23	68.1%
150	除染作業	県中建設	15413200312	除染作業業務委託(除染)	郡山長沼線外	郡山市安積町成田地内外	2015/12/10	2017/6/30	199,164,960	0.51	0.20	60.8%
151	除染作業	県中建設	15413200331	除染作業業務委託(除染)	仁井田郡山線外	郡山市安積町 荒井地内外	2016/1/6	2017/3/31	114,233,760	0.55	0.15	72.7%
152	除染作業	県中建設	15413200344	除染作業業務委託(除染)	三春日和田線外	郡山市日和田町八丁目地内外	2016/1/6	2017/2/15	59,004,720	0.65	0.18	72.3%
153	除染作業	県中建設	15413200351	除染作業業務委託(除染)	長沼喜久田線外	郡山市逢瀬町 河内地内外	2016/2/2	2017/3/31	83,796,120	1.32	0.21	84.1%
154	除染作業	県中建設	15413200364	除染作業業務委託(除染)	芦ノ口大槻線外	郡山市大槻町字上ノ山地内外	2016/2/2	2017/3/31	91,434,960	0.51	0.11	78.4%
155	除染作業	県中建設	15413200376	除染作業業務委託(除染)	荒井郡山線外	郡山市富久山町久保田字三御堂地内外	2016/2/15	2016/11/17	135,528,120	0.41	0.38	7.3%
156	除染作業	県中建設	15413200396	除染作業業務委託(除染)	二本松金屋線 外	郡山市富久山町堂坂字夢田地内外	2016/3/9	2017/3/31	123,479,640	0.64	0.15	76.6%
157	除染作業	県中建設	15413200401	除染作業業務委託(除染)	岩根日和田線外	郡山市喜久田町 前田沢字小室山地内外	2016/2/23	2017/2/28	114,199,200	0.66	0.20	69.7%
158	除染作業	県中建設	15413200403	除染作業業務委託(除染)	郡山大越線外	郡山市向河原町地内外	2016/2/15	2016/12/15	57,609,360	0.47	0.20	57.4%
159	除染作業	県中建設	15413200406	除染作業業務委託(緑ヶ丘団地)	緑ヶ丘団地	郡山市緑ヶ丘東5丁目地内	2016/2/12	2016/4/28	1,271,160	0.22	調査にて終了	
160	除染作業	県中建設	15413200407	除染作業業務委託(除染)	小野郡山線外	郡山市水門町地内外	2016/3/1	2016/10/31	23,697,360	0.25	0.19	24.0%
161	除染作業	県中建設	16413200076	除染作業業務委託(除染)	二本松金屋線	郡山市西田町鬼生田字日向地内外	2016/6/8	2017/7/31	60,983,280	1.45	0.22	84.8%
162	除染作業	県中建設	16413200078	除染作業業務委託(除染)	二本松三春線外	郡山市西田町丹伊田字塚地内外	2016/6/8	2017/7/31	58,633,200	0.82	0.22	73.2%
163	除染作業	県中建設	16413200079	除染作業業務委託(除染)	二本松金屋線 外	郡山市西田町芹沢字川前地内外	2016/6/8	2017/5/31	34,422,840	0.66	0.20	69.7%
164	除染作業	県中建設	16413200084	除染作業業務委託(除染)	郡山長沼線外	郡山市三穂田町駒屋字土部地内外	2016/6/7	2017/3/13	102,378,600	0.54	0.27	50.0%
165	除染作業	県中建設	16413200089	除染作業業務委託(除染)	郡山長沼線外	郡山市三穂田町駒屋字上佐武坦地内外	2016/6/7	2017/4/28	132,864,840	0.41	0.18	56.1%
166	除染作業	県中建設	16413200114	除染作業業務委託(除染)	河内郡山線外	郡山市富田町字上西田地内外	2016/7/5	2017/3/31	126,810,360	0.57	0.45	21.1%
167	除染作業	県中建設	16413200115	除染作業業務委託(除染)	阿久津舞木停車場線外	郡山市阿久津町字石橋地内外	2016/7/6	2017/4/28	57,464,640	0.67	0.20	70.1%
168	除染作業	県中建設	16413200116	除染作業業務委託(除染)	本宮熱海線外	郡山市熱海町玉川字竹ノ内地内外	2016/7/6	2017/6/30	97,869,600	0.49	0.20	59.2%
169	除染作業	県中建設	16413200117	除染作業業務委託(除染)	郡山長沼線外	郡山市三穂田町富岡字鹿ノ崎地内外	2016/7/4	2017/6/30	146,575,440	0.37	0.22	40.5%
170	除染作業	県中建設	16413200255	除染作業業務委託(除染)	郡山停車場線外	郡山市大町1丁目地内外	2016/8/30	2017/3/31	47,601,000	0.48	0.43	10.4%
171	除染作業	県中建設	16413200276	除染作業業務委託(除染)	郡山矢吹線外	郡山市三穂田町野田字北田地内外	2017/1/16	2017/8/31	90,467,280	0.39	0.21	46.2%
172	除染作業	県中建設	16413200376	除染作業業務委託(除染)	国道288号	郡山市西田町 大田字宮田地内外	2017/1/16	2017/9/29	88,666,920	0.33	0.19	42.4%
173	除染作業	県中建設	16413200377	除染作業業務委託(除染)	三春日和田線外	郡山市西田町 三町目字ソフ田地内外	2017/1/16	2017/9/29	74,283,480	0.43	0.16	62.8%
174	除染作業	県中建設	16413200419	除染作業業務委託(芦田塚団地外)	芦田塚団地外	須賀川市芦田塚地内外	2016/12/7	2017/3/21	2,565,000	0.17	調査にて終了	

## 資料2 除染業務契約一覧

No.	種類	事務所	契約番号	工事名称	路線河川等名	工事箇所名	工期(始)	工期(終)	契約額	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
										作業前に最高地点だった箇所		
										作業前	作業後	低減率
175	除染作業	三春土木	12413210079	除染作業業務委託(除染)	(一)本宮常葉線	田村郡三春町大字富沢 地内外	2012/11/28	2013/7/31	22,857,450	0.99	0.82	17.2%
176	除染作業	三春土木	13413210104	除染作業業務委託(除染)	国道288号外	田村郡都路町古道地内外	2013/11/18	2015/3/31	532,956,240	1.32	1.09	17.4%
177	除染作業	三春土木	14413210066	除染作業業務委託(除染)	本宮常葉線 外	田村郡三春町大字富沢地内 外	2014/8/12	2015/5/18	33,076,080	0.37	0.24	35.1%
178	除染作業	三春土木	14413210112	除染作業業務委託(除染)	須賀川三春線 外	田村郡三春町大字斎藤地内 外	2015/3/30	2016/3/11	145,721,160	0.78	0.36	53.8%
179	除染作業	三春土木	15413210038	除染作業業務委託(除染)	本宮三春線 外	田村郡三春町大字大町地内 外	2015/6/9	2017/3/24	90,685,440	0.39	0.22	43.6%
180	除染作業	三春土木	15413210039	除染作業業務委託(除染)	郡山大越線 外	田村郡三春町大字樋渡地内 外	2015/6/8	2016/6/30	113,462,640	0.25	0.14	44.0%
181	除染作業	三春土木	15413210040	除染作業業務委託(除染)	谷田川三春線	田村郡三春町大字貝山地内 外	2015/7/9	2016/7/29	125,058,600	0.66	0.07	89.4%
182	除染作業	三春土木	15413210059	除染作業業務委託(除染)	飯野三春石川線	田村郡三春町大字込木地内 外	2015/7/9	2016/6/30	100,510,200	0.67	0.10	85.1%
183	除染作業	三春土木	15413210062	除染作業業務委託(除染)	国道288号 外	田村郡三春町大字下舞木地内 外	2015/7/24	2017/3/24	124,637,400	0.37	0.25	32.4%
184	除染作業	三春土木	15413210063	除染作業業務委託(除染)	国道288号	田村郡三春町大字熊耳地内 外	2015/7/24	2017/3/24	116,848,440	0.49	0.18	63.3%
185	除染作業	須賀川土木	13413220060	除染作業業務委託(除染)	国道294号	岩瀬郡天栄村大字大里字沢邸地内	2013/7/25	2014/2/3	19,114,200	0.70	0.60	14.3%
186	除染作業	須賀川土木	13413220075	除染作業業務委託(除染)	国道118号 外	須賀川市長沼字堀込地内 外	2013/9/27	2014/10/31	104,222,040	0.64	0.38	40.6%
187	除染作業	須賀川土木	13413220076	除染作業業務委託(除染)	安積長沼線 外	須賀川市仁井田地内 外	2013/9/27	2014/8/29	96,230,400	0.40	0.27	32.5%
188	除染作業	須賀川土木	14413220048	除染作業業務委託(除染)	国道294号 外	岩瀬郡天栄村大字下松本地内 外	2014/7/3	2016/1/22	104,092,560	3.48	0.07	98.0%
189	除染作業	須賀川土木	14413220051	除染作業業務委託(除染)	国道118号 外	須賀川市花の里地内 外	2014/8/4	2016/2/5	198,834,480	1.37	0.12	91.2%
190	除染作業	須賀川土木	15413220052	除染作業業務委託(除染)	下松本鏡石停車場線 外	岩瀬郡鏡石町岡ノ内地内 外	2015/10/23	2016/3/11	10,573,200	1.24	0.08	93.5%
191	除染作業	須賀川土木	15413220081	除染作業業務委託(除染)	国道294号 外	岩瀬郡天栄村大字上松本地内 外	2015/12/25	2017/1/31	68,756,040	1.32	0.18	86.4%
192	除染作業	須賀川土木	15413220082	除染作業業務委託(除染)	十日市矢吹線 外	岩瀬郡天栄村大字小川地内 外	2015/12/25	2017/1/31	69,549,840	0.59	0.09	84.7%
193	除染作業	須賀川土木	15413220083	除染作業業務委託(除染)	国道118号 外	須賀川市長沼地内 外	2016/1/15	2017/1/31	98,337,240	0.51	0.21	58.8%
194	除染作業	須賀川土木	15413220084	除染作業業務委託(除染)	中野須賀川線 外	須賀川市柱田地内 外	2016/1/15	2016/12/28	64,713,600	0.59	0.21	64.4%
195	除染作業	須賀川土木	15413220085	除染作業業務委託(除染)	中野須賀川線 外	須賀川市袋田地内 外	2016/1/19	2017/3/31	66,143,520	0.63	0.06	90.5%
196	除染作業	須賀川土木	15413220086	除染作業業務委託(除染)	木ノ崎岩淵線 外	須賀川市泉田地内 外	2016/1/19	2017/3/31	96,448,320	1.02	0.09	91.2%
197	除染作業	須賀川土木	16413220059	除染作業業務委託(除染)	国道294号 外	岩瀬郡天栄村大字牧之内地内	2016/10/6	2017/3/31	55,453,680	0.51	0.19	62.7%
198	除染作業	石川土木	14413230047	除染作業業務委託(除染)	三株下市萱小川線	石川郡古殿町大字山上字犬仏地内	2014/9/9	2015/2/17	8,306,280	0.54	0.19	64.8%
199	除染作業	県南建設	12413300385	道路除染作業業務委託(除染)	矢吹天栄線 外	白河市大信下小屋地内 外	2013/2/28	2014/3/31	66,985,800	0.82	0.52	36.6%
200	除染作業	県南建設	13413300081	除染業務委託(県営住宅)	松風の里団地 外	白河市鬼越地内 外	2013/6/24	2014/3/20	95,786,250	0.29	0.18	37.9%
201	除染作業	県南建設	13413300140	道路除染作業業務委託(除染)	国道294号 外	白河市大信増見地内 外	2013/9/18	2014/6/30	56,104,650	0.66	0.24	63.6%
202	除染作業	県南建設	13413300146	除染業務委託(県営住宅)	真舟団地 外	白河市真舟 地内	2013/9/30	2014/3/20	62,545,350	0.44	0.21	52.3%
203	除染作業	県南建設	13413300213	道路除染作業業務委託(除染)	郡山矢吹線	西白河郡矢吹町本郷町地内	2013/11/21	2014/5/30	11,598,120	0.31	0.20	35.5%
204	除染作業	県南建設	13413300224	道路除染作業業務委託(除染)	塙泉崎線	西白河郡泉崎村大字泉崎地内	2013/12/27	2014/7/31	19,119,240	0.55	0.20	63.6%
207	除染作業	県南建設	14413300283	道路除染作業業務委託(除染)	須賀川矢吹線 外	西白河郡矢吹町五本松地内 外	2015/2/10	2015/7/14	17,390,160	0.27	0.09	66.7%
208	除染作業	県南建設	14413300286	道路除染作業業務委託(除染)	塙泉崎線 外	西白河郡泉崎村大字泉崎地内 外	2015/2/10	2015/7/29	23,041,800	0.58	0.13	77.6%
209	除染作業	県南建設	14413300295	道路除染作業業務委託(除染)	白坂停車場線	白河市白坂愛宕山地内	2015/2/6	2015/3/26	8,484,480	0.74	0.19	74.3%
210	除染作業	県南建設	14413300296	道路等除染作業業務委託(除染)	国道294号 外	白河市白坂地内 外	2015/3/19	2016/3/18	290,109,600	0.40	0.19	52.5%
211	除染作業	県南建設	15413300183	道路等除染作業業務委託(除染)	棚倉矢吹線 外	西白河郡中島村大字中島地内 外	2015/10/1	2016/3/25	8,831,160	0.35	0.21	40.0%
212	除染作業	県南建設	15413300191	道路等除染作業業務委託(除染)	塙泉崎線 外	西白河郡泉崎村大字北平山地内 外	2015/10/14	2016/3/18	40,005,360	0.33	0.22	33.3%
213	除染作業	県南建設	15413300202	道路等除染作業業務委託(除染)	棚倉矢吹線 外	西白河郡矢吹町新町地内 外	2015/10/14	2016/3/18	22,073,040	0.35	0.16	54.3%
214	除染作業	県南建設	15413300203	道路等除染作業業務委託(除染)	泉崎石川線 外	西白河郡矢吹町松倉地内 外	2015/10/14	2016/3/18	27,352,080	0.38	0.16	57.9%
215	除染作業	県南建設	15413300211	道路等除染作業業務委託(除染)	那須西郷線 外	西白河郡西郷村大字小田倉地内外	2015/10/27	2016/11/30	99,798,480	0.88	0.14	84.1%
216	除染作業	県南建設	15413300272	道路等除染作業業務委託(除染)	増見小田倉線	西白河郡西郷村大字羽太地内外	2016/1/26	2016/10/28	60,949,800	1.10	0.18	83.6%
217	除染作業	県南建設	15413300282	道路等除染作業業務委託(除染)	国道289号 外	白河市老久保地内 外	2016/3/18	2017/2/10	185,303,160	0.29	0.11	62.1%
218	除染作業	県南建設	15413300283	道路等除染作業業務委託(除染)	国道289号	西白河郡西郷村大字真船地内 外	2016/3/23	2016/11/30	60,320,160	0.39	0.18	53.8%
219	除染作業	県南建設	15413300284	道路等除染作業業務委託(除染)	白河羽鳥線 外	西白河郡西郷村大字羽太地内 外	2016/3/23	2016/12/28	74,373,120	0.66	0.19	71.2%

## 資料2 除染業務契約一覧

No.	種類	事務所	契約番号	工事名称	路線河川等名	工事箇所名	工期(始)	工期(終)	契約額	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
										作業前に最高地点だった箇所		
										作業前	作業後	低減率
220	除染作業	棚倉土木	13413310026	道路除染作業業務委託(除染)	黒磯棚倉線	東白川郡棚倉町大字戸中地内外	2013/9/11	2013/12/27	19,341,000	1.30	0.34	73.8%
221	除染作業	棚倉土木	13413310039	道路除染作業業務委託(除染)	山本不動線	東白川郡棚倉町大字北山本地内	2013/11/6	2014/2/5	2,973,600	0.43	0.24	44.2%
222	除染作業	相双建設	12413700189	除染推進(高松団地公園除染)委託	高松団地	南相馬市原町区上北高平地内	2012/7/23	2012/9/5	1,231,650	0.73	0.36	50.7%
223	除染作業	相双建設	12413700400	除染作業業務委託(除染推進)	原町二本松線外	南相馬市原町区押釜地内外	2012/12/25	2013/6/28	54,748,050	18.60	3.16	83.0%
224	除染作業	相双建設	12413700431	除染作業業務委託(除染推進)	大芦鹿島線	南相馬市鹿島区檜原地内	2013/2/12	2013/8/30	39,060,000	11.30	1.04	90.8%
225	除染作業	相双建設	12413700445	除染推進(県営住宅公園除染)委託	高松団地 外	南相馬市原町区上北高平外	2013/1/28	2013/5/31	13,804,350	0.59	0.17	71.2%
226	除染作業	相双建設	13413700145	除染作業業務委託(除染推進)	原町川俣線	南相馬市原町区大原地内	2013/8/16	2013/12/27	59,164,350	16.00	1.33	91.7%
227	除染作業	相双建設	13413700155	除染作業業務委託(除染推進)	国道115号	相馬市東玉野地内	2013/10/28	2014/5/30	27,888,840	1.75	0.21	88.0%
228	除染作業	相双建設	13413700203	除染作業業務委託(除染推進)	相馬浪江線 外	南相馬市原町区馬場	2013/11/20	2014/5/30	40,961,160	11.50	1.96	83.0%
229	除染作業	相双建設	13413700210	除染作業業務委託(除染推進)	草野大倉鹿島線	南相馬市鹿島区上柘窪地内	2013/11/20	2014/3/25	15,293,250	5.05	0.37	92.7%
230	除染作業	相双建設	13413700430	除染作業業務委託(除染推進)	相馬浪江線 外	南相馬市原町区大木戸地内外	2014/2/25	2014/7/31	31,542,480	1.76	0.99	43.8%
231	除染作業	相双建設	13413700456	除染作業業務委託(除染推進)	相馬浪江線外	南相馬市原町区深野地内外	2014/3/25	2014/10/31	69,582,240	5.98	3.00	49.8%
232	除染作業	相双建設	14413700104	除染作業業務委託(除染推進)	相馬浪江線外	南相馬市鹿島区小池地内外	2014/7/1	2014/12/25	64,999,800	2.33	0.21	91.0%
233	除染作業	相双建設	14413700153	除染作業業務委託(除染推進)	馬場太田線外	南相馬市原町区上太田地内外	2014/9/29	2015/1/30	30,306,960	2.63	0.35	86.7%
234	除染作業	相双建設	14413700390	除染作業業務委託(除染推進)	浪江鹿島線 外	南相馬市原町区南町地内外	2015/1/26	2015/9/30	92,411,280	0.32	0.11	65.6%
235	除染作業	相双建設	15413700188	除染作業業務委託(除染推進)	小浜字町線 外	南相馬市原町区錦町 外	2015/10/19	2016/3/31	42,346,800	0.34	0.17	50.0%
236	除染作業	相双建設	15413700294	除染作業業務委託(除染推進)	新田川筋(大原水辺公園)	南相馬市原町区深野地内	2015/12/14	2016/3/31	23,205,960	1.04	0.80	23.1%
237	除染作業	相双建設	15413700370	除染作業業務委託(除染推進)	国道115号	相馬市山上地内	2016/3/9	2016/10/31	50,096,880	0.83	0.22	73.5%
238	除染作業	相双建設	15413700391	除染作業業務委託(除染推進)	新田川筋外(すざり岩公園外)	南相馬市原町区上高平地内 外	2016/3/31	2016/11/14	35,120,520	0.50	0.28	44.0%
239	除染作業	相双建設	16413700082	除染作業業務委託(除染推進)	東ヶ丘公園	南相馬市原町区牛来地内 外	2016/6/15	2017/3/31	273,167,640	0.82	0.35	57.3%
240	除染作業	相双建設	16413700133	除染作業業務委託(除染推進)	相馬浪江線 外	南相馬市鹿島区御山地内 外	2016/6/28	2017/3/31	158,324,760	0.25	0.06	76.0%
241	除染作業	相双建設	16413700143	除染作業業務委託(除染推進)	原町海老相馬線 外	南相馬市原町区下高平地内 外	2016/6/30	2017/3/31	63,105,480	0.95	0.14	85.3%
242	除染作業	相双建設	16413700147	除染作業業務委託(除染推進)	北泉小高線 外	南相馬市原町区雫地内 外	2016/6/30	2017/3/31	44,302,680	0.52	0.05	90.4%
243	除染作業	富岡土木	12413710001	除染作業委託(除染)	国道399号外	双葉郡川内村大字下川内字坂シ内地内外	2012/4/27	2012/8/31	24,100,650	0.47	0.26	44.7%
244	除染作業	富岡土木	12413710002	除染作業委託(除染)	広野停車場線外	双葉郡広野町大字上浅見川字桜田地内外	2012/5/30	2012/9/21	43,039,500	1.39	1.26	9.4%
245	除染作業	富岡土木	12413710071	除染作業委託(除染)	国道399号外	双葉郡川内村大字下川内地内	2013/2/13	2014/3/31	103,665,450	0.48	0.33	31.3%
246	除染作業	富岡土木	13413710020	除染作業委託(除染)	広野小高線外	双葉郡広野町大字上浅見川地内外	2013/6/19	2014/3/31	78,920,100	0.55	0.27	50.9%
247	除染作業	富岡土木	13413710084	除染作業委託(除染)	国道399号外	双葉郡川内村大字下川内地内	2013/10/1	2014/3/31	160,795,950	0.57	0.51	10.5%
248	除染作業	富岡土木	13413710087	除染作業委託(除染)	いわき浪江線	双葉郡広野町大字上浅見川地内外	2013/9/26	2014/3/31	40,156,200	0.28	0.20	28.6%
249	除染作業	富岡土木	14413710039	除染作業委託(除染)	いわき浪江線外	双葉郡広野町大字上浅見川地内外	2014/5/20	2015/3/31	86,061,960	0.41	0.22	46.3%
250	除染作業	富岡土木	14413710077	除染作業委託(除染)	富岡大越線外	双葉郡川内村大字上川内地内外	2014/8/18	2015/3/31	273,718,440	0.35	0.32	8.6%
251	除染作業	いわき建設	13413800333	除染作業業務委託(梅ヶ丘児童遊園)	梅ヶ丘団地	いわき市四倉町字梅ヶ丘地内	2013/11/27	2014/3/27	6,002,850	0.84	0.14	83.3%
252	除染作業	いわき建設	14413800441	公園除染業務委託(除染)	県営いわき公園	いわき市平上高久字大日作地内	2015/2/5	2015/5/20	3,258,360	0.25	0.22	12.0%
253	除染作業	いわき建設	14413800459	道路除染業務委託(除染)	いわき浪江線 外	いわき市大久町大字鶴房地内 外	2015/2/20	2016/3/25	72,677,520	0.39	0.37	5.1%
254	除染作業	いわき建設	15413800282	道路除染業務委託(除染)	折木筒木原久之浜線 外	いわき市大久町大字高田地内 外	2015/12/25	2017/3/21	126,173,160	0.25	0.10	60.0%
255	除染作業	いわき建設	15413800292	公園除染業務委託(除染)	県営いわき公園	いわき市平上高久字大日作地内	2015/11/20	2016/5/31	10,631,520	0.35	0.29	17.1%
256	除染作業	いわき建設	16413800167	道路除染業務委託(除染)	国道399号外	いわき市小川町上小川字上戸渡地内外	2016/7/21	2017/9/29	167,114,880	0.52	0.38	26.9%
257	除染作業	いわき建設	16413800185	道路除染業務委託(除染)	上川内川前線 外	いわき市川前町下桶売字志田名 地内外	2016/7/21	2017/10/31	179,420,400	0.41	0.25	39.0%
258	除染作業	いわき建設	16413800190	道路除染業務委託(除染)	いわき浪江線 外	いわき市四倉町白岩字柗原 地内外	2016/7/28	2017/9/29	60,105,240	0.44	0.12	72.7%
259	除染作業	勿来土木	16413810038	道路除染業務委託(除染)	国道289号外	いわき市田人町荷路夫字道ノ後地内外	2017/2/1	2017/6/30	15,732,360	0.44	0.15	65.9%
260	除染作業	県北流域	12415100003	流域下水道維持管理業務委託(除染推進)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江	2012/4/17	2012/5/31	3,391,500	0.85	0.72	15.3%
261	除染作業	県北流域	15415100012	県有施設除染作業業務委託(除染)	県北浄化センター	伊達郡国見町大字徳江地内	2016/1/12	2017/1/31	178,229,160	0.53	0.42	20.8%

資料2 除染業務契約一覧

No.	種類	事務所	契約番号	工事名称	路線河川等名	工事箇所名	工期(始)	工期(終)	契約額	除染による空間線量の変化(μSV/h)		
										作業前に最高地点だった箇所		
										作業前	作業後	低減率
262	除染作業	県中流域	13415200013	除染業務委託	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉地内	2013/7/25	2013/11/25	7,704,900	0.92	0.38	58.7%
263	除染作業	県中流域	13415200036	除染業務委託	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉 地内	2014/3/17	2014/9/9	13,933,080	1.10	0.53	51.8%
264	除染作業	県中流域	14415200013	除染業務委託	あだたら清流センター	二本松市榎戸 地内	2014/7/18	2015/2/3	31,780,080	0.95	0.79	16.8%
265	除染作業	県中流域	14415200014	除染業務委託	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉 地内	2014/7/18	2015/2/23	36,877,680	1.00	0.80	20.0%
266	除染作業	県中流域	14415200020	除染業務委託	県中流域下水道建設事務所	郡山市日和田町字山ノ井 地内	2014/9/26	2015/1/30	4,266,000	0.75	0.29	61.3%
267	除染作業	県中流域	14415200026	除染業務委託	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉 地内	2014/11/27	2015/3/30	14,864,040	1.03	0.20	80.6%
268	除染作業	県中流域	15415200004	除染業務委託	あだたら清流センター	二本松市榎戸 地内	2015/6/2	2016/1/4	36,974,880	1.93	0.47	75.6%
269	除染作業	県中流域	15415200007	除染業務委託	本宮ポンプ場	本宮市仁井田 地内	2015/5/29	2015/10/2	5,294,160	0.99	0.25	74.7%
270	除染作業	県中流域	15415200016	除染業務委託	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉 地内	2015/11/5	2016/3/18	13,078,800	0.64	0.55	14.1%
271	除染作業	県中流域	16415200013	除染業務委託	県中浄化センター	郡山市日和田町高倉 地内	2016/10/6	2017/3/17	21,359,160	0.95	0.79	16.8%
1	搬出作業	県北建設	17413100096	搬出業務委託(除染)	蓬萊団地 外	福島市蓬萊町地内	2017/6/2	2017/9/8	19,734,840			
2	搬出作業	県北建設	17413100147	搬出業務委託(除染)	山下町団地 外	福島市山下町地内 外	2017/6/30	2017/10/5	15,516,360			
3	搬出作業	保原土木	17413110005	除染廃棄物運搬業務委託(除染)	保原土木事務所管内	伊達市霊山町石田地内外	2017/9/15	2018/3/20	21,924,000			
4	搬出作業	県南建設	14413300145	除染業務委託1	真舟団地 外	白河市真舟 地内	2014/9/5	2014/12/3	21,607,560			
5	搬出作業	県南建設	14413300184	除染業務委託2	松風の里団地 外	白河市鬼越 地内 外	2014/9/5	2014/12/3	17,092,080			
1	除染・運搬作業以外	県北建設	12413100227	発注者支援(除染)業務委託	県北建設事務所管内	福島市佐原	2012/8/28	2013/3/26	12,881,400			
2	除染・運搬作業以外	県北建設	13413100019	発注者支援(除染)業務委託	県北建設事務所管内	福島市栄町 地内外	2013/4/23	2014/3/26	31,920,000			
3	除染・運搬作業以外	県北建設	13413100020	発注者支援(除染)業務委託	県北建設事務所管内	福島市佐原 地内外	2013/4/23	2014/3/26	13,860,000			
4	除染・運搬作業以外	県北建設	13413100419	発注者支援(除染)業務委託	県北建設事務所管内	福島市松川町地内外	2014/4/1	2015/3/31	19,440,000			
5	除染・運搬作業以外	県北建設	13413100420	発注者支援(除染)業務委託	県北建設事務所管内	伊達郡川俣町大字鶴沢地内外	2014/4/1	2015/3/31	19,440,000			
6	除染・運搬作業以外	県北建設	14413100038	発注者支援(除染)業務委託	あづま総合運動公園	福島市佐原地内外	2014/5/16	2015/3/31	14,904,000			
7	除染・運搬作業以外	県北建設	14413100236	発注者支援(除染)業務委託	県北建設事務所管内	福島市渡利 地内外	2014/9/1	2015/3/31	7,182,000			
8	除染・運搬作業以外	県北建設	14413100473	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市鳥谷野地内 外	2015/4/1	2015/7/31	6,264,000			
9	除染・運搬作業以外	県北建設	14413100475	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市北沢又地内 外	2015/4/1	2015/7/31	6,912,000			
10	除染・運搬作業以外	県北建設	14413100476	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市岡部地内 外	2015/4/1	2015/7/31	6,912,000			
11	除染・運搬作業以外	県北建設	14413100477	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市飯坂町地内 外	2015/4/1	2015/7/31	6,156,000			
12	除染・運搬作業以外	県北建設	14413100478	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市鎌田地内 外	2015/4/1	2015/7/31	6,912,000			
13	除染・運搬作業以外	県北建設	15413100167	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市鳥谷野地内 外	2015/8/3	2016/3/31	12,744,000			
14	除染・運搬作業以外	県北建設	15413100168	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市北沢又地内 外	2015/8/3	2016/3/31	12,960,000			
15	除染・運搬作業以外	県北建設	15413100169	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市岡部地内 外	2015/8/3	2016/3/31	12,960,000			
16	除染・運搬作業以外	県北建設	15413100170	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市飯坂町地内 外	2015/8/3	2016/3/31	12,312,000			
17	除染・運搬作業以外	県北建設	15413100171	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市鎌田地内 外	2015/8/3	2016/3/31	12,960,000			
18	除染・運搬作業以外	県北建設	15413100477	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市太田町地内 外	2016/4/1	2017/3/31	18,816,840			
19	除染・運搬作業以外	県北建設	15413100478	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市曾根田町地内 外	2016/4/1	2017/3/31	20,520,000			
20	除染・運搬作業以外	県北建設	15413100479	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市飯野町地内 外	2016/4/1	2017/3/31	20,520,000			
21	除染・運搬作業以外	県北建設	16413100447	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市飯坂町地内 外	2017/1/6	2017/3/31	4,860,000			
22	除染・運搬作業以外	県北建設	17413100019	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市飯坂町 東湯野地内 外	2017/4/3	2018/3/30	20,693,880			
23	除染・運搬作業以外	県北建設	17413100020	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市笹木野地内 外	2017/4/3	2018/3/30	18,609,480			
24	除染・運搬作業以外	県北建設	17413100021	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市成川地内 外	2017/4/3	2018/3/30	16,238,880			
25	除染・運搬作業以外	県北建設	17413100025	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市飯坂町 平野地内 外	2017/4/3	2018/3/30	20,693,880			
26	除染・運搬作業以外	県北建設	17413100026	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市鎌田地内 外	2017/4/3	2018/3/30	20,736,000			
27	除染・運搬作業以外	県北建設	17413100027	発注者支援業務委託(除染)	県北建設事務所管内	福島市方木田地内 外	2017/4/3	2018/3/30	21,527,640			

## 資料2 除染業務契約一覧

No.	種類	事務所	契約番号	工事名称	路線河川等名	工事箇所名	工期(始)	工期(終)	契約額	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
										作業前に最高地点だった箇所		
										作業前	作業後	低減率
28	除染・運搬作業以外	保原土木	12413110077	発注者支援(除染)業務委託	県北建設(保原土木)事務所管内	伊達市霊山町石田地内外	2013/1/28	2013/3/29	2,572,500			
29	除染・運搬作業以外	保原土木	13413110003	発注者支援(除染)業務委託	県北建設(保原土木)事務所管内	伊達市保原町7丁目地内外	2013/5/2	2014/3/31	14,110,950			
30	除染・運搬作業以外	保原土木	14413110005	発注者支援(除染)業務委託	県北建設(保原土木)事務所管内	伊達市保原町字七丁目 地内外	2014/5/1	2015/3/31	18,348,120			
31	除染・運搬作業以外	保原土木	15413110005	発注者支援業務委託(除染)	県北建設(保原土木)事務所管内	伊達市梁川町五十沢地内外	2015/5/1	2016/3/31	10,971,720			
32	除染・運搬作業以外	保原土木	15413110054	発注者支援業務委託(除染)	県北建設(保原土木)事務所管内	伊達郡桑折町大字万正寺地内外	2016/4/1	2017/3/31	19,635,480			
33	除染・搬出作業以外	保原土木	16413110049	積算業務委託(除染)	県北建設(保原土木)事務所管内	伊達郡国見町大字藤田地内 外	2016/9/5	2016/10/24	1,397,520			
34	除染・運搬作業以外	保原土木	17413110003	発注者支援業務委託(除染)	県北建設(保原土木)事務所管内	伊達市霊山町石田地内外	2017/4/3	2018/3/30	20,304,000			
35	除染・運搬作業以外	二本松土木	13413120003	発注者支援(除染)業務委託	二本松土木事務所管内	二本松市金色地内外	2013/5/16	2014/2/13	14,070,000			
36	除染・運搬作業以外	二本松土木	14413120001	発注者支援(除染)業務委託	二本松土木事務所管内	二本松市金色地内外	2014/6/2	2015/3/2	13,107,960			
37	除染・運搬作業以外	二本松土木	15413120005	発注者支援業務委託(除染)	二本松土木事務所管内	二本松市金色地内 外	2015/5/11	2016/3/31	16,084,440			
38	除染・運搬作業以外	二本松土木	15413120029	発注者支援業務委託(除染)	二本松土木事務所管内	二本松市金色地内 外	2015/7/1	2016/3/31	13,548,600			
39	除染・運搬作業以外	二本松土木	15413120076	発注者支援業務委託(除染)	二本松土木事務所管内	二本松市金色地内 外	2016/4/1	2017/3/31	19,082,520			
40	除染・運搬作業以外	二本松土木	15413120077	発注者支援業務委託(除染)	二本松土木事務所管内	二本松市金色地内 外	2016/4/1	2017/3/31	18,140,760			
41	除染・運搬作業以外	二本松土木	17413120001	発注者支援業務委託(除染)	二本松土木事務所管内	二本松市永田 地内 外	2017/4/1	2018/3/30	18,360,000			
42	除染・運搬作業以外	二本松土木	17413120002	発注者支援業務委託(除染)	二本松土木事務所管内	本宮市荒井 地内 外	2017/4/3	2018/3/30	18,252,000			
43	除染・搬出作業以外	県中建設	12413200365	補完業務委託(除染)	(主)郡山湖南線 外	郡山市開成3丁目地内 外	2012/11/16	2013/1/31	1,942,500			
44	除染・運搬作業以外	県中建設	12413200426	発注者支援業務委託(除染)	県営住宅柴宮団地 外	郡山市安積町荒井字柴宮山 地内外	2012/11/29	2012/12/28	1,207,500			
45	除染・搬出作業以外	県中建設	12413200443	補完業務委託(除染)	(一)須賀川二本松線 外	郡山市日和田町高倉地内 外	2012/12/28	2013/3/25	1,995,000			
46	除染・運搬作業以外	県中建設	13413200115	発注者支援業務委託(除染)	安積長沼線 外	須賀川市仁井田地内 外	2013/6/25	2013/10/2	5,613,300			
47	除染・運搬作業以外	県中建設	13413200286	発注者支援業務委託(除染)	安積長沼線 外	郡山市安積町笹川地内 外	2013/9/11	2013/12/19	4,305,000			
48	除染・運搬作業以外	県中建設	13413200411	発注者支援業務委託(除染)	岩根日和田線 外	郡山市喜久田町早稲原地内 外	2013/11/12	2014/3/28	5,775,000			
49	除染・運搬作業以外	県中建設	13413200471	発注者支援業務委託(除染)	仁井田郡山線 外	郡山市久留米地内 外	2013/12/25	2014/3/28	4,379,550			
50	除染・運搬作業以外	県中建設	14413200074	発注者支援業務委託(除染)	郡山湖南線外	郡山市開成地内 外	2014/6/4	2014/10/1	4,644,000			
51	除染・運搬作業以外	県中建設	14413200244	発注者支援業務委託(除染)	郡山大越線 外	郡山市大町地内 外	2014/9/4	2015/3/31	39,282,840			
52	除染・運搬作業以外	県中建設	14413200310	発注者支援業務委託(除染)	小野郡山線外	郡山市中町1丁目地内 外	2014/10/15	2015/3/31	14,688,000			
53	除染・運搬作業以外	県中建設	15413200038	発注者支援業務委託(除染)	郡山大越線 外	郡山市富久山町 久保田地内 外	2015/5/7	2015/11/2	9,789,120			
54	除染・運搬作業以外	県中建設	15413200258	発注者支援業務委託(除染)	郡山湖南線外	郡山市逢瀬町多田野地内外	2015/10/9	2016/3/31	9,018,000			
55	除染・運搬作業以外	県中建設	15413200420	発注者支援業務委託(除染)	国道288号外	郡山市舞木町地内外	2016/3/18	2016/8/31	13,751,640			
56	除染・運搬作業以外	県中建設	16413200262	発注者支援業務委託(除染)	三春日和田線外	郡山市西田町 三町目地内外	2016/8/24	2017/3/31	11,078,640			
57	除染・運搬作業以外	県中建設	17413200024	発注者支援業務委託(除染)	国道288号外	郡山市西田町 大田地内外	2017/4/3	2018/3/30	19,084,680			
58	除染・運搬作業以外	三春土木	13413210120	発注者支援業務委託(除染)	本宮常葉線 外	田村郡三春町大字富沢地内 外	2013/12/25	2014/3/28	4,305,000			
59	除染・運搬作業以外	三春土木	14413210067	発注者支援業務委託(除染)	須賀川三春線 外	田村郡三春町大字沼沢地内 外	2014/9/5	2015/1/26	6,048,000			
60	除染・運搬作業以外	三春土木	14413210081	発注者支援業務委託(除染)	浪江三春線 外	田村市船引町上移地内 外	2014/9/29	2014/11/27	5,616,000			
61	除染・運搬作業以外	三春土木	14413210096	発注者支援業務委託(除染)	谷田川三春線 外	田村郡三春町大字貝山地内 外	2014/12/10	2015/3/31	4,536,000			
62	除染・運搬作業以外	須賀川土木	13413220089	発注者支援業務委託(除染)	郡山矢吹線 外	須賀川市矢沢地内 外	2013/11/5	2014/3/28	4,345,950			
63	除染・運搬作業以外	須賀川土木	14413220070	発注者支援業務委託(除染)	国道118号 外	須賀川市花の里地内 外	2014/9/25	2015/3/27	7,740,360			
64	除染・運搬作業以外	須賀川土木	15413220033	発注者支援業務委託(除染)	国道118号 外	須賀川市志茂地内 外	2015/5/21	2015/12/16	9,950,040			
65	除染・運搬作業以外	須賀川土木	15413220075	発注者支援業務委託(除染)	国道118号 外	須賀川市森宿地内 外	2015/11/10	2016/3/8	5,940,000			
66	除染・運搬作業以外	須賀川土木	15413220125	発注者支援業務委託(除染)	国道118号 外	須賀川市岩淵地内 外	2016/3/28	2017/3/27	17,472,240			

資料2 除染業務契約一覧

No.	種類	事務所	契約番号	工事名称	路線河川等名	工事箇所名	工期(始)	工期(終)	契約額	除染による空間線量の変化( $\mu$ SV/h)		
										作業前に最高地点だった箇所		
										作業前	作業後	低減率
67	除染・搬出作業以外	県南建設	12413300284	道路等除染調査業務委託(除染推進)	白河羽鳥線外	白河市道場小路地内外	2012/11/9	2013/3/29	16,092,300			
68	除染・運搬作業以外	県南建設	12413300285	発注者支援業務委託(除染推進)	県南建設事務所管内	白河市大信 増見地内外	2012/11/15	2013/3/29	9,752,400			
69	除染・運搬作業以外	県南建設	13413300036	発注者支援業務委託(除染推進)	矢吹天栄線 外	白河市大信増見地内 外	2013/4/18	2014/3/31	32,235,000			
70	除染・運搬作業以外	県南建設	14413300024	発注者支援業務委託(除染)	白河羽鳥線 外	白河市昭和町地内 外	2014/5/19	2015/3/31	35,387,280			
71	除染・搬出作業以外	県南建設	14413300038	除染業務委託(線量測定)	真舟団地外	白河市真舟 地内 外	2014/5/27	2014/12/10	517,320			
72	除染・運搬作業以外	県南建設	14413300307	発注者支援業務委託(除染)	白河羽鳥線 外	白河市昭和町地内 外	2015/4/1	2016/3/31	55,620,000			
73	除染・運搬作業以外	県南建設	15413300281	発注者支援業務委託(除染)	国道289号 外	白河市老久保地内 外	2016/4/1	2017/3/31	36,720,000			
74	除染・搬出作業以外	会津若松建設	13413400348	放射線量測定業務委託(除染推進)	会津坂下会津高田線外	河沼郡会津坂下町字市中新町甲外	2013/11/27	2014/6/27	4,795,200			
75	除染・運搬作業以外	相双建設	12413700204	発注者支援(除染)業務委託	相馬浪江線 外	南相馬市原町区片倉地内 外	2012/8/10	2013/3/29	9,450,000			
76	除染・運搬作業以外	相双建設	12413700205	発注者支援(除染)業務委託	草野大倉鹿島線 外	南相馬市鹿島区榎原地内 外	2012/8/10	2013/3/29	9,240,000			
77	除染・運搬作業以外	相双建設	13413700032	発注者支援(除染)業務	国道115号 外	相馬市東玉野地内 外	2013/5/23	2014/3/31	17,129,700			
78	除染・運搬作業以外	相双建設	13413700033	発注者支援(除染)業務	原町川俣線 外	南相馬市原町区大原地内 外	2013/5/23	2014/3/31	16,625,700			
79	除染・運搬作業以外	相双建設	13413700457	発注者支援(除染)業務	相馬浪江線 外	南相馬市原町区大木戸地内 外	2014/3/31	2015/2/27	18,252,000			
80	除染・運搬作業以外	相双建設	13413700458	発注者支援(除染)業務	原町川俣線 外	南相馬市原町区深野地内 外	2014/4/1	2015/2/27	18,252,000			
81	除染・運搬作業以外	相双建設	13413700460	発注者支援(除染)業務	原町二本松線外	南相馬市原町区大木戸地内外	2014/4/1	2014/5/30	2,770,200			
82	除染・運搬作業以外	相双建設	14413700039	発注者支援(除染)業務	相馬浪江線外	南相馬市原町区深野地内外	2014/5/30	2014/6/30	5,395,680			
83	除染・運搬作業以外	相双建設	14413700099	発注者支援(除染)業務	相馬浪江線外	南相馬市鹿島区小池外	2014/6/23	2014/8/29	2,426,760			
84	除染・運搬作業以外	相双建設	14413700119	発注者支援(除染)業務	馬場太田線外	南相馬市原町区上太田地内外	2014/6/30	2014/9/30	1,866,240			
85	除染・運搬作業以外	相双建設	14413700243	発注者支援(除染)業務	浪江鹿島線 外	南相馬市原町区南町地内 外	2014/9/30	2014/12/25	9,677,880			
86	除染・運搬作業以外	相双建設	14413700391	発注者支援(除染)業務	東ヶ丘公園	南相馬市原町区牛来地内外	2015/1/5	2015/5/29	7,966,080			
87	除染・運搬作業以外	相双建設	14413700451	発注者支援(除染)業務	東ヶ丘公園外	南相馬市原町区牛来地内外	2015/3/2	2016/3/31	22,373,280			
88	除染・運搬作業以外	相双建設	14413700452	発注者支援(除染)業務	浪江鹿島線外	南相馬市原町区南町地内外	2015/3/2	2016/3/31	22,373,280			
89	除染・搬出作業以外	相双建設	15413700092	放射線測定業務委託(除染)	小浜字町線外	南相馬市原町区旭町地内外	2015/6/9	2015/8/31	4,551,120			
90	除染・搬出作業以外	相双建設	15413700176	放射線測定業務委託(除染)	真野川筋 外	南相馬市鹿島区江垂地内 外	2015/8/4	2016/2/29	11,120,760			
91	除染・搬出作業以外	相双建設	15413700304	放射線測定業務委託(除染)	相馬浪江線外	南相馬市鹿島区山下地内外	2015/12/11	2016/3/31	4,349,160			
92	除染・運搬作業以外	相双建設	15413700381	発注者支援業務委託(除染)	大芦鹿島線外	南相馬市鹿島区寺内地内外	2016/4/1	2017/3/31	20,196,000			
93	除染・運搬作業以外	相双建設	15413700382	発注者支援業務委託(除染)	北泉小高線外	南相馬市原町区雫地内外	2016/3/31	2017/3/31	20,196,000			
94	除染・搬出作業以外	相双建設	15413700396	放射線測定業務委託(除染)	浪江鹿島線 外	南相馬市鹿島区鹿島地内 外	2016/3/30	2016/9/2	9,107,640			
95	除染・搬出作業以外	相双建設	15413700397	放射線測定業務委託(除染)	原町海老相馬線 外	南相馬市原町区上高平地内 外	2016/3/31	2016/7/29	8,379,720			
96	除染・搬出作業以外	富岡土木	12413710016	補完業務委託(除染)	国道399号外	双葉郡川内村大字下川内地内外	2012/8/24	2012/12/18	5,978,700			
97	除染・運搬作業以外	富岡土木	13413710086	発注者支援委託(除染)	いわき浪江線外	双葉郡広野町大字上浅見川地内外	2013/10/1	2014/3/31	16,905,000			
98	除染・運搬作業以外	富岡土木	14413710025	発注者支援業務委託(除染)	いわき浪江線外	双葉郡広野町大字上浅見川地内外	2014/5/1	2015/3/31	33,264,000			
99	除染・搬出作業以外	富岡土木	15413710099	放射性物質調査業務委託(除染)	檜生川筋 外	双葉郡川内村大字上川内地内外	2015/12/15	2016/3/31	3,701,160			
100	除染・運搬作業以外	いわき建設	13413800090	発注者支援業務委託(放射線量測定外)	中神谷団地外	いわき市平中神谷字細田 地内外	2013/7/12	2013/9/9	3,570,000			
101	除染・搬出作業以外	いわき建設	13413800324	放射線量測定業務委託(除染)	神俣停車場川前線 外	いわき市川前町下桶売字城木地内 外	2014/1/15	2014/9/19	9,996,480			
102	除染・運搬作業以外	いわき建設	14413800361	発注者支援業務委託(除染)	県営いわき公園 外	いわき市平上高久字大日作地内 外	2014/11/28	2015/3/31	6,372,000			
103	除染・運搬作業以外	いわき建設	15413800031	発注者支援業務委託(除染)	いわき浪江線 外	いわき市大久町大久字鶴房地内 外	2015/4/27	2016/3/31	17,115,840			
104	除染・運搬作業以外	いわき建設	15413800390	発注者支援業務委託(除染)	上川内川前線 外	いわき市川前町下桶売字志田名地内外	2016/3/17	2017/3/31	19,440,000			
105	除染・搬出作業以外	いわき建設	16413800155	放射線量測定業務委託(除染)	小名浜平線外	いわき市平谷川瀬地内外	2016/7/1	2017/3/31	29,658,960			
106	除染・運搬作業以外	いわき建設	17413800037	発注者支援業務委託(除染)	いわき浪江線 外	いわき市四倉町白岩 地内外	2017/4/3	2017/12/28	14,975,280			
107	除染・搬出作業以外	勿来土木	16413810003	放射線量測定業務委託(除染)	国道289号外	いわき市田人町旅人字下坪地内外	2016/5/13	2016/11/17	16,461,360			
108	除染・搬出作業以外	福島空港	14414100033	測定業務委託(除染)	福島空港公園	石川郡玉川村大字北須釜 外	2015/1/30	2015/3/31	864,000			

お問い合わせ先

福島県土木部技術管理課

〒960-8670 福島市杉妻町 2 番 16 号

TEL: 024-521-7460 FAX: 024-521-7949

E-mail: [gijutsukanri@pref.fukushima.lg.jp](mailto:gijutsukanri@pref.fukushima.lg.jp)
