

復旧・復興だより(夏井川)

福島県いわき建設事務所

1 地域のみなさまへ 夏井川の改良復旧事業について、お知らせします。

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、夏井川では令和2年11月末に破堤箇所の復旧工事が完了し、「狭窄部の伐木掘削工事」(10箇所)に着工しており、令和3年9月末までには8箇所が完了しています。

また、事業区間を全14工区に分割して発注する「本格的な掘削工事」についても4~9工区と12~14工区で着工しています。(1~3工区、10、11工区は令和3年10月着工予定)



2 工事進捗状況について

狭窄部の伐木・掘削工

①河川の木、竹を伐木します
②堆積した土砂を掘削します
(狭窄部を先行し実施中)

本格的な掘削工事

①河川の木、竹を伐木します
②堆積した土砂を掘削します

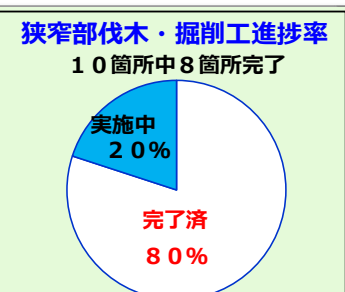

狭窄部伐木・掘削工の状況


3 工事の見通しについて

項目	令和元年度 4月 10月 3月	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
破堤箇所 応急仮工事	■					
破堤箇所 本復旧工事			● 令和2年11月末に完了済み			●
狭窄部の 伐木・掘削工事			■ 8箇所が完了済み 特に河道が狭くなっている箇所を先行して掘削します。 至14工区中9箇所発注済			■
本格的な 掘削工事			■ 助成区間の河道全域			■
護岸工事			■ 本格的な掘削工事箇所のうち水衝部等			■
用地買収						

4 本格的な掘削工事 夏井川では、狭窄部の掘削工事に引き続き、本格的な掘削工事を進めています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。




復旧・復興だより(夏井川)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 夏井川の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和3年8月末時点で167箇所が完了しました。



位置図



凡例

- 災害復旧事業(施工中)
- 災害復旧事業(完了)
- 災害復旧助成事業区間(完了)
- 立木(竹)伐採、土砂撤去箇所



写真

現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。



護岸工事(100%完了)



②小川町上小川字中島工区【施工前】

護岸工事(100%完了)



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。




お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>






令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

復旧・復興だより(好間川)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 好間川の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風により被災した河川や道路等の復旧工事を行っています。
 好間川の災害復旧工事は、夏井川合流点から常磐自動車道付近までの区間については、通常の復旧工事に加え、
 河川内の伐木や土砂撤去等の改良復旧工事を併せて工事しており、令和5年度内の完了を目指しております。
 当管内では247箇所被災しましたが令和3年8月末時点で、167箇所が完了しました。



位置図



写真

好間川の改良復旧工事1, 2工区の掘削・護岸工を実施している箇所を掲載しています。

①好間町川中子地内

【施工前】



河道掘削状況【施工中】



②好間町下好間渋井地内

【施工前】



河道掘削状況【施工中】



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。
 今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、
 早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。




お問合せ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>






令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

復旧・復興だより (新川)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 新川の災害復旧工事等について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和3年8月末時点で167箇所が完了しました。



位置図

凡例 ○ 災害復旧工事(施工中)
○ 災害復旧工事(完了)



長町工区 (令和2年6月末完了)



御厩工区 (令和3年6月完了)



写真

新川の河道掘削等の工事状況について代表的な箇所を掲載しています。

① 尼子橋付近から下流について河道掘削工事を実施しています。



② 梅本橋から下流について親水護岸工事を実施しています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。




お問合せ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

令和3年9月号


Vol.5-5

復旧・復興だより(藤原川)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 藤原川の災害復旧工事等について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和3年8月末時点で167箇所が完了しました。



位置図 凡例 ○ 災害復旧工事(施工中)

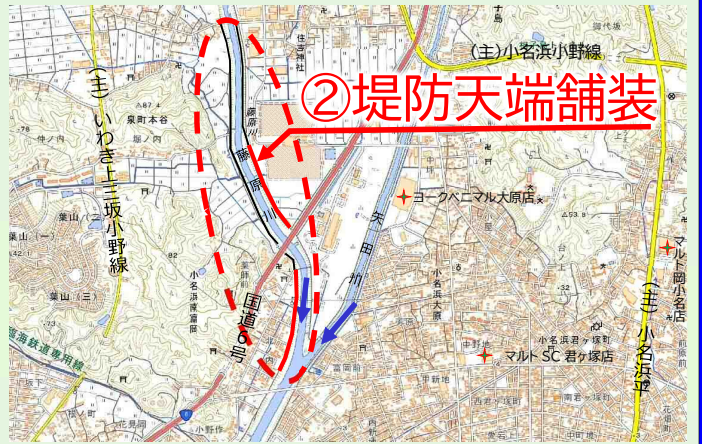


写真 現在、災害復旧工事等を実施している代表的な箇所を掲載しています。



護岸工事 (70%進捗)



堤防強化のため、天端の舗装を実施しています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。




お問合せ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

復旧・復興だより (鮫川)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 鮫川水系の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。

令和3年8月末時点で167箇所が完了しました。




写真 現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。



護岸工事実施中 (85%の進捗)



護岸工事 (100%完了)



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。




お問合せ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.io/sec/41380a/>





令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える


復旧・復興だより(大久川等)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 大久川等の災害復旧工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和3年8月末時点で167箇所が完了しました。

令和元年発生災害復旧状況



位置図 凡例 ○ 災害復旧工事(施工中) ○ 災害復旧工事(完了) ○ 交付金工事(完了)

①助塚工区 護岸工160.0m

②後三松工区 護岸工44.0m

写真 現在、災害復旧工事等を実施している代表的な箇所を掲載しています。

①大久町大久字助塚地内 【施工前】



護岸工事 (90%の進捗)



助塚工区の護岸工事を実施しています。

②大久町大久字後三松地内 【施工前】



護岸工事 (100%完了)



後三松工区の護岸工事が完了しました。

工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。




お問合せ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える


復旧・復興だより(仁井田川等)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 仁井田川の災害復旧工事等について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。
令和3年8月末までに167箇所について復旧工事が完了しています。

令和元年発生災害復旧状況



位置図 【完了】

凡例 ○ 災害復旧工事(施工中) ○ 災害復旧工事(完了)



写真

現在、災害復旧工事を実施している代表的な箇所を掲載しています。

① 四倉町下柳生字熊ノ御嶽地内 【施工前】



護岸工事 (100%完了)



仁井田川の復旧工事は全て完了しました。引き続き高倉川の完了を目指します。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。今後も増加を見込んでおり、ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問合せ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>

