



復旧・復興だより(夏井川)

福島県いわき建設事務所

1 地域のみなさまへ 夏井川の改良復旧事業について、お知らせします。

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、夏井川では令和2年11月末に破堤箇所の復旧工事が完了し、令和4年3月末までに「狭窄部の伐木掘削工事」については、全10箇所ですべて完了しています。

また、「本格的な掘削工事」については事業区間を全14工区に分割して発注しており、護岸工についても一部で着手しています。

2 工事進捗状況について

事業区域図

14工区 完了
13工区 完了
12工区 完了
11工区 完了
10工区 完了
9工区 完了
8工区 完了
7工区 完了
6工区 完了
5工区 完了
4工区 完了
3工区 完了
2工区 完了
1工区 完了

● 狭窄部の伐木・掘削箇所 (令和2年6月着手 令和4年3月完了)
■ 本格的な掘削箇所 (令和3年1月着手 令和6年3月完了予定)

狭窄部の伐木・掘削工

【施工前】 ①河川の木、竹を伐木します ②堆積した土砂を掘削します (狭窄部を先行し実施中)

【施工後】 事業区間の場合は、全て天端被覆工(アスファルト舗装)を実施 路肩部には防草シートを実施します

令和元年東日本台風の降雨に対応する河川断面を確保するために、全体的に掘削工事をします

位置図の①～⑩ 令和4年3月末に完了しました

⑩ いわき市小川町地内 (令和3年6月)

⑩ 夏井川 (令和4年3月)

全14工区

①河川の木、竹を伐木します ②堆積した土砂を全て掘削します

狭窄部伐木・掘削工進捗率 全10箇所完了

完了済 100%

狭窄部伐木・掘削工の状況

3 工事の見通しについて

項目	令和元年度 4月 10月 3月	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
破堤箇所 応急仮工事	■					
破堤箇所 本復旧工事		■				令和2年11月末に完了済み
狭窄部の 伐木・掘削工事			■			令和4年3月は全10箇所 が完了済み 特に河道が狭くなっている箇所を 先行して掘削します。 全14工区が発注済み
本格的な 掘削工事				■		助成区間の河道全域
護岸工事					■	本格的な掘削工事箇所のうち水衝部等
用地買収					■	

4 工事の状況 夏井川では、狭窄部の掘削工事に引き続き、本格的な掘削工事や護岸工事を進めています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。





お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143
ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





復旧・復興だより(好間川)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 好間川の災害復旧工事について、お知らせします。

令和元年東日本台風の甚大な被害に対応するため、好間川では令和2年8月末に破堤箇所への復旧工事が完了し、続いて令和3年9月末までに「狭窄部の伐木掘削工事」の全4箇所が完了しています。また、現在は「本格的な掘削工事」については、事業区間を全3工区に分割して施工しております。



写真 好間川の改良復旧工事1, 3工区の本格的な河道掘削を実施している箇所を掲載しています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>



令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える


復旧・復興だより (新川)

福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 新川の災害復旧工事等について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和4年3月末時点で214箇所が完了しました。

令和元年発生災害復旧状況



位置図

凡例 ○ 災害復旧工事等施工箇所



写真 新川の災害復旧や河道掘削等の工事状況について代表的な箇所を掲載しています。

①内郷内町堤田地内

【施工前】



護岸工事 (95%の進捗)



②平谷川瀬一丁目地内 (梅本橋下流)

【施工前】



護岸工事 (100%完了)



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。

ペコ太郎




お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





復旧・復興だより(藤原川)


福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 藤原川の工事等について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和4年3月末時点で214箇所が完了しました。

藤原川の災害復旧工事は、全箇所が完了しましたが、河川改修工事や、河道掘削工事など、引き続き流域内で実施している工事の情報についてお知らせします。


令和元年発生災害復旧状況



位置図 凡例 ○ 河川工事等施工箇所



写真 藤原川で実施している工事の代表的な箇所を掲載しています。

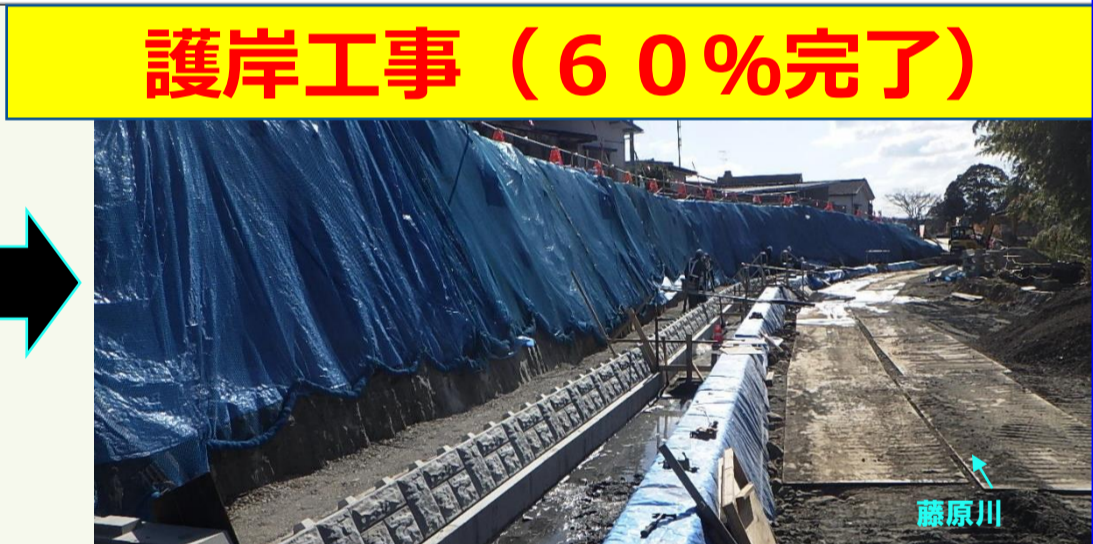

藤原川の河道に溜まった土砂の撤去を行っています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問合せ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>



令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

復旧・復興だより (鮫川)

福島県いわき建設事務所



地域のみなさまへ

鮫川水系の災害復旧工事等について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。

令和4年3月末時点で214箇所が完了しました。

令和元年発生災害復旧状況

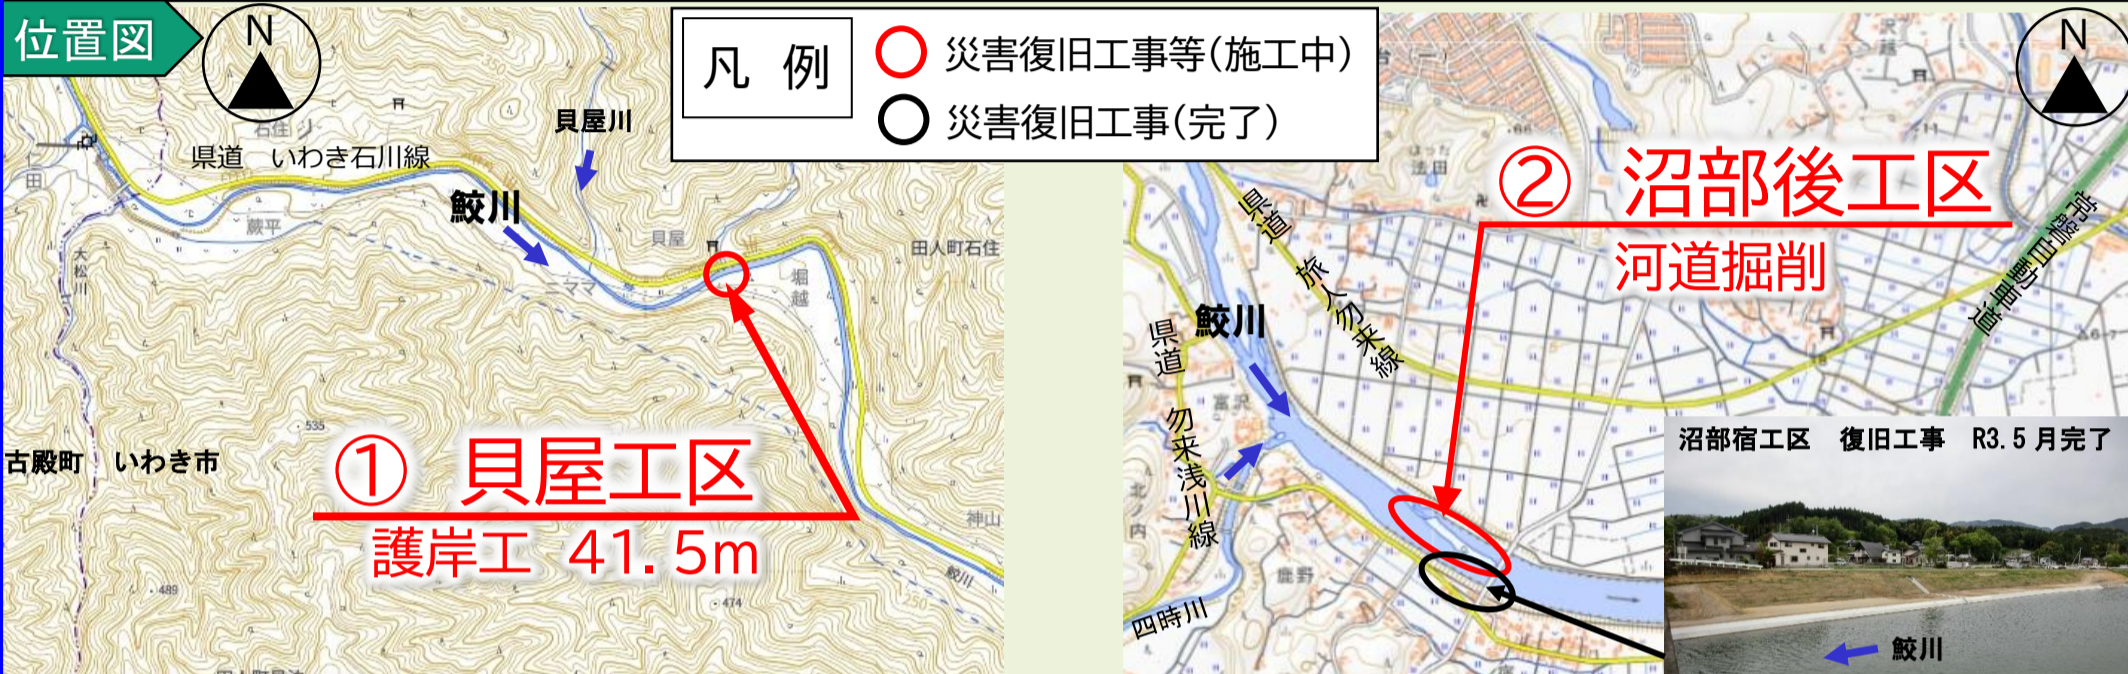

写真

現在、災害復旧工事等を実施している代表的な箇所を掲載しています。

護岸工事 (95%の進捗)



鮫川の河道に溜まった土砂の撤去を行っています。



工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。




お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>





令和元年東日本台風等からの復旧状況を伝える

令和4年3月号

Vol.7-8

復旧・復興だより(大久川等)


福島県いわき建設事務所

地域のみなさまへ 大久川等の工事について、お知らせします。

いわき建設事務所では、令和元年東日本台風による被害に対応するため、いわき市内の河川や道路などの公共施設247箇所について、計画的に復旧工事を実施しています。令和4年3月末時点で214箇所が完了しました。

大久川の災害復旧工事は、全箇所が完了しておりますが、河川改修工事や、河道掘削工事など、引き続き流域内で実施している工事の情報についてお知らせします。


令和元年発生災害復旧状況

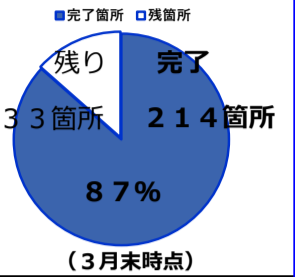

位置図



写真 大久川では立木や竹の伐採と河道内に溜まった土砂の撤去を行っています。

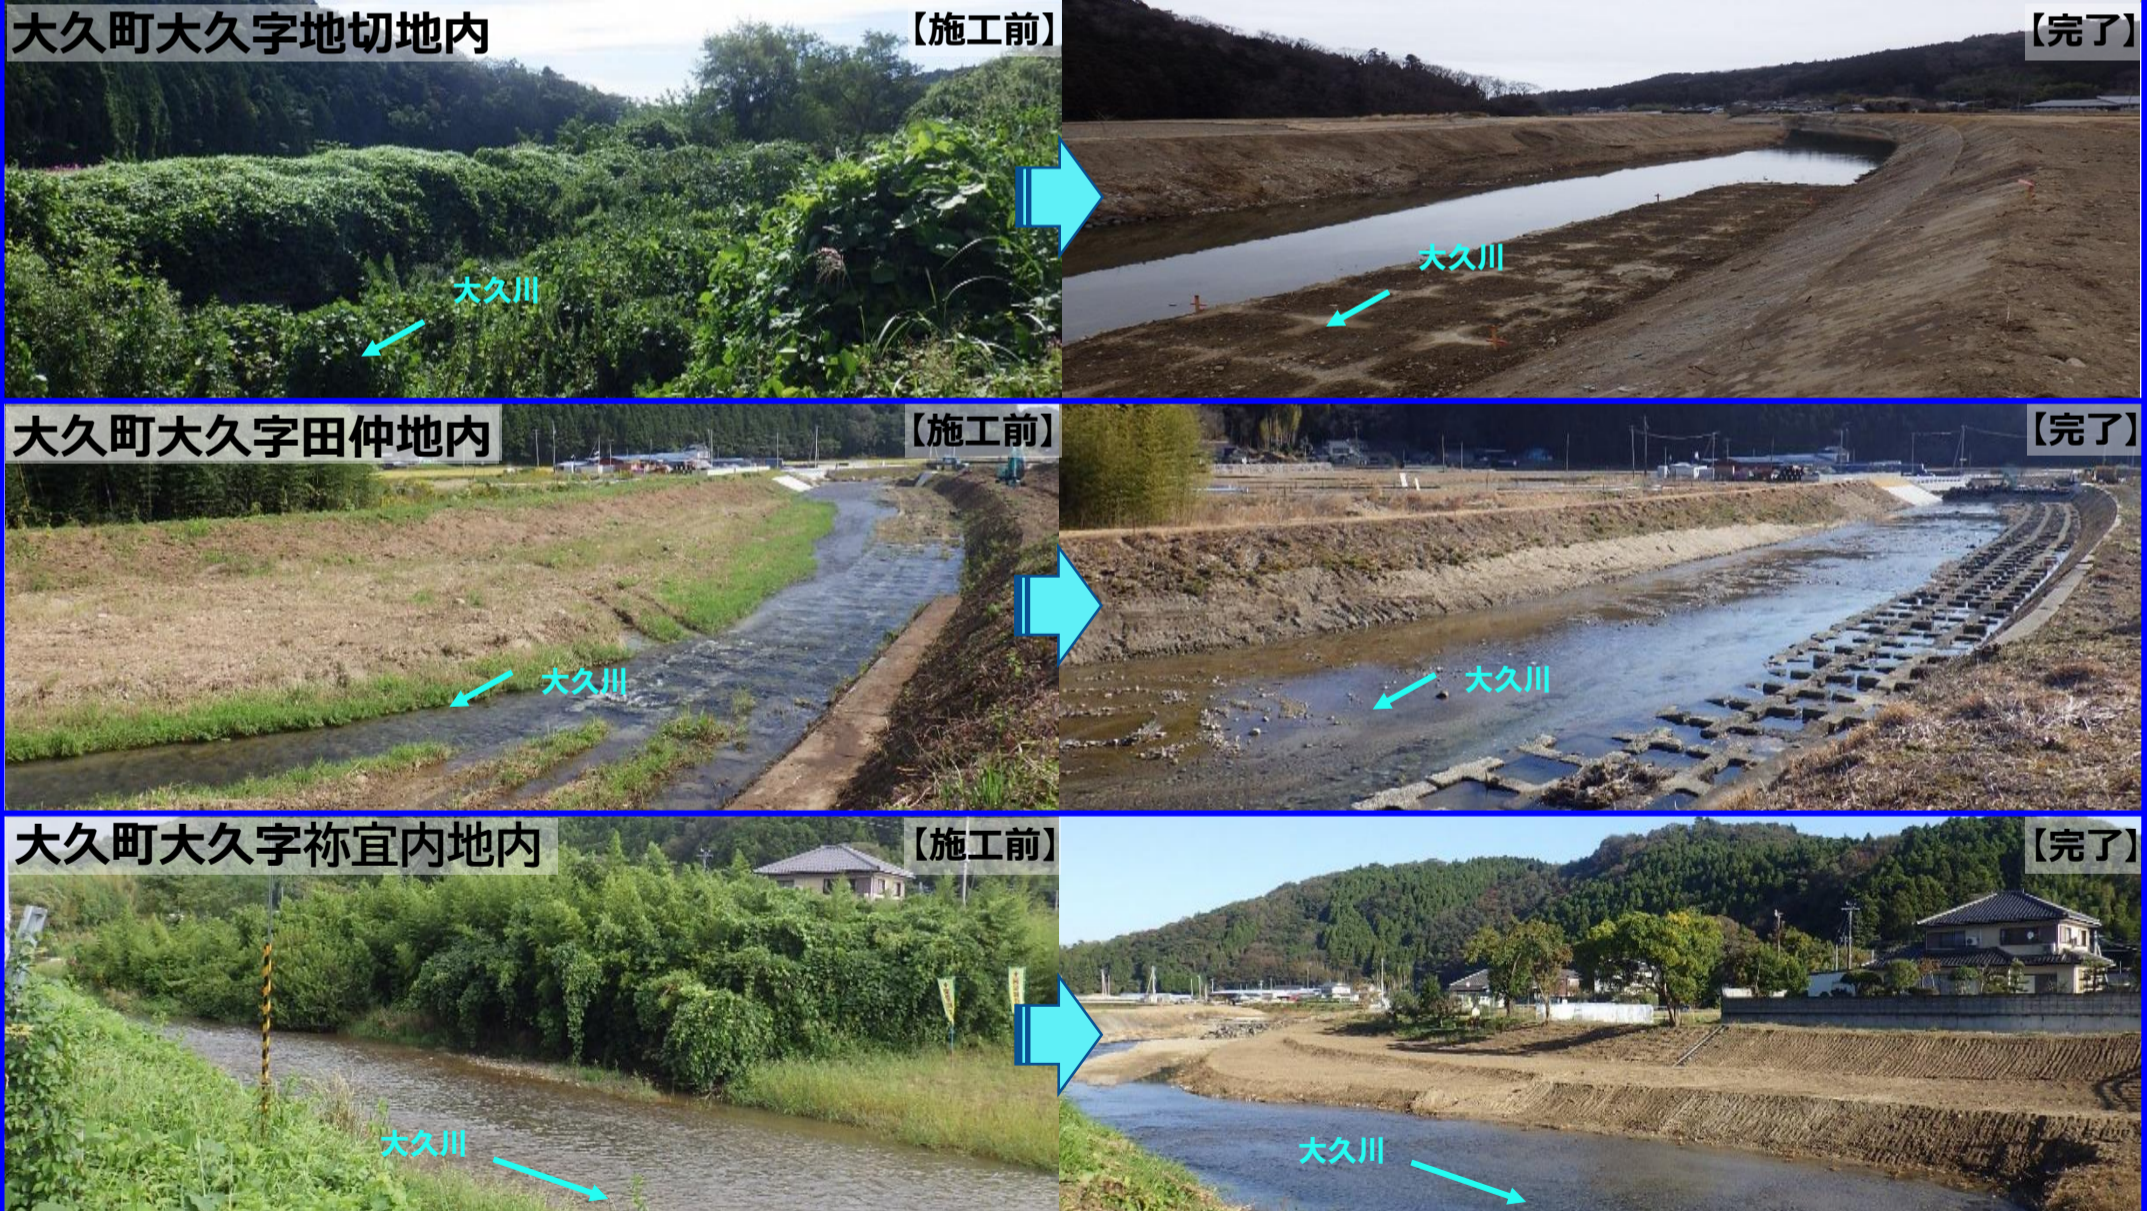

工事の進捗に伴いダンプトラック等の通行が増加しております。ご不便をおかけしますが、早期の工事完了のため、ご理解とご協力をお願いします。



お問い合わせ

福島県いわき建設事務所

企画管理部企画調査課復興まちづくり係 電話：0246-24-6143

ホームページアドレス <http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/>

