# 土木部管理施設の除染の進捗状況（8月末）

H28.8.31現在

## 1. 除染の進捗状況（8月末現在）

| | 全体数量 | 着手 | | 完了 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 数量 | 着手率 | 数量 | 完了率 |
| 道路 | 1752 km | 1467 km | 83.7 % | 903 km | 51.5 % |
| 河川・砂防 | 23 箇所 | 18 箇所 | 78.3 % | 10 箇所 | 43.5 % |
| 公園・下水道 | 9 箇所 | 9 箇所 | 100.0 % | 6 箇所 | 66.7 % |
| 県営住宅 | 48 団地 | 45 団地 | 93.8 % | 45 団地 | 93.8 % |

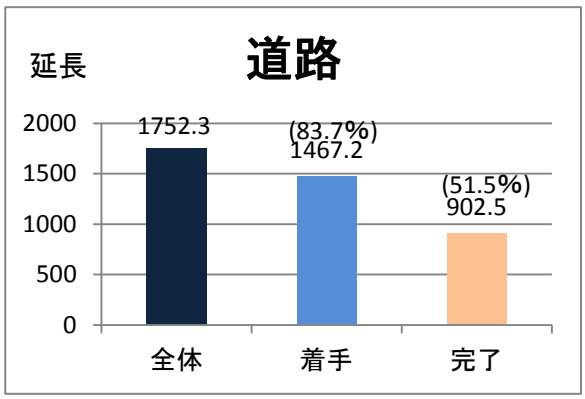


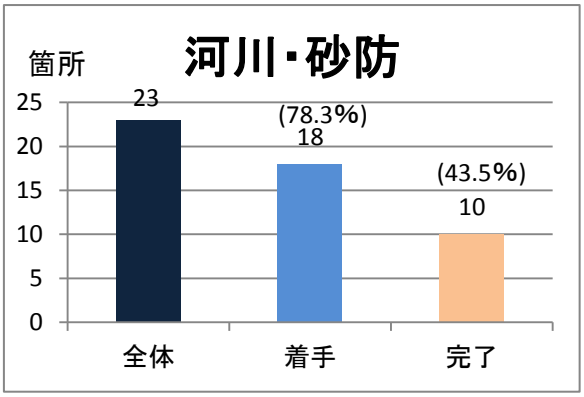


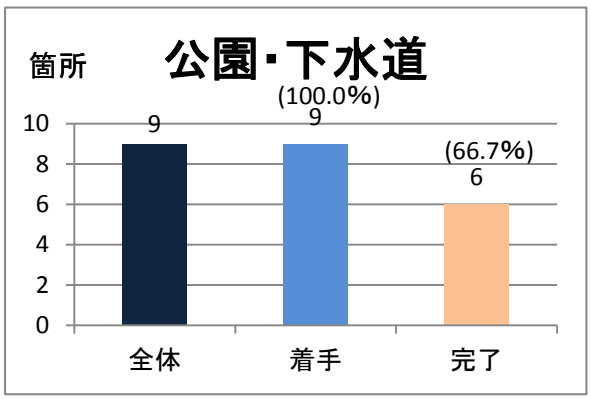


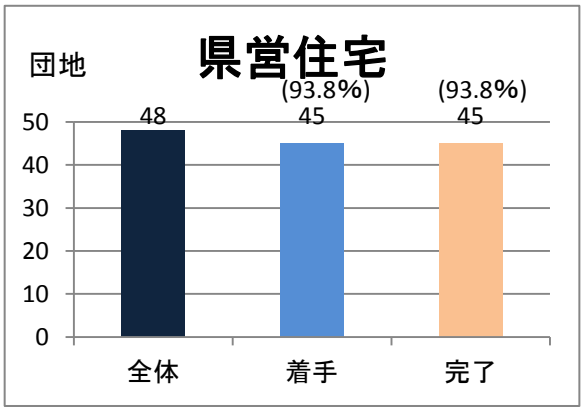

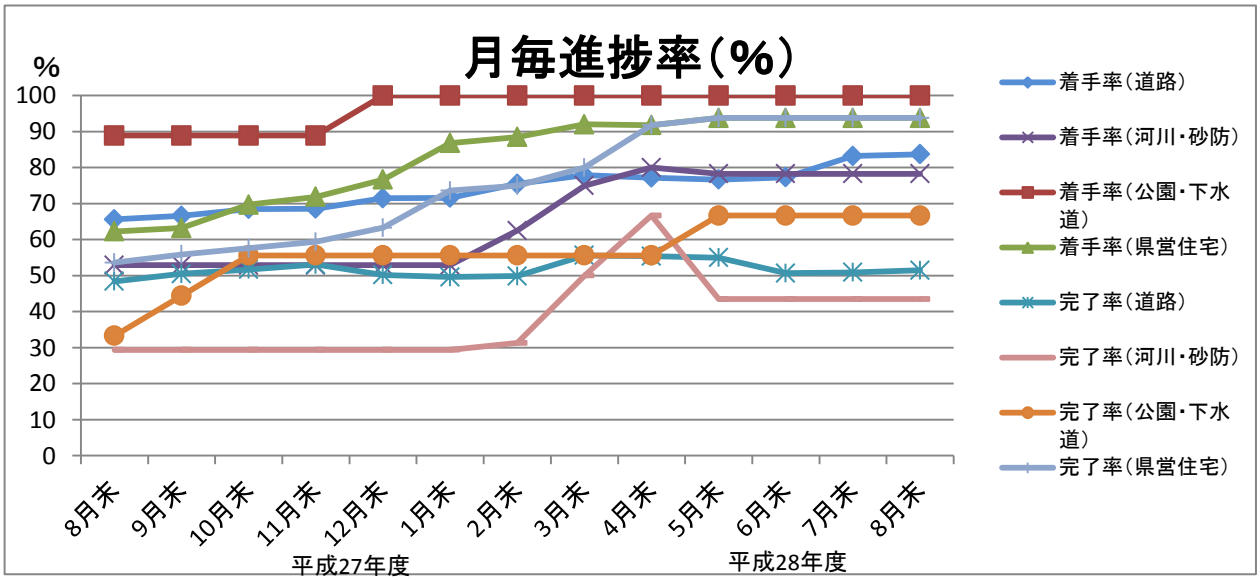
## 2. 除染の月毎進捗状況
