

(様式 1 - 3)


福島県 (南相馬市) 帰還・移住等環境整備事業計画 帰還・移住等環境整備事業等個票  
令和 7 年 4 月時点

NO.	199	事業名	農山村地域復興基盤総合整備事業 (農地整備事業) 井田川地区 (基金型)	事業番号	(5)-40-90
交付団体	福島県	事業実施主体 (直接/間接)	福島県 (直接)		
総交付対象事業費	(1,993,810) 2,453,810 (千円)	全体事業費	(3,970,370) 3,970,370 (千円)		
帰還・移住等環境整備に関する目標					
<p>避難指示区域のある南相馬市において、大震災以前は、地域農業者を中心に農業用施設並びに農用地の保全管理を行いながら、水稻を中心とした営農活動を行ってきた。</p> <p>しかしながら、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、離農に加え農業用施設を管理する地域農業者が減り、従前のような適切な維持管理が不可能となり、施設の劣化や機能低下が見られる。</p> <p>本市小高区においては、震災後の避難指示や作付け制限、除染等により営農再開できない農地が散在し、面的な営農再開が進まない状況もあるが、本地区においても、農家の営農意欲が高く、担い手農家への農地利用集積を図りながら、営農再開に向けた取組みが行われている。</p> <p>よって、本事業を導入することにより、大区画化等、効率的に営農を行える農業基盤を整備するとともに、担い手農家への農地利用集積を図り、本地域の営農再開を加速化させるものである。</p>					
事業概要					
<p>本地区は、担い手をはじめ多くの農家は営農再開意欲が強く、この機会に基盤整備を行うことで、ほ場の大区画化等による農業生産性の向上、農作業の協業化、担い手への農地集積を促進し、地域の復興再生に資することを目的とする。</p> <p>受益面積 A=111.0ha (井田川 (いだがわ) 地区)</p> <p>【申請に係る事業概要】</p> <p>第 50 回申請については、整地工、用水路工、排水路工、道路工、換地業務、設計業務、農業経営高度化支援事業に必要な事業費を申請する。</p> <p>【南相馬市復興計画】</p> <p>主要施策 3 (経済復興) - 基本施策 3-1 (産業の再生) - 主な方策 (農林水産業への支援)</p> <p>被災農地の大区画化と利用集積を進め、経営主体の生産法人化による大規模経営と農業経営の複合化の推進を図る。</p> <p>【福島県復興計画】</p> <p>6 農林水産業再生プロジェクト - 2 農業の再生 - ④震災により深刻な影響を受けている地域農業の復興に向けた農地の利用集積の促進・⑤農地・農業用施設の復旧と合わせた大区画ほ場の整備</p> <p>【工期延長】(令和 7 年 1 月 10 日)</p> <p>本地区は、令和 2 年度に事業採択され、令和 8 年度事業完了となるほ場整備地区である。しかしながら、工事施工にあたり下記の事態が生じたため、工期延長したい。</p> <p>干拓地であり軟弱地盤である本地区において、湿地ブルドーザを使用する等の対策を行っているが、表土剥ぎ取り後のほ場で重機が沈む事態が発生したほか、ほ場で不等沈下が発生する等、施工に困難を極めたため、重機の見直しや施工方法の再検討に時間を要した。その結果、切り盛りを最小限にするよう、客土を行った後に反転する工法として進めている。</p> <p>また、客土材について、他事業発生土を受け入れるよう、受入量及び時期の調整に時間を要している。</p> <p>以上のことから、工期を令和 10 年度まで延長したい。</p>					

当面の事業概要	
<p>&lt;令和2年度&gt; 土地改良法手続き、地元等の合意形成、実施設計業務、境界測量</p>	
<p>&lt;令和3年度&gt; 区画整理工(整地工、排水路工、道路工)〈A=2.4ha〉、実施設計業務、境界測量、用地買収・補償、換地業務、井戸調査、農業経営高度化支援事業</p>	
<p>&lt;令和4年度&gt; 区画整理工(整地工、排水路工、道路工)〈A=33.9ha〉、換地業務、設計業務、補償、農業経営高度化支援事業</p>	
<p>&lt;令和5年度&gt; 区画整理工(整地工、用排水路工、道路工)〈A=31.0ha〉、換地業務、設計業務、農業経営高度化支援事業</p>	
<p>&lt;令和6年度&gt; 区画整理工(整地工、排水路工、道路工)〈A=13.6ha〉、補完工、換地業務、農業経営高度化支援事業</p>	
<p>&lt;令和7年度&gt; 整地工、用水路工、排水路工、道路工、換地業務、設計業務、農業経営高度化支援事業</p>	
<p>&lt;令和8年度&gt; 整地工、用水路工、排水路工、道路工、暗渠排水工、パイプライン工、農道台帳作成、用地補償、換地業務、設計業務、農業経営高度化支援事業</p>	
<p>&lt;令和9年度&gt; 整地工、用水路工、排水路工、道路工、暗渠排水工、パイプライン工、設計業務、農道台帳作成、確定測量、換地業務、農業経営高度化支援事業</p>	
<p>&lt;令和10年度&gt; 整地工、用水路工、換地業務、農業経営高度化支援事業</p>	
地域の帰還・移住等環境整備との関係	
<p>本地域は避難指示区域であったことから、農用地及び農業用施設の維持管理が不可能となり、施設の劣化や機能低下が顕著であるため、再生加速化の目標達成に向け、本事業の導入による農業生産基盤の整備を行う必要がある。</p>	
関連する事業の概要	

関連する基幹事業	
事業番号	
事業名	
交付団体	
基幹事業との関連性	

計画一般図

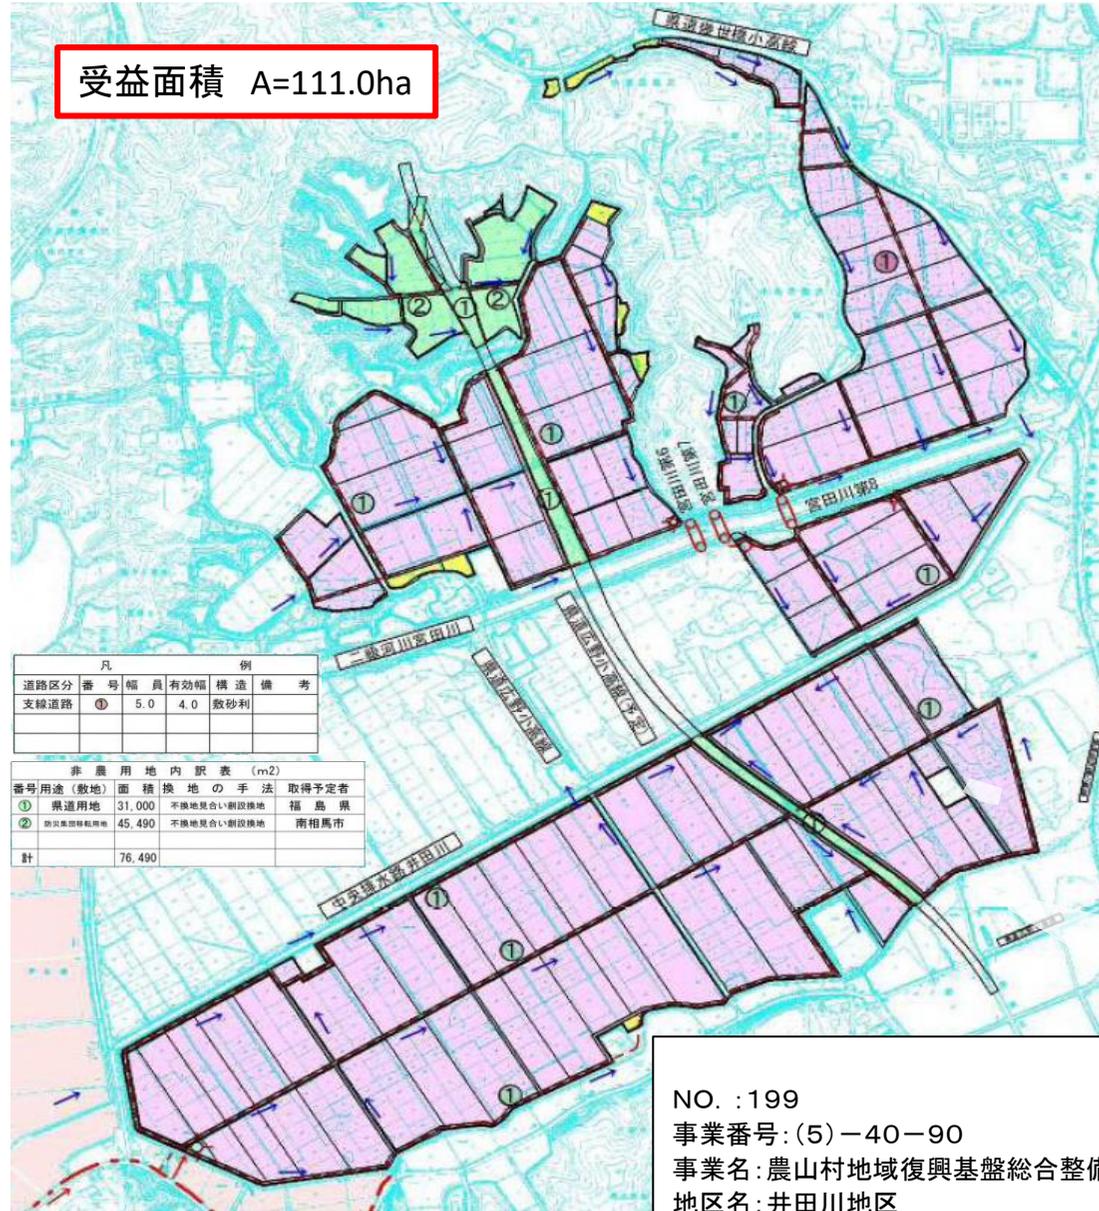

受益面積 A=111.0ha

凡	例				
道路区分	番号	幅員	有効幅	構造	備考
支線道路	①	5.0	4.0	敷砂利	

非農用地内訳表 (m <sup>2</sup> )				
番号	用途(敷地)	面積	換地の手法	取得予定者
①	農道用地	31,000	不換地見合い割戻換地	福島県
②	防災集団移転用地	45,490	不換地見合い割戻換地	南相馬市
計		76,490		


位置図



凡	例
---	地区界
■	田 110.0ha
■	畑 1.0ha
■	非農用地 7.6ha
■	支線道路(敷砂利)
---	パイプライン
■	支線排水路
■	小排水路
⊙	揚水機場
⊙	排水機場

NO. :199  
 事業番号:(5)-40-90  
 事業名:農山村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)  
 地区名:井田川地区

標準区画割図

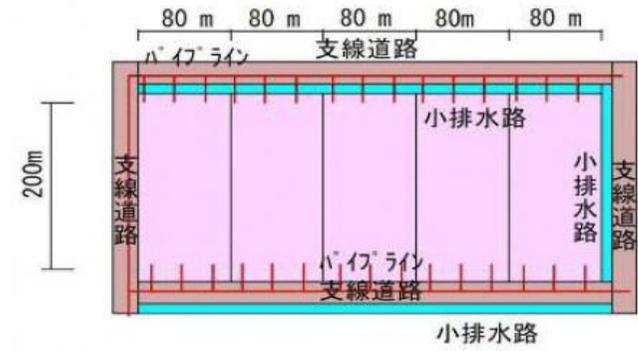

標準構造図

